

# Tablero de Control Corporativo

## Diciembre 2023

Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control



somos  
agua

# Contenido


1. Resumen
2. Indicadores de Cumplimiento
3. Indicadores de Avance

# Contenido

1. Resumen
2. Indicadores de Cumplimiento
3. Indicadores de Avance

# Plan General Estratégico 2020-2024 a Dic.23


## Esquema de SEGUIMIENTO

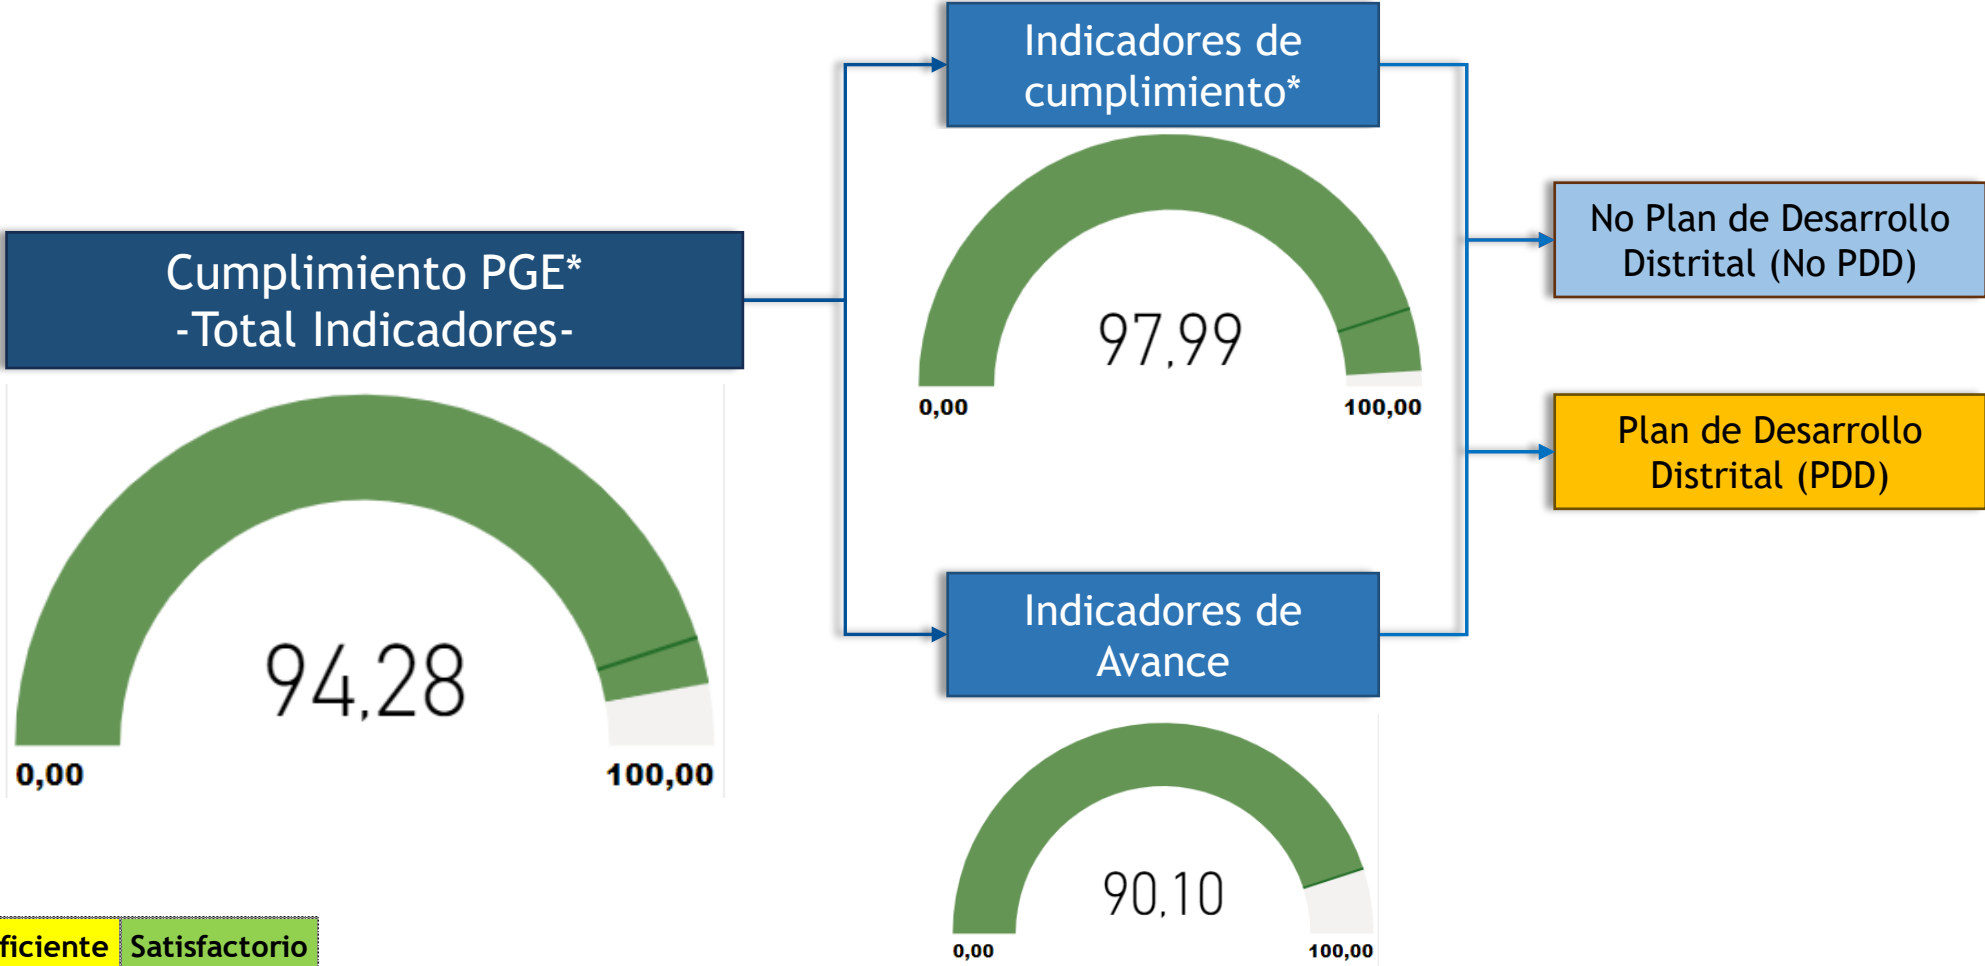

Deficiente	Suficiente	Satisfactorio
<=75	(75-90)	[90-100]

# Plan General Estratégico 2020-2024

## Cumplimiento Objetivos Estratégicos (%)

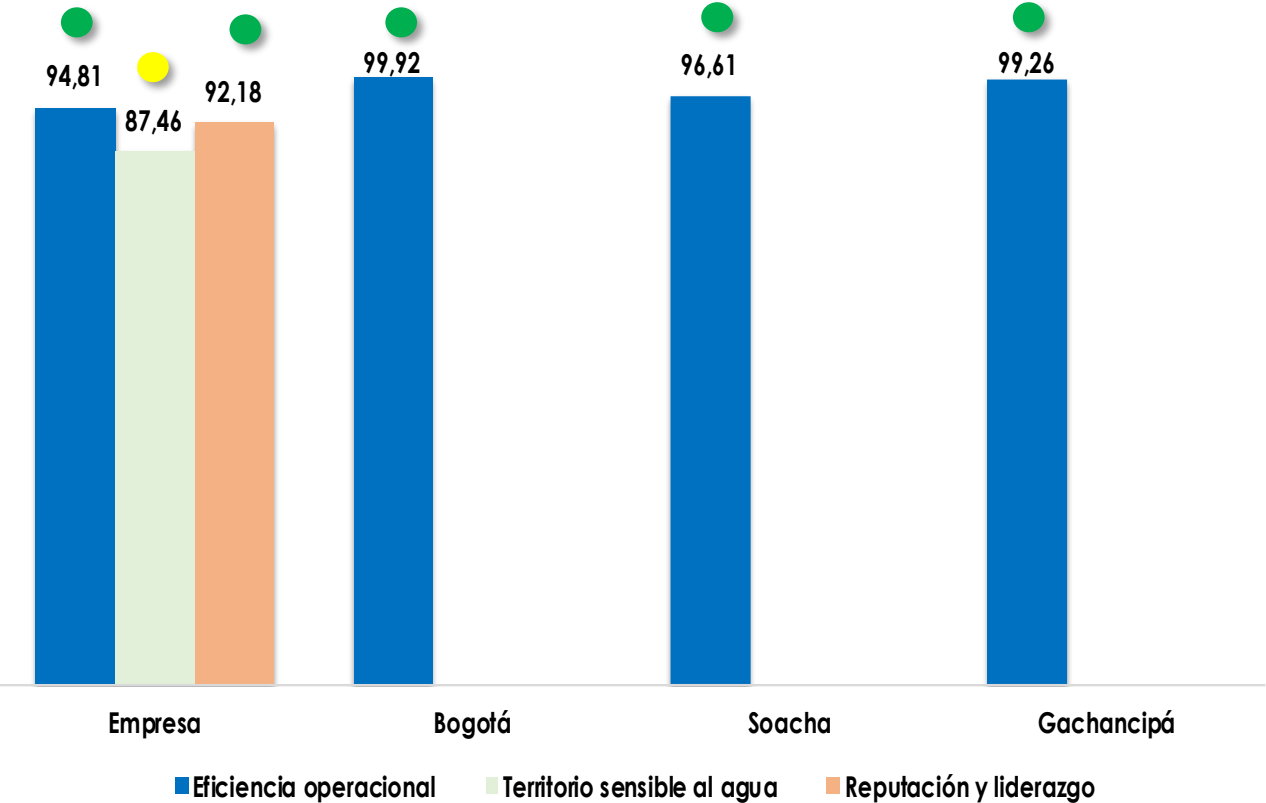

No	Objetivo	No	Indicadores con Alerta	Control
1	Eficiencia Operacional	1	Liquidez	● 75,00
		2	IPUF Soacha	● 87,84
		3	Saneamiento del río Bogotá*	● 82,24
2	Territorio Sensible al Agua	-	Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s	● 61,50
		-	Avance en la construcción de la Estación Elevadora Canoas	● 83,12
		4	Conservación de hectáreas en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica	● 48,50
		5	Aumento en la capacidad de tratamiento de las plantas Wiesner y Tibitoc	● 77,50
		6	Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	● 41,32

# Contenido



1. Resumen
2. Indicadores de Cumplimiento
3. Indicadores de Avance

# Indicadores estratégicos De CUMPLIMIENTO

## Resumen

	Cumplimiento a Dic 2023 %				
	Deficiente <=75	Suficiente (75-90)	Satisfactorio [90-100]	NA	TOTAL
No PDD*	1	1	27	0	29
PDD	0	0	4	0	4
TOTAL	1	1	31	0	33

### No PDD

-  Liquidez
-  IPUF Soacha

- No PDD: No Plan de Desarrollo Distrital
- PDD: Plan de Desarrollo Distrital

# Indicadores estratégicos De CUMPLIMIENTO

No PDD

Objetivo	Estrategia	Indicador	Unidad	2023			2024		
				Observado		Meta	Cumpl (%)	Meta	
				Sep	Dic	Dic	Dic	Jun	
Eficiencia Operacional	Sostenibilidad Financiera	Margen Ebitda	%	48,91	47,11	40,30	100,0	43,61	
		Liquidez	Veces	1,63	1,60	1,20	75,0	1,20	
		Endeudamiento	Veces	0,84	1,05	1,80	100,0	1,70	
		Índice de cartera misional	%	10,41	10,88	9,90	91,0	9,90	
	Gestión Regulatoria	IUS	Bogotá	[0-100]	91,39	91,39	90,00	100,0	90,00
			Soacha	[0-100]	87,67	87,67	90,00	97,4	90,00
			Gachancipá	[0-100]	89,09	89,09	90,00	99,0	90,00

- Liquidez: se adoptó criterio del indicador único sectorial -IUS- (la liquidez debe bajar). Sin embargo, la Calificadora de Riesgos Fitch Ratings valora la alta liquidez y al emitir calificación 'AAA(col)' para la EAAB-ESP la SSPD otorga la máxima calificación en los indicadores financieros.
- Indicador Único Sectorial (IUS): calificación SSPD 2022, v01 2023.06.29 y v02 2023.12.05. Riesgo Bajo en Bogotá y Medio Bajo en Soacha y Gachancipá.



# Indicadores estratégicos De CUMPLIMIENTO

No PDD

Objetivo	Estrategia	Indicador	Unidad	2023			2024		
				Observado		Meta	Cumpl (%)	Meta	
				Sep	Dic	Dic	Dic	Jun	
Eficiencia Operacional	Prestación del Servicio	Cobertura Acueducto	Bogotá	%	100,00	100,00	100,00	100,0	100,00
			Soacha	%	100,00	100,00	100,00	100,0	100,00
			Gachancipá	%	100,00	100,00	100,00	100,0	100,00
		Cobertura Alcantarillado	Bogotá	%	100,00	100,00	100,00	100,0	100,00
			Soacha	%	100,00	99,93	100,00	99,9	100,00
		DACAL	Bogotá	Suscript.	19.181	19.182	19.008	99,1	19.504
			Soacha	Suscript.	27.917	27.927	25.337	90,7	25.337

- DACAL (Diferencia de suscriptores de acueducto y alcantarillado - incremento DACAL del ciclo i vs 2019: metas modificadas según Acuerdo de Junta Directiva No. 147 de 31.03.23.

# Indicadores estratégicos De CUMPLIMIENTO

No PDD

Objetivo	Estrategia	Indicador	Unidad	2023			2024		
				Observado		Meta	Cumpl (%)	Meta	
				Sep	Dic	Dic	Dic	Jun	
Eficiencia Operacional	Prestación del Servicio	IRCA	Bogotá	%	0,29	0,35	1,71	100,0	1,71
			Soacha	%	0,13	0,15	2,84	100,0	2,84
			Gachancipá	%	0,10	0,14	5,00	100,0	5,00
		IQR	Bogotá	Recl/1000 Suscr	0,29	0,85	2,00	100,0	2,00
			Soacha	Recl/1000 Suscr	0,03	0,20	2,00	100,0	2,00
			Gachancipá	Recl/1000 Suscr	0,29	0,29	2,00	100,0	2,00
		ICON	Bogotá	%	98,99	98,97	98,36	100,0	98,36
			Soacha	%	99,26	98,91	98,36	100,0	98,36
			Gachancipá	%	99,63	99,52	98,36	100,0	98,36
		IPUF	Soacha	m3-mes	7,75	7,75	6,81	87,8	6,75
Gachancipá	m3-mes		4,19	4,19	4,01	95,8	4,01		

- Índice de Pérdidas por Usuarios Facturado (IPUF): método de prorratio. Promedio móvil 12 meses a septiembre de 2023. Pendiente m3 recuperados en el proceso de defraudación de fluidos de enero-septiembre de 2023.
- Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA): Promedio semestre II (jul-dic).
- Índice de reclamos comerciales (IQR): Promedio semestre II (jul-dic).
- Índice de Continuidad del Servicio de acueducto (ICON): Promedio semestre II (jul-dic).

# Indicadores estratégicos De CUMPLIMIENTO

No PDD

Objetivo	Estrategia	Indicador	Unidad	2023			2024	
				Observado		Meta	Cumpl (%)	Meta
				Sep	Dic	Dic	Dic	Jun
Territorio Sensible al Agua	Adaptación y Mitigación Cambio Climático	Reducción de la Huella de Carbono	%	19,33	15,00	15,00	100,0	15,00
Reputación y Liderazgo	Relacionamiento	Nivel de satisfacción de los usuarios y percepción de grupos de interés	%	NA	80,00	76,00	100,0	77,50
	Gobernabilidad	Índice de transparencia (ITA)	%	NA	96,00	98,00	98,0	100,00
		Evaluación de medidas de integridad	%	NA	90,60	90,00	100,0	95,00

- Encuesta liderada por Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.
- Índice de Transparencia (ITA) medición realizada por Procuraduría General de la Nación (PGN). El resultado corresponde al autocontrol de la EAAB-ESP. Pendiente auditoría PGN.
- Evaluación de medidas de integridad: medición liderada por Secretaría General.

# Indicadores estratégicos De CUMPLIMIENTO

## PDD

Objetivo	Estrategia	Indicador	Unidad	2023			2024	
				Observado		Meta	Cumpl (%)	Meta
				Sep	Dic	Dic	Dic	Jun
Eficiencia Operacional	Gestión Regulatoria	Subsidio a la población de estratos 1, 2 y 3 en servicio de acueducto y alcantarillado	%	100,00	100,00	100,00	100,0	100,00
	Pretación del Servicio	Beneficio social del mínimo vital	%	NA	100,00	100,00	100,0	100,00
		Cobertura de alcantarillado pluvial	%	99,24	99,23	99,15	100,0	99,15
		ICON Empresa	%	98,99	98,97	98,36	100,0	98,36
		IPIUF Bogotá	m3-mes	6,43	6,43	6,65	100,0	6,60

- Beneficio social del mínimo vital: indicador con cálculo semestral.
- ICON PDD: meta a nivel de Empresa (agregada para Bogotá, Soacha y Gachancipá). Promedio anual de Enero al mes de control (ene-dic).
- IPIUF: promedio móvil 12 meses a septiembre de 2023. Método de prorrateo. En PDD la meta a Dic. 2023 es 6,82 y se mantiene hasta junio de 2024. En el caso del PGE se tiene una meta más exigente (6,60 a junio de 2024) con el objetivo de llegar a 6,34 en junio de 2026 (fin de la segunda fase del marco regulatorio).

# Contenido

#SOMOS agua

- Alertas

# Alerta de cumplimiento

## No PDD



Cumple a dic 2023

75,0%

Definición de la meta: Reducir la liquidez de la Empresa a 1,2 a diciembre de 2023.

Indicador: Liquidez

Meta diciembre 2023: 1,2

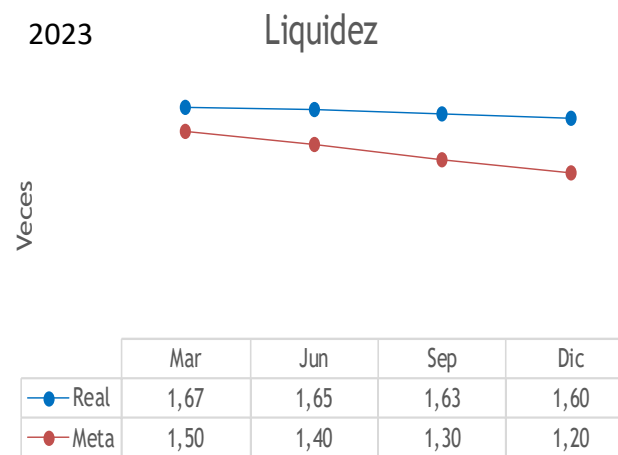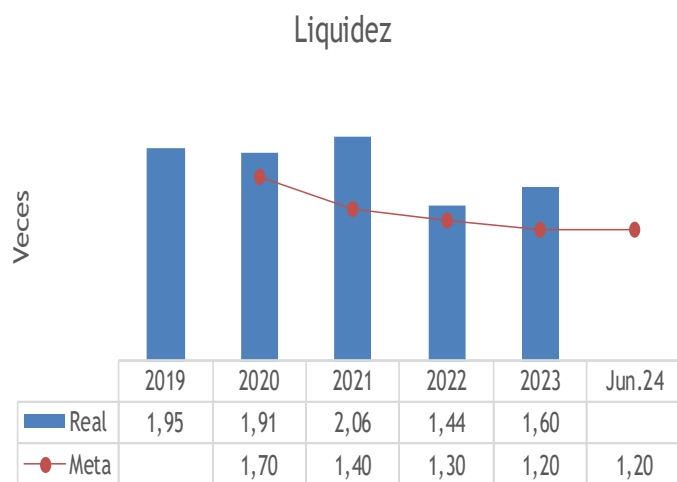

### Justificación:

En agosto 8 de 2023, la Calificadora de Riesgos Fitch Ratings emitió calificaciones de largo y corto plazo de la EAAB en 'AAA(col)' y 'F1+(col)', respectivamente. Con esta calificación se asegura para el año 2024 un cumplimiento de 100% en la Dimensión Suficiencia Financiera del Indicador Único Sectorial - IUS-

Próximo Plan General Estratégico adoptar criterio Empresa para formular metas y a nivel del indicador IUS mantener la calificación AAA.

# Alerta de cumplimiento

## No PDD



Cumple a sep 2023

87,8%

**Definición de la meta:** Lograr en Soacha un IPUF de 6,79 m3-mes por suscriptor facturado a diciembre de 2023.

**Indicador:** IPUF

**Meta septiembre 2023:** 6,81

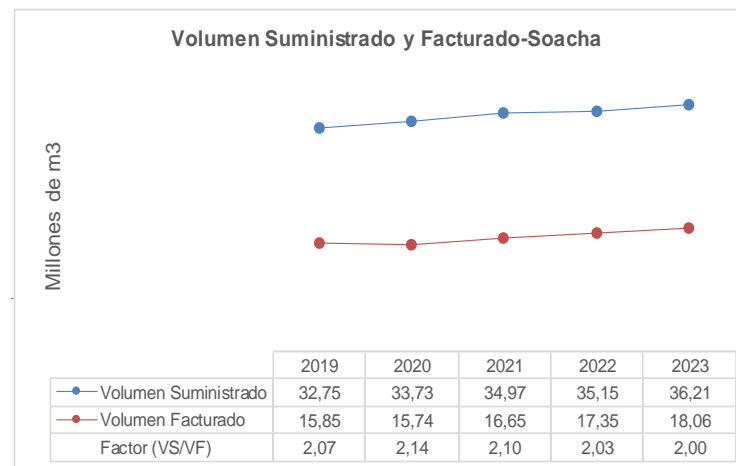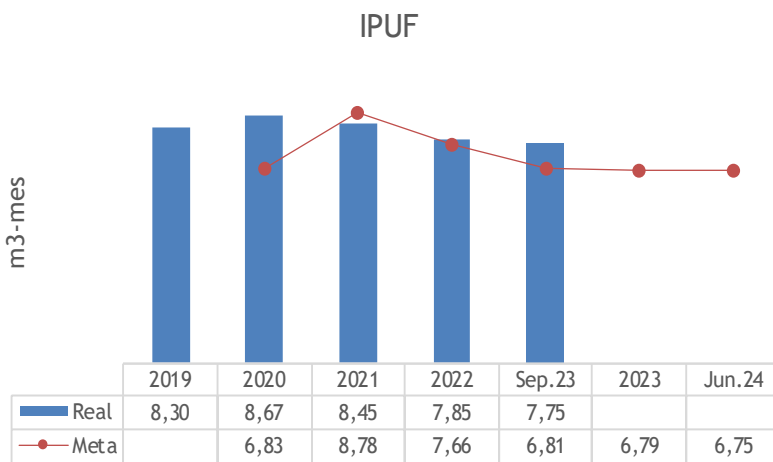

## Justificación:

La reducción a septiembre de 2023 es de 0.31 puntos con relación a septiembre de 2022 y 0.55 frente a la línea base (Dic-2019). El ciclo i representa 14,3% del consumo facturado y 10,4% de los suscriptores facturados. Desde 2022 se observa una mejor relación entre el suministro y consumo de agua (2,00 vs 2,14 de 2019). Evaluar el proceso de facturación. En 2023 se registra un promedio anual de 4.113 suscriptores (2,2%) con consumo promedio y 9.652 (5,1%) sin consumo.

# Contenido

1. Resumen
2. Indicadores de Cumplimiento
3. Indicadores de Avance



# Indicadores estratégicos De AVANCE

## Resumen

	Avance a Dic 2023 %				
	Deficiente ≤ 47,5	Suficiente [47,5 - 62,5]	Satisfactorio o [62,5 - 100]	NA	TOTAL
No PDD*	1	1	10	0	12
PDD	3	2	9	0	14
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>26</b>

\* No PDD: No Plan Distrital de Desarrollo PDD: Plan Distrital de Desarrollo

## No PDD

- Telemetría para grandes consumidores
- Saneamiento del Río Bogotá

## PDD

- Conservación de hectáreas en cuencas abastecedoras
- Avance en el proceso de construcción, mantenimiento y operación de la planta de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de 16 m<sup>3</sup>/s (Subindicador de Saneamiento del Río Bogotá).
- Aumento capacidad tratamiento de las plantas Wiesner y Tibitoc
- Avance en la construcción de la Estación Elevadora Canoas (Subindicador de Saneamiento del Río Bogotá)
- Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos -PSMV-

# Indicadores estratégicos De AVANCE

No PDD

Objetivo	Estrategia	Indicador	Unidad	2023			2024			
				Observado		Meta	Avance (%)	Meta	Avance (%)	
				Sep	Dic	Dic	Dic	Jun	Jun	
Eficiencia Operacional	Sostenibilidad Financiera	Ejecución de inversiones	Mill\$	3.732.641	3.979.426	3.664.758	100,0	4.269.736	93,2	
		Nuevos negocios	Mill\$	NA	23.663	25.594	92,5	33.235	71,2	
	Prestación del Servicio	Incorp. Suscr. Acueducto	Bogotá	Suscriptores	115.876	123.883	97.448	100,0	110.003	100,0
			Soacha	Suscriptores	23.359	25.574	23.754	100,0	23.754	100,0
			Gachancipá	Suscriptores	614	630	285	100,0	325	100,0
		Incorp. Suscr. Alcantarillado	Bogotá	Suscriptores	113.414	121.429	96.032	100,0	109.249	92,2
			Soacha	Suscriptores	21.336	23.522	25.997	90,5	25.997	90,5
Territorio Sensible al Agua	Sostenibilidad Ambiental	Saneamiento del río Bogotá*	%	79,02	79,49	96,7	82,2	100,0	79,5	

\* Promedio 3 indicadores PDD - Diapositiva 22

- Nuevos Negocios: meta modificada según Acuerdo de Junta Directiva 147 de 31.03.23. Los ingresos registrados corresponden a revisión de diseño de desarrollo y supervisión de traslado de redes en las obras del metro, variación real de venta de energía con relación a 2019, zona promocional y venta de agua por consumo técnico.
- Incorporación de suscriptores de alcantarillado Soacha: meta modificada según Acuerdo de Junta Directiva 147 de 31.03.23.

# Indicadores estratégicos De AVANCE

No PDD

Objetivo	Estrategia	Indicador	Unidad	2023			2024		
				Observado		Meta	Avance (%)	Meta	Avance (%)
				Sep	Dic	Dic	Dic	Jun	Jun
Reputación y Liderazgo	Modernización Empresarial	Formulación y ejecución de la primera fase del plan de innovación de la EAAB	%	95,00	96,97	95,0	100,0	100,0	97,0
		Modernización del proceso de facturación	%	60,00	62,00	62,0	100,0	65,0	95,4
		Telemetría para grandes consumidores	%	41,65	64,00	100,0	64,0	100,0	64,0
		Cumplimiento plan de adecuación y sostenibilidad MIPG	%	NA	97,89	100,0	97,9	100,0	NA

- Telemetría: Instalación de 580 medidores de un total de 905.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



# Indicadores estratégicos De AVANCE

## PDD

Objetivo	Estrategia	Indicador	Unidad	2023			2024		
				Observado		Meta	Avance (%)	Meta	Avance (%)
				Sep	Dic	Dic	Dic	Jun	Jun
Territorio Sensible al Agua	Adaptación y Mitigación del Cambio Climático	Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales	Unidad	10	10	10	100,0	10	100,0
		Construcción de corredores ambientales	Unidad	3	3	3	100,0	3	100,0
		Avance en la construcción del campamento Piedras Gordas	%	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0
		Intervención integral de hectáreas en la estructura ecológica principal	Ha	259,99	394,37	64,0	100,0	70,5	100,0
		Conservación de hectáreas en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica	Ha	1.631,97	2.182,69	4.500,0	48,5	6.000,0	36,4
		Individuos arbóreos sembrados	Unidad	55.074	55.074	47.000	100,0	47.000	100,0
		Corrección de conexiones erradas	Unidad	3.577	4.311	1.250	100,0	1.500	100,0

- Intervención integral de Ha en la estructura ecológica principal: intervención en las reservas Distritales de humedal. Se cumple con la meta a junio de 2024 del PGE de 70,5 Ha y la del PDD de 30 Ha.
- Conservación de Ha en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica:

# Indicadores estratégicos De AVANCF

PDD

Objetivo	Estrategia	Indicador	Unidad	2023			2024		
				Observado		Meta	Avance (%)	Meta	Avance (%)
				Sep	Dic	Dic	Dic	Jun	Jun
Territorio Sensible al Agua	Sostenibilidad Ambiental	Avance en el proceso de construcción, mantenimiento y operación de planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m3/s	%	55,35	55,35	90,00	61,5	100,00	55,4
		Avance en la construcción de la Estación Elevadora Canoas	%	81,71	83,12	100,00	83,1	100,00	83,1
		Avance en construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas	%	100,00	100,00	100,00	100,0	100,00	100,0
		Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	%	25,00	77,50	100,00	77,5	100,00	77,5
	Acueducto para la Región	Aumento en la capacidad de tratamiento de las plantas Wiesner y Tibitoc	m3/s	17,35	17,58	18,56	41,3	21,27	15,8
		Avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional	%	NA	100,00	100,00	100,0	100,00	100,0

Saneamiento del río Bogotá\*

- PSMV: corresponde al promedio anual 2020-2023 por ser una meta anual.
- Aumento de capacidad de tratamiento de las plantas Wiesner y Tibitoc: el avance se determina mediante la relación del incremento real vs la meta a incrementar considerando la línea base de 16,89 m3/s.

# Indicadores estratégicos De AVANCE

## PDD

Objetivo	Estrategia	Indicador	Unidad	2023			2024		
				Observado		Meta	Avance (%)	Meta	Avance (%)
				Sep	Dic	Dic	Dic	Jun	Jun
Eficiencia Operacional	Prestación del Servicio	Avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro	%	96,31	98,85	96,1	100,0	100,0	98,9
		Incorporación de suscriptores de acueducto Bogotá y Soacha	Suscriptores	139.235	149.457	121.202	100,0	129.000	100,0
		Incorporación de suscriptores de alcantarillado sanitario Bogotá y Soacha	Suscriptores	134.750	144.951	122.029	100,0	135.000	100,0

- Incorporación de suscriptores en PDD: está agregado para Bogotá y Soacha. 100% en acueducto y alcantarillado sanitario.

# Contenido

#SOMOS agua

- Alertas

# Alerta de avance

No PDD

Avance dic 2023

Avance jun 2024




Definición de la meta: Telemetría para grandes consumidores.

Indicador: Telemetría para grandes consumidores

Meta 2024: 100 %

Telemetría para grandes consumidores

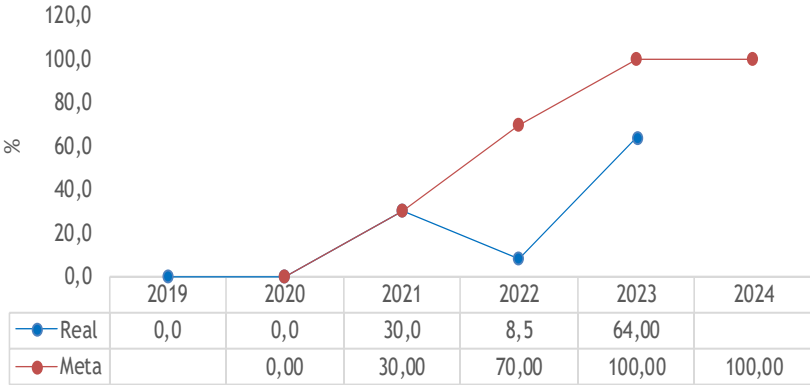

### Justificación:

A diciembre de 2023, se han instalado 580 medidores de un total de 905. Se espera instalar el 100% de los medidores en abril de 2024, incluyendo 280 nuevos medidores establecidos en la modificación del contrato realizada en diciembre de 2023.



# Alerta de avance

## No PDD

Avance dic 2023 Avance jun 2024

82,2%


79,5%

Definición de la meta: Ejecutar los tres proyectos asociados al Saneamiento del Río Bogotá:

Indicador: Saneamiento del Río Bogotá

Meta 2024: 100 %

Saneamiento del río Bogotá

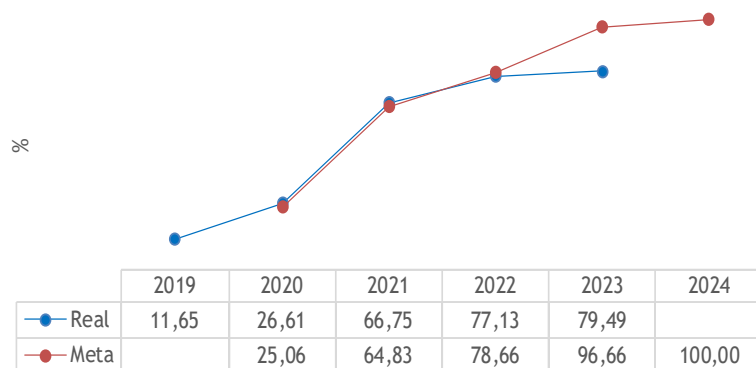

### Justificación:

1. Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m<sup>3</sup>/s **61,5%**
2. Avance en la construcción de la Estación Elevadora Canoas **83,1%**
3. Avance en la construcción de la descarga por gravedad del canal Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas **100,0%**

2. Riesgo de No cumplimiento por fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 2023.07.24 que obliga a la EAAB-ESP cumplir y rehacer la estructuración técnica y financiera del proyecto PTAR CANOAS FASE I Y FASE II antes de sacar a licitación para la adjudicación de esta mega obra.

# Alerta de avance

## PDD

Avance dic 2023

Avance jun 2024

61,5%


55,4%

**Definición de la meta:** Adelantar en el marco de la ley 142 de 1994, la construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de un caudal medio de 16m<sup>3</sup>/s.

**Indicador:** Porcentaje atamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m<sup>3</sup>/s.

**Meta 2024: 100 %**

Avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m<sup>3</sup>/s

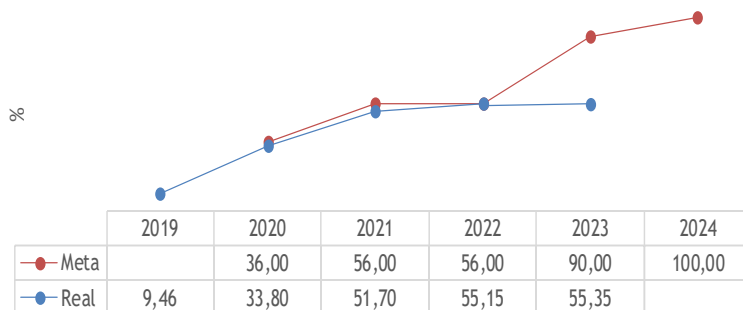

Justificación:

- Riesgo de No cumplimiento por fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 2023.07.24 que obliga a la EAAB-ESP cumplir y rehacer la estructuración técnica y financiera del proyecto PTAR CANOAS FASE I Y FASE II antes de sacar a licitación para la adjudicación de esta mega obra.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



# Alerta de avance

## PDD

Avance dic 2023

Avance jun 2024


83,1%

83,1%

**Definición de la meta:** Construcción del 100% de la Estación Elevadora Canoas.

**Indicador:** Avance en la construcción de la Estación Elevadora Canoas.

Avance en la construcción de la Estación Elevadora Canoas

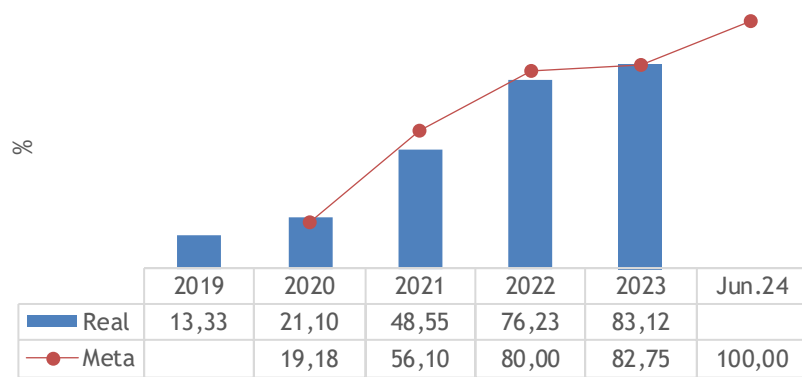

### Justificación:

Se desplazó el cronograma de actividades de construcción para la vigencia 2024 y la puesta en marcha y operación para la vigencia 2025.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



# Alerta de avance

## PDD

Avance dic 2023 Avance jun 2024

48,5%


36,4%

**Definición de la meta:** Incrementar en 6.000 Ha las áreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la EAAB de Bogotá

**Indicador:** Áreas de conservación incrementadas

**Meta 2024:** Incrementar en 6.000 Ha

Conservación de hectáreas en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica

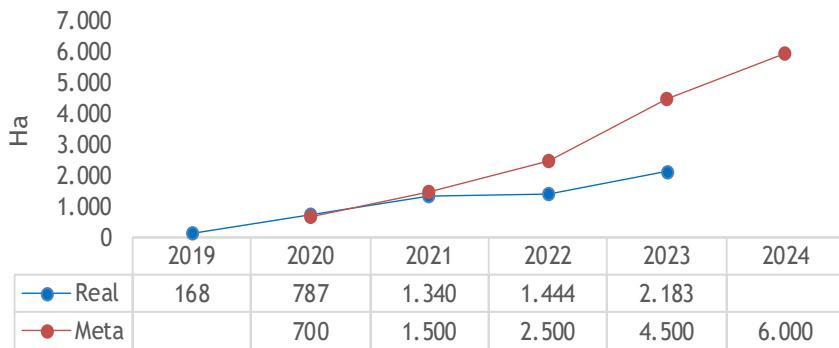

## Justificación:

Limitantes:

- Nuevo POT (Decreto 555 de 2021, suspendido provisionalmente desde junio 15 a agosto 31 de 2022) el cual generó retrasos y reprocesos
- Tiempos extensos en los trámites ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) y Super Notariado y Registro
- Imposibilidad de firma por fallecimiento de propietarios o colindantes de predios ofertados.

# Alerta de avance

## PDD

Avance dic 2023

Avance jun 2024

41,3%


15,8%

**Definición de la meta:** A 2024 Bogotá habrá alcanzado una oferta de agua potable de 21,2 m<sup>3</sup>/s, resultado de las intervenciones en las Plantas Wiesner y Tibitoc.

**Indicador:** Metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento

**Meta 2024:** Incrementar en 4,31 m<sup>3</sup>/s la capacidad de tratamiento

Aumento en la capacidad de tratamiento de las plantas Wiesner y Tibitoc

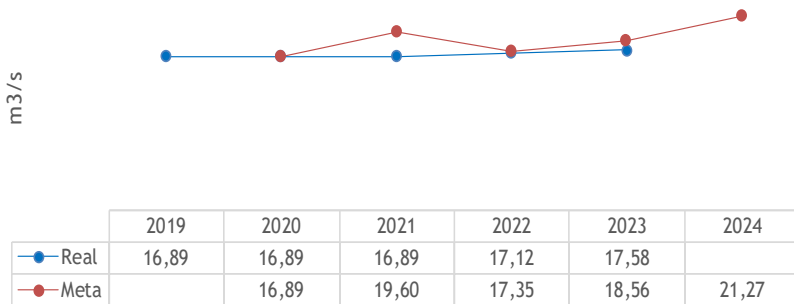

## Justificación:

A diciembre de 2023 se ha incrementado la capacidad de tratamiento en 0,69 m<sup>3</sup>/s. El avance del proyecto acumulado es de 78.9%. El proyecto de Optimización de Tibitoc registra un avance físico de 73,08% y avanza normalmente. Inició en 2021.02.07 y se adicionó en 2023.10.13 por \$3,124,339,105 por 12 meses. Los Trenes de tratamiento: 1 y 2 están sin intervenir; el tren 3 registra 16.8%; el tren 4 33.67%; el tren 5 88% y los trenes 7 y 6 llenado y puesta en marcha (feb y mayo de 2023).

En Wiesner el contrato se suscripción en 2017. En 2021 se declaró incumplimiento y se reinició el proyecto en 2023.03.28 con tres fases de trabajo: la fase I registra 99% (Apropiación de diseños). Se iniciaron actividades de Fase II, protocolos para pruebas y ensayos de las obras civiles existentes generando un informe de Diagnóstico.

# Alerta de avance

## PDD

Avance dic 2023

Avance jun 2024

77,5%


77,5%

**Definición de la meta:** Cumplir el 100% en las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- en el periodo 2020 - 2024.

**Indicador:** Porcentaje de cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV-

**Meta 2024:** 100%

Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)



%

	2020	2021	2022	2023	2024
● Real	90,0	100,0	95,0	77,50	
● Meta	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Justificación:

En 2023, se registró una ejecución anual de 25%. Para cumplir el cronograma de obras es importante que la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA de celeridad al otorgamiento de los permisos de ocupación de cauce y de tala y podas.

- Se eliminó en la Cuenca Salitre el punto de descarga RSA-T3-0170 primer semestre 2023.
- Sin Iniciar el contrato suscrito para eliminar los puntos de descarga en la subcuenca Molinos; CMO-HCO-0420, CMO-HCO-155, CMO-HCO-551, CMO-HCO-0730 por no contar con permiso de ocupación de cauce (SDA 2024.11.14).
- El contrato para eliminar el Punto CMO-HCO-157 se suscribió en 2023.12.21 y cuenta con autorización Agencia Nacional de Infraestructura - ANI (3 cruces sub-férreos).
- El contrato para eliminar los Puntos CEV-CRN-0200 y CEV-CRN-0210 en la Subcuenca Chicó-Rio Negro, suscrito en 2022.12.29 se avanza en la obtención del Plan de Manejo de Transito- PMT y se prevé iniciar en febrero de 2024.
- Para las obras sobre el vertimiento CEV-CRN-0200 se presenta un dilema entre el IDRD y el IDU frente a la competencia para otorgar la licencia de intervención del espacio público. Se avanzó en la radicación del Permiso de Ocupación de Cauce - POC ante la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA.

# GRACIAS



somos  
agua
