

2022

# INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES ENERO



BOGOTÁ, FEBRERO 2022

## **CONTENIDO**

1.	ANTE	CEDENTES Y GENERALIDADES	10
2.	GESTI	ÓN FINANCIERA	11
2.1 2.2		NACIÓN PRESUPUESTAL TO MENSUAL TRATAMIENTO PTAR SALITRE	
3.	GESTI	ÓN DE OPERACIÓN	12
3.1	LINE 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11	A DE AGUA Comportamiento Canal Salitre y Elevación de Agua Cruda Cribado Grasas Materiales Flotantes y Arenas Dosificación de Productos Calidad de Agua Tratada Sólidos Suspendidos Totales Demanda Biológica de Oxígeno Sobrenadantes, Grasas y aceites pH Temperatura Tratamiento de agua - FASE I.	131617192021
3.2	LINE 3.2.1 3.2.2 3.2.3	A DE LODOS Mesas Espesadoras Digestión Centrifugas	24 25
3.3 3.4	3.4.1 Secado 3.4.2 3.4.3	AMIENTO DEL BIOGÁS - MOTOGENERACIÓN	30 atio de 31 33 o doña
4.	GESTI	ÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO	39
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	MAN MAN DISP INTE COS	NEACIÓN Y PROGRAMACIÓN NTENIMIENTO PREVENTIVO NTENIMIENTO CORRECTIVO ONIBILIDAD DE EQUIPOS RVENCIONES MAYORES TIÓN DE ENERGÍA	39 40 41 41
4.8		HOS RELEVANTES EN EL MES DE ENERO:	

<b>5</b> .	GESTIC	ÓN AMBIENTAL Y SOCIAL49
5.1	PLAN 5.1.1	I DE MANEJO FORESTAL Y PAISAJÍSTICO
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	OPTIII CON PLAN CON CON CON	MIZACIÓN DEL USO DEL AGUA
6.		ÓN DE CALIDAD91
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8	INTRO ATEN PLAN AUDI PLAN GEST INDIC PROI	DDUCCIÓN       91         ICIÓN CLIENTE EXTERNO       91         I DE TRABAJO SGC       91         TORÍA INTERNA       93         IES DE MEJORAMIENTO       93         IÓN DE RIESGOS       94         CADORES       94         DUCTO NO CONFORME       94
7.	SISTEN	NA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 97
7.1	Med 7.1.1 7.1.2 7.1.3	icina Preventiva y del Trabajo
7.2	Segu 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5	ridad e Higiene Industrial

# LISTA DE GRAFICAS

# LISTA DE CUADROS

Cuadro 3.1-1 Caudales de entrada y salida de la PIAR Salitre Fase II registrados
enero 202214
Cuadro 3.1-2 Cantidad de residuos retirados en trampa de rocas, cribado fino y
grueso16
Cuadro 3.1-3 Cantidad de residuos retirados en sobrenadantes, grasas, arenas y
basura interna16
Cuadro 3.1-4 Licor de mezcla de Reactores Biológicos Enero 202218
Cuadro 3.1-5 Carga removida y concentraciones para SST y DBO5 reportadas Enero
de 202218
Cuadro 3.1-6 Relación de fechas y resultados asociados a valores de concentración
de DBO5 Que superan los 30 mg/L21
Cuadro 3.1-7 Concentración del parámetro Grasas y aceites para el mes de enero
2022
Cuadro 3.2-1 Datos línea de lodos Enero 202223
Cuadro 4.4-1 Equipos Críticos enero 202240
Cuadro 4.4-2 Equipos Fuera de Servicio o con Operación Restringida41
Cuadro 5.1-1 Barreras forestales y ambientales de la PTAR El Salitre49
Cuadro 5.1-2 Distribución de número de árboles por cada una de las barreras
ambientales de la PTAR El Salitre50
Cuadro 5.1-3 actividades ejecutadas en el mes de enero52
Cuadro 5.2-1 Consumo de agua potable enero 202263
Cuadro 5.5-1 Residuos donados a la Asociación Pedro León Trabuchi
Cuadro 5.6-1 Resultados del monitoreo diurno69
Cuadro 5.6-2 Resultados del monitoreo nocturno70
Cuadro 5.7-1 Resultados de monitoreo de Emisiones / octubre de 202171
Cuadro 5.9-1 Consolidado plegables generales y técnicos enviados mes de enero
202272
Cuadro 5.9-2 Comunicaciones correo: ptar.salitre@acueducto.com.co73
Cuadro 5.9-3 Total de población informada en las diferentes actividades de
divulgación mes de enero de 202274
Cuadro 5.9-4 Jornadas PTAR al barrio mes de enero de 202274
Cuadro 5.9-5 Charlas participativas con comunidades mes de enero de 202280
Cuadro 5.9-6 Reuniones de socialización proyecto de cerramiento con malla
eslabonada PTAR El Salitre fase I mes de enero de 202283
Cuadro 5.9-7 Consolidado cartillas pedagógicas El Saneamiento del río Bogotá
enviadas mes de enero de 202286
Cuadro 5.9-8 Consolidado colegios que continúan vinculados al servicio social de
la PTAR El Salitre fase I hasta el mes de enero de 202286
Cuadro 5.9-9 Estado de vinculación laboral PTAR El Salitre fase I mes de enero de
202290
Cuadro 6.7-1 indicadores de la PTAR mes de enero 202294
Cuadro 7.2-1 Tareas de Alto Riesgo Autorizadas105

# LISTA DE IMAGENES

Imagen 3.4-1 Actividades asociadas al cargue y transporte de biosólido	30
Imagen 3.4-2 Ruta a predio El Corzo	32
Imagen 3.4-3 Recorrido entre predio El Corzo y predio La Magdalena	
Imagen 3.4-4 Actividades para el aprovechamiento del e Biosólido, predio	el Corzo
y la Magdalena	33
Imagen 3.4-5 Actividades asociadas al cargue y disposición de residuos er	າ el RSDJ
	36
Imagen 3.4-6 Puntos de Generación de Residuos sólidos	36
Imagen 5.1-1 Localización de las barreras ambientales en la PTAR Salitre	50
Imagen 5.3-1 Localización Predios El Corzo y La Magdalena	65

# LISTA DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. Aseo General de las Zonas
Fotografía 2. Zona de procesamiento, extensión, nivelación, volteo y secado Predic
el Corzo34
Fotografía 3. Aplicación de inhibidor de olores
Fotografía 4. Maquinaria empleada en el patio de secado retroexcavadora de
llanta tipo pajarita y el predio la Magdalena bulldozer y excavadora de
oruga35
Fotografía 5. Contenedores del material cribado resultante de grasc
galerías(sobrenadantes) y arenas37
Fotografía 6. Residuos de pretratamiento provenientes del descargue de
contenedores del material cribado resultante de Gruesos y Finos38
Fotografía 7. Residuos de pretratamiento provenientes del descargue de la cuchard
bivalva38
Fotografía 8. Mantenimiento general tornillo D
Fotografía 9. Mantenimiento tornillo de elevación de agua cruda 01P01A44
Fotografía 10. Mantenimeinto mesas espesadoras PTAR fase II44
Fotografía 11. Mantenimeinto puentes desarenadores PTAR fase II
Fotografía 12. Mantenimeinto sopladores de biológicos PTAR fase II46
Fotografía 13. Adecuacion CCM 17 y Calentamiento46
Fotografía 14. Verificación de equipos PTAR fase II
Fotografía 15. Falla variador PTAR fase II
Fotografía 16. Manejo fito sanitario54
Fotografía 17. Control acacias56
Fotografía 18. Corte de cesped 04/01/202256
Fotografía 19. Mantenimiento de jardineria limpieza del terreno 19/01/202257
Fotografía 20. Fertilizacion 18/01/202258
Fotografía 21. Control acácias 24/02/2022 31/01/202258
Fotografía 22. Riego de individuos arboreos 12/01/2022 28/01/2022
Fotografía 23. Manejo fitosanitario 31/01/202261
Fotografía 24. Plateo 18/01/202262
Fotografía 25. Registro fotográfico patio de secado predio el Corzo y proceso de
mezcla predio la Magdalena enero 202267
Fotografía 26. Jornada PTAR al barrio, Portal de Transmilenio calle 170, localidad de
Suba Enero 04 de 202275
Fotografía 27. Jornada PTAR al barrio Lisboa ubicado en la localidad de Suba Enerc
06 de 202275
Fotografía 28. Jornada PTAR al barrio Centro Comercial Plaza de las Américas
Localidad de Kennedy Enero 11 de 202276
Fotografía 29. Jornada PTAR al barrio Centro Comercial Plaza Imperial - Localidad
de suba Enero 14 de 2022
Fotografía 30. Jornada PTAR al barrio Alcaldía Local de Engativá Enero 18 de 2022
Fotografía 31. Jornada PTAR al barrio Colegio Rodolfo Llinás IED - Localidad de
Engativá Enero 24 de 202278
Fotografía 32. Jornada PTAR al barrio Centro Comercial Portal Ochenta-Localidad
de Engativá Enero 26 de 202279

Fotografía 34. Principales problemáticas de las barreras 4,5 y 6 de la PTAR El Salitre fase I (disposición de residuos sólidos, árboles muertos, ramas rotas, acceso de personas no autorizadas, consumo de sustancias alucinógenas, afectación de placas de inventario arbóreo)	Fotografía 33. Charla acerca del funcionamiento y beneficios de la Planta d Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Salitre fase I Enero 31 de 202	2
la PTAR El Salitre fase I	Fotografía 34. Principales problemáticas de las barreras 4,5 y 6 de la PTAR El Salitr fase I (disposición de residuos sólidos, árboles muertos, ramas rota acceso de personas no autorizadas, consumo de sustancio	e s, as
Fotografía 36. Imagen de ejemplo y plano asociado con el montaje del cerramiento en malla eslabonada en las zonas comunes del área común de las barreras ambientales 5 y 6 PTAR El Salitre - vía Lisboa-Suba	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
eslabonada PTAR El Salitre fase I en los barrios Lisboa y Santa Cecilia sector I y II Enero 13 de 2022	en malla eslabonada en las zonas comunes del área común de lo	zs
localidad de Suba Enero 20 de 2022	eslabonada PTAR El Salitre fase I en los barrios Lisboa y Santa Cecili sector I y II Enero 13 de 20228	a 33
Fotografía 39. Charla virtual PSMV y PICCE Comité de Seguimiento de Obra localidad de Engativá Enero 20 de 2022		
Fotografía 40. Plegable o folleto diseñado por estudiante de servicio social Enero de 2022	Fotografía 39. Charla virtual PSMV y PICCE Comité de Seguimiento de Obr	a
Fotografía 42. Noticiero ambiental "Nacimiento del río Bogotá" creado por estudiante de servicio social Enero de 2022	Fotografía 40. Plegable o folleto diseñado por estudiante de servicio social Enero d	е
estudiante de servicio social Enero de 2022		
Fotografía 43. Clasificación de residuos: escultura elaborada en material reciclable por estudiante de servicio social Enero de 2022	Fotografía 42. Noticiero ambiental "Nacimiento del río Bogotá" creado po estudiante de servicio social Enero de 20228	or 37
Fotografía 44. Campaña ambiental "Todos por un mejor alcantarillado" adelantada por estudiante de servicio social Enero de 2022	Fotografía 43. Clasificación de residuos: escultura elaborada en material reciclabl	е
Fotografía 45. Reunión virtual mesa de coordinación interinstitucional Proyecto de Ampliación y Optimización de la PTAR El Salitre fase I Enero 28 de 2022 89  Fotografía 46. Medio de verificación (evidencia) 94  Fotografía 47. actividades de aseo como prevención al contagio del Covid 19:98  Fotografía 48. Control diário EPP 99  Fotografía 49. sensibilización con el personal autocuidado por contagio de virus y bacterias 100  Fotografía 50. limpieza y desinfección de las zonas comunes de la Planta 101  Fotografía 51. Fomento de estilo de trabajo y vida saludable 102	Fotografía 44. Campaña ambiental "Todos por un mejor alcantarillado	)"
Fotografía 46. Medio de verificación (evidencia)	Fotografía 45. Reunión virtual mesa de coordinación interinstitucional Proyecto d Ampliación y Optimización de la PTAR El Salitre fase I Enero 28 de 202	e 22
bacterias	Fotografía 46. Medio de verificación (evidencia)	94 98
Fotografía 50. limpieza y desinfección de las zonas comunes de la Planta	Fotografía 49. sensibilización con el personal autocuidado por contagio de virus	-
	Fotografía 50. limpieza y desinfección de las zonas comunes de la Planta	)1 )2

# LISTA DE ANEXOS CAPITULO 3

Anexo Cap 3_ 1 eficiencia de la planta	109
Anexo Cap 3_2 Lluvias Cuenca Salitre - Enero 2022	110
Anexo Cap 3_3 Niveles Lamina de agua cotas a nivel del mar del Canal Salitr	e Vs
Lluvias Canal Aferente	111
Anexo Cap 3_ 4 Consumo polimero	112
Anexo Cap 3_ 5a balance consolidado de sólidos planta el salitre ampliado	da y
optimnizada - enero 2022	113
Anexo Cap 3_5b balance consolidado de sólidos planta el salitre amplia	-
optimnizada - enero 2022	
Anexo Cap 3_5c balance consolidado de sólidos planta el salitre amplia	
optimnizada - enero 2022	
Anexo Cap 3_ 6 resumen deshidratación por centrifuga	
Anexo Cap 3_ 7 Consumo Biogas	/
CAPITULO 4	
Anexo Cap 4_ 1 Consumo de energía eléctrica desde Enero de 2019	119
Anexo Cap 4_ 2 Costo energía eléctrica comprada por KWH desde Enero 2019	
Anexo Cap 4_ 3a Plan de mantenimiento enero 2022	
Anexo Cap 4_ 3b Plan de mantenimiento enero 2022	
Anexo Cap 4_ 4 Ordenes Reprogramadas de mantenimiento enero 2022	
Anexo Cap 4_ 5 Descripción del mantenimiento por zonas	
Anexo Cap 4_6 Costo mano de obra por áreas	
Anexo Cap 4_7 Consolidado costo total por áreas	
Anexo Cap 4_8 Consolidado costo total por áreas	
Anexo Cap 4_ 9 Órdenes de Trabajo por Zonas	
Anexo Cap 4_ 10 Indicadores de Gestión	

#### 1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES

Según el decreto 043 de 2004, donde se efectúan unas asignaciones en relación con la operación, mantenimiento y administración de la PTAR El Salitre, el Alcalde Mayor de Bogotá, delegó en su artículo segundo, la función de operar, mantener y administrar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre (PTAR El Salitre), de acuerdo con las condiciones que sean necesarias y oportunas, en criterio del entonces DAMA (hoy SDA) y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, para el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado de la ciudad. Por lo anterior, se asignaron a la EAAB las funciones descritas en el decreto, y, se suscribieron durante el lapso del 1 de Julio de 2004, hasta el 31 de diciembre de 2007, tres convenios con la Secretaria Distrital de Ambiente, (antiguo DAMA) a saber: convenio 05/2004 liquidado; convenio 01/2006 liquidado y el convenio 022/2007 liquidado.

El 23 de diciembre de 2008, se expidió el Decreto 454 de la Alcaldía Mayor de Bogotá por el cual se modificó el Artículo 4 del Decreto 626 del 28 de diciembre de 2007, quedando modificado en lo referido a la adecuada operación, administración y mantenimiento de la PTAR El Salitre, se realizará con los recursos propios del presupuesto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, E.S.P. Es así, como desde diciembre de 2009, la Empresa incorporó en las tarifas que pagan los suscriptores en Bogotá en el servicio de Alcantarillado, los costos de operación y mantenimiento de la PTAR Salitre previa aprobación de la CRA mediante resolución 484 de 2009.

El 5 de octubre de 2010 mediante Resolución 1079 el Gerente General de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias en especial las conferidas en el literal a) del artículo 15, de los Estatutos de la Empresa, Resuelve: Asignar a la Gerencia Corporativa Sistema Maestro, el proyecto de Saneamiento del Río Bogotá, y, Asignar a la Dirección Red Troncal Alcantarillado de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR- El Salitre.

## 2. GESTIÓN FINANCIERA

#### **PRESUPUESTO**

#### 2.1 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.

Los recursos asignados a la Planta el Salitre para el Funcionamiento, Operación y Mantenimiento se detallan en el siguiente cuadro de acuerdo a su ejecución con corte al mes de enero de 2022.

#### Cuentas por pagar:

Etiquetas de fila	Presupuesto Vigente	Compromisos Acum Li	beraciones PA	AC II Trimestre acum	Giros + Entradas	Saldo cxp	% Ejec Ptal	% Ejec PAC
<b>■ FUNCIONAMIENT</b>	0 6.428.058.750	6.428.058.750	0	4.948.412.536	1.096.024.304	5.332.034.446	17,05%	22,15%
2016	54.928.319	54.928.319	0	0	0	54.928.319	0,00%	#¡DIV/0!
2017	434.317.381	434.317.381	0	0	0	434.317.381	0,00%	#¡DIV/0!
2018	43.362.026	43.362.026	0	0	0	43.362.026	0,00%	#¡DIV/0!
2020	5.567.782	5.567.782	0	767.782	0	5.567.782	0,00%	0,00%
2021	5.889.883.242	5.889.883.242	0	4.947.644.754	1.096.024.304	4.793.858.938	18,61%	22,15%
■ OPERACIÓN	1.776.886.269	1.776.886.269	0	1.305.052.793	231.472.850	1.545.413.419	13,03%	17,74%
2021	1.776.886.269	1.776.886.269	0	1.305.052.793	231.472.850	1.545.413.419	13,03%	17,74%
Total general	8.204.945.019	8.204.945.019	0	6.253.465.329	1.327.497.154	6.877.447.865	16,18%	21,23%

#### Ejecución de la Vigencia:

Etiquetas de fila	Presupuesto Vigente	<b>Compromisos Acum</b>	PAC Acum	Giros + Entradas	% Ejec Ptal	% Ejec PAC
■ 25596 (PTAR)	50.838.553.000	11.165.650.726	4.315.557.954	0	0,00%	0,00%
FUNCIONAMIENTO	34.118.879.000	8.337.750.126	3.049.037.954	0	0,00%	0,00%
OPERACIÓN	16.719.674.000	2.827.900.600	1.266.520.000	0	0,00%	0,00%

#### 2.2 COSTO MENSUAL TRATAMIENTO PTAR SALITRE.

Los costos de ejecución con corte a enero de 2022 en la PTAR Salitre ascienden a la suma de \$ 1.490.640.016.00

## 3. GESTIÓN DE OPERACIÓN

#### Introducción

El fallo en segunda instancia a la sentencia del río Bogotá emitida por el Consejo de Estado en marzo de 2014, se ordenó la realización de diferentes acciones que garanticen la aplicación efectiva de los derechos colectivos a un ambiente sano, la salubridad pública y la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios a todos los habitantes de la cuenca del río Bogotá1; por lo cual se adelantó la adecuación de la PTAR SALITRE aumentando su capacidad a 7m3/s en procura de mejorar el tratamiento de los vertimientos generados en la zona norte de la ciudad.

Bajo este enfoque y de acuerdo a la planificación de cambios que viene realizando la EAAB desde el año 2019 y la medida cautelar proferida por la Magistrada Nelly Villamizar por el incidente 070, mediante auto del 1 de julio de 2021, proferido por su Despacho y en calidad de Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta, dentro del expediente 2001- 479, se ORDENÓ "(...) a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ que permita el ingreso de los lodos de la fase 2 de operación de tratamiento secundario de la PTAR SALITRE (...)", en el predio "LA MAGDALENA", cuya operación está a cargo de la empresa.

Así mismo, mediante auto del 15 de diciembre de 2021, el Despacho de la Magistrada Nelly Yolanda Villamizar, tiene por cumplida la orden por parte del Consorcio Interventor IVK, en lo que refiere a la expedición del certificado de aceptación de terminación del Hito 1. Así mismo, da por desacatada por parte de la representante legal de la "EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO doctora CRISTINA ARANGO OLAYA la medida cautelar decretada los días 10 y 13 de septiembre de 2021 mediante la cual se le ordenó procede a iniciar la operación de la PTAR SALITRE con la asistencia del CONSORCIO EXPANSIÓN PTAR SALITRE, no solo en relación con el inicio de la operación de la planta, sino con la medida cautelar de 1º de julio de 2021 en lo que refiere a la disposición de los biosólidos de la Fase II PTAR SALITRE en el Predio La Magdalena de conformidad con las razones expuestas en esta providencia"

La EAAB-ESP acatando las órdenes judiciales, entre ellos los autos proferidos por la honorable Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco de la Sentencia del saneamiento del Río Bogotá, inicia de manera inmediata, las actividades de Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre Ampliada y Optimizada.

Ahora bien, a partir del 16 de diciembre de 2021, la EAAB en compañía del CEPS, asume un proceso de operación asistida durante un año. En el siguiente informe se detalla lo encontrado a lo largo del mes analizado.

A continuación, se presenta un informe detallado de la operación en la PTAR El Salitre Fase 2 para el mes de enero 2022, en el cual se relacionan los aspectos más relevantes involucrados en el proceso de tratamiento de las aguas residuales.


#### 3.1 LINEA DE AGUA

#### 3.1.1 Comportamiento Canal Salitre y Elevación de Agua Cruda

Durante el mes de enero de 2022, el nivel registrado sobre el canal receptor del interceptor Salitre tuvo una tendencia pronunciada alta a la llegada en el punto elevación de agua para fase II, Para el periodo reportado, el interceptor Salitre mantuvo intervalos de cotas ajustadas entre 2540,820 – 2542,470 m.s.n.m. cómo se puede observar en la Grafica 1 - Niveles en el Canal Salitre y río Bogotá – enero 2022 vs. Precipitación. Este reporte gráfico permite la interpretación de los niveles presentados a lo largo del mes. Asociado a consignas citadas por personal de CEPS de mantener el canal por encima de 4 metros para evitar arrastres de sólidos, mientras que sobre el rio Bogotá se presentó un comportamiento normal con valores reportados sobre el intervalo generado entre la cota 2539,550 y 2541,330 m.s.n.m. Aclarando que, aunque se presentó el cierre total de compuertas en Fase II, todavía llega a la planta el agua residual bombeada por la Estación Elevadora Lisboa, la cual recoge y eleva al colector las aguas residuales del barrio asociado al nombre de este.

El reporte de lluvias en el canal para este mes exhibe una frecuencia mensual de ocurrencia igual al 58%, equivalente a 18 días en los cuales se presentó algún tipo de precipitación. Los valores de precipitación más alta se registraron el día 22 de enero con 10,60 mm en la estación Ferias, 2,20 mm en la estación de Bolivia, 2,60 mm en la estación de Suba, 21,80 mm en la estación de Usaquén, Cabe resaltar que todos los datos aquí reportados corresponden a precipitaciones de intensidad moderadas a altas.

Gráfica 3.1-1 Niveles en el Canal Salitre y río Bogotá – Enero 2022 vs. Precipitación.

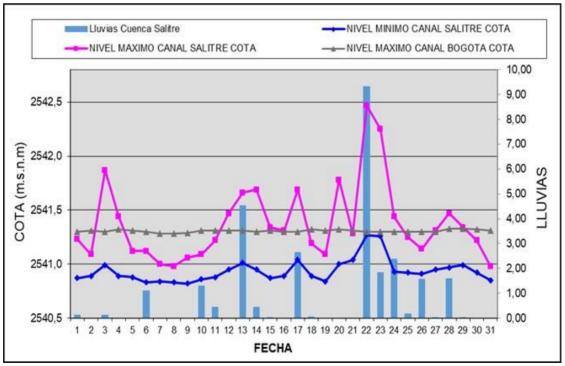


En el siguiente cuadro se muestran los datos de caudal de entrada y salida registrado en la planta, así como los volúmenes tratados de agua.

Cuadro 3.1-1 Caudales de entrada y salida de la PTAR Salitre Fase II registrados enero 2022.

Parámetro	Afluente	Efluente	Diferencia	
Caudal (m³/s)	4,57	4,57 4,2		
Volumen (m³)	12.252.746,30	11.246.120,10	1.006.626,20	

En registros de caudal se registró un promedio de operación de agua cruda igual 4,57 m3/s, fluctuando entre 3,50 m3/s y 8,59 m3/s, como se puede observar en la Grafica 2 - Caudal Promedio diario Agua Cruda. Este reporte gráfico permite la interpretación de los caudales captados a lo largo del mes.

Gráfica 3.1-2 Caudal Promedio diario Agua Cruda Enero 2022.

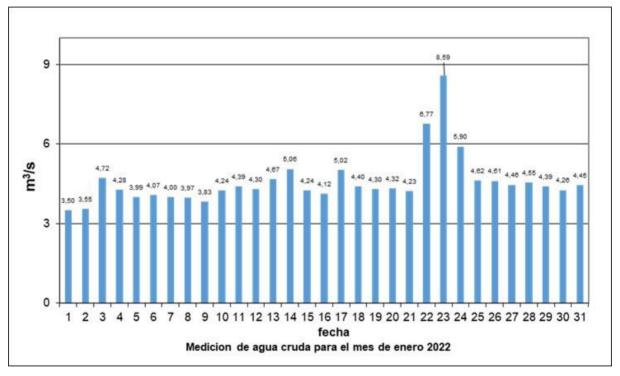

De acuerdo al análisis de la Gráfica 3.1-2, se establece que el volumen diario captados. varían de acuerdo al comportamiento de la población servida y a la influencia de la precipitación. Los valores de captación se incrementaron ocasionados por las lluvias para el 58% en las estaciones ubicadas en el área de influencia de la PTAR, (Ferias, Suba, Usaquén) afectando de manera directa el manejo del régimen hidráulico. Para el mes reportado, el volumen total elevado de agua cruda fue de 12.252.746,30 m3.

En la infraestructura instalada en Fase I, se realizó tratamiento al flujo correspondiente al entregado por la estación elevadora Lisboa, dado que no se ha conectado esta línea a PTAR Fase II. Para el presente periodo se registró un valor promedio de ingreso de agua cruda igual 0,15 m³/s, fluctuando entre 0,03 m³/s y 0,20 m³/s, generando al final del periodo un volumen total de agua captada en la PTAR El Salitre de 402,450 m³.

**LOGROS:** Se ha garantizado el tratamiento del agua que llega a la planta a través de la infraestructura instalada en la fase 2, captando en su totalidad en flujo que presenta el canal salitre. Asegurando a su vez que el drenaje del alcantarillado de la ciudad para las zonas 1 y 2 del Acueducto de Bogotá sea tratado en su totalidad

**DIFICULTAD:** Para el periodo analizado del informe se presentaron lluvias de intensidad moderadas a altas durante 18 días del mes, lo que provocó niveles altos en el canal de aducción a la planta, el cual opera con un sistema de rejas sumergidas que por diseño, solo contemplan la remoción de material grueso a través de una cuchara bivalva, la cual presenta fallas actualmente, lo que provoca una alta acumulación de residuos, aumentando los niveles hidráulicos de operación en esta zona, perdiendo volumen efectivo de amortiguación para eventos de alto caudal (>9 m³/s), afectando el nivel de bombeo y generando represamiento en los colectores que llegan a la planta.

**ACCIONES DE MEJORA:** Todas las acciones de mejora apuntan a que una vez se reciba la PTAR SALITRE ampliada y optimizada, se determine que acciones de mejorar puedan adelantarse, ya que la mayoría tienden a optimizar equipos en diferentes zonas de la planta.

#### 3.1.2 Cribado

El agua residual descargada sobre la estructura de pretratamiento a través de los colectores pertenecientes a la red troncal de EAAB ESP, ENCOR, MANCOR, I.R.B. y Lisboa, es conducida hasta la zona conocida como "trampa de rocas", en la cual, a través de la operación de una cuchara bivalva, se retira el material sobrenadante, retenido por un sistema de predesbaste de rejas con separación de 100 mm.

Posteriormente, el agua pasa por un sistema de rejas gruesas, el cual consta de 10 equipos instalados en paralelo con un espacio entre barrotes de 38 mm, el cual se encarga de retener los elementos gruesos que atravesaron el sistema de predesbaste. Este sistema es autolimpiante y dispone de un canal de entrega con compuertas que permiten bloquearlas para adelantar labores de mantenimiento.

Finalmente, el agua cruda es conducida a través de sistema de cribado fino con un sistema de rejas 10 rejas finas instaladas de la misma manera que las gruesas, en paralelo, pero con un un sistema de malla perforada que retiene elementos con tamaños mayores a 6 mm. De la misma manera que el cribado grueso, el sistema es autolimpiante y dispone de un canal de entrega con compuertas que permiten bloquearlas para adelantar labores de mantenimiento.

Los residuos retirados en los procesos de retiro en la zona de trampa de rocas, cribado grueso y cribado fino, son recogidos, transportados y dispuestos en el relleno Sanitario doña Juana -RSDJ por el operador BOGOTA LIMPIA SA ESP, de acuerdo al esquema de operación de áreas de servicio exclusivo, estipulado en la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios.

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de residuos retirados de trampa de roca, rejas gruesas y rejas finas para para el mes de enero 2022.

Cuadro 3.1-2 Cantidad de residuos retirados en trampa de rocas, cribado fino y arueso.

PUNTO DE TRATAMIENTO	Ton. Dispuestas en Relleno Sanitario Doña Juana
Trampa de Rocas	47,95
Rejas Gruesas	-
Rejas Finas	32,8
Total dispuesto RSDJ	80,75

#### 3.1.3 Grasas Materiales Flotantes y Arenas.

La remoción de grasas, material flotante y arenas, es realizado a través de un sistema de 5 puentes barredores longitudinales equipados con 6 sopladores de inyección de burbujas gruesas. Para retirar la arena sedimentada en el fondo de cada desarenador, se dispone de dos bombas centrifugas instaladas en cada puente. El retiro de del material flotante y grasas funciona a través de raspadores superficiales que van arrastrando todo material que flote en el recorrido del puente.

Los residuos resultantes de este proceso son enviados al sitio autorizado para disposición final. Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ a través del operador autorizado BOGOTA LIMPIA SA ESP.

En el siguiente cuadro, se muestra la cantidad de residuos retirados para el mes de enero de 2022.


Cuadro 3.1-3 Cantidad de residuos retirados en sobrenadantes, grasas, arenas y basura interna

RESIDUO	Ton. Dispuestas en Relleno Sanitario Doña Juana
Grasas	2,6
Arenas	23,6
Basura Interna	3.34

#### 3.1.4 Dosificación de Productos

En el mes de enero de 2022, se dosificó Hipoclorito de Sodio al 18% como medida para controlar los problemas asociados al crecimiento descontrolado de microorganismos filamentosos, los cuales pueden afectar el proceso adelantado en los reactores biológicos. Para el control de esta situación operativa, fueron gastados 179.34 m³.

La siguiente gráfica muestra las cantidades usadas durante el mes de Enero de 2022.

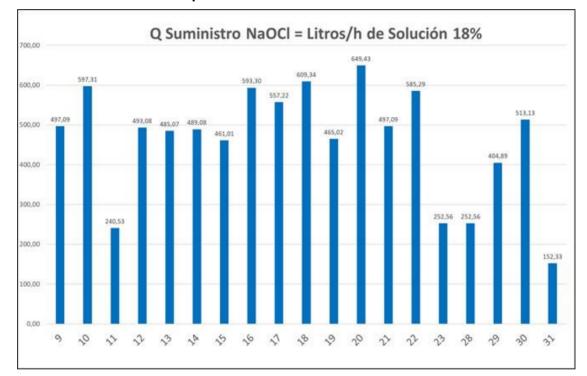

Gráfica 3.1-3 Hipoclorito de Sodio Utilizado en los Reactores.

Durante el mes de reporte, debido al tratamiento del agua elevada a fase I, correspondiente a la descarga de la estación elevadora Lisboa, se registró un promedio de aplicación de 30,90 g/m3 de Cloruro Férrico (FeCl3) para un total de producto consumido en el mes de 29.150,6 Kilogramos de Base Liquida y 0,70 g/m3 de ayudante de floculación. Para el polímero aniónico (FLOPAM AN 934) se registró un consumo de 282 Kg.

#### 3.1.5 Calidad de Agua Tratada.

En el desarrollo de la línea de tratamiento en la planta del agua residual, se establece como proceso previo a la decantación secundaria, el tratamiento biológico el cual consta de 6 reactores, con una capacidad de 25400 m³ por unidad y con un tipo de tratamiento de alta carga con aereación extendida.

Para el de mes de enero de 2022, se adelantó el proceso usando 5 reactores biológicos.

En el siguiente cuadro, se relaciona el valor promedio presentado para el mes de reporte, de acuerdo a las variables fisicoquímicas establecidas para el tratamiento biológico.

Cuadro 3.1-4 Licor de mezcla de Reactores Biológicos Enero 2022.

Reactor Biológico	рН	SST (mg/l)	SSV (mg/l)	Índice Volumétrico IVL (ml/g)
60,1	7,03	3129	2508	155
60,2	7,03	3320	2637	166
60,3	6,98	3062	2367	86
60,4	6,98	2990	2336	79
60,5	7,03	3941	3179	98

De acuerdo a la tabla anterior, para alcanzar una buena sedimentación y compactación de la biomasa floculenta, los valores establecidos para el índice volumétrico debe estar rangos <80 ml/g, (compactación y sedimentación excelente),<150 ml/g (compactación y sedimentación y sedimentación moderada), >150 ml/g (compactación y sedimentación pobre) permitiendo confirmar perdida de eficiencia de los reactores¹ 60.1 - 60.2 por encima de los parámetros deseados ocasionados por temas de bacterias filamentosas que generan esponjamiento de los lodos, formación de espumas y natas a lo largo del proceso del agua.

En cuanto a los alcances operativos en cargas eliminadas, se obtuvo una eliminación de 1.636,50 Ton. de SST y 2.493,39 Ton. de DBO5. En la siguiente tabla se detallan los datos de carga removida:

Cuadro 3.1-5 Carga removida y concentraciones para SST y DBO5 reportadas Enero de 2022.


PARÁMETRO	Caudal Afluente (m3/s)	Concentración de entrada (mg/l)	Caudal Efluente (m3/s)	Concentración de salida (mg/l)	Carga Removida (Ton.)
SST	4,57	140,98	4,2	14,18	1.636,50
DBO5	4,57	226,61	4,2	21,06	2.493,39

Producto del tratamiento primario y secundario adelantado, se removieron en total 1.636,50 Ton. de SST en base seca, para un promedio diario de 52,79 Ton/día. En la Gráfica 3-1-4 se muestra que la menor carga removida sucedió durante el día12 de enero de 2022, con valores reportados de 16,49 Ton/día respectivamente. El valor máximo alcanzado para el mes de reporte de carga removida se presentó el 23 de enero 2022, con un registro de 183,74 Ton/día.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grady, L., Daigger, G., Lim, H. (1999). Biological Wastewater Treatment. 2° Ed. Marcel Dekker, Inc. New York, 1075 pp.

En términos de DBO<sub>5</sub>, la carga de materia orgánica removida fue de 2.493,39 Ton en base seca, para un promedio de 80,43 Ton/día. En la Gráfica 3.1-4, se muestra el comportamiento diario de la carga eliminada tanto para SST como para DBO<sub>5</sub>, la cual permite establecer que el día de menor carga removida se ubica el 15 de enero 2022, con reporte de 24,71 Ton/día, y el día donde se obtuvo la mayor carga registrada fue el 28 de enero 2022, con reporte de 128,01 Ton/día respectivamente.

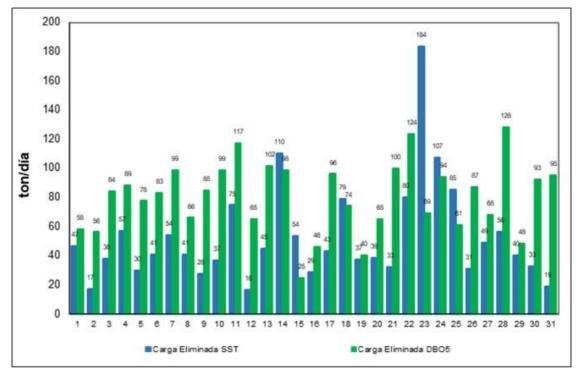

Gráfica 3.1-4 Carga Eliminada de Sólidos y DBO5 (Ton/día) Enero de 2022.

Para los parámetros de temperatura y pH medidos al agua tratada, se obtuvieron valores de 19,83 °C y 7,20 respectivamente. Estos valores se consideran "normales" para el tratamiento adelantado en la PTAR EL SALITRE ampliada y optimizada.


#### 3.1.6 Sólidos Suspendidos Totales

La Gráfica 3.1-5 muestra las curvas de concentraciones ponderadas de SST en agua cruda y tratada para el mes del reporte. Durante este, las concentraciones de sólidos suspendidos totales presentaron un promedio de 140,98 mg/l en el agua cruda.

Respecto al valor de concentración promedio de sólidos suspendidos totales para el mes de enero en agua tratada, se obtuvo un resultado de 14,18 mg/l, con concentraciones de SST entre 5 mg/l, dato presentado los días 4,5 y 6 enero 2022 y 28 mg/l como dato más alto presentado el día 12 de enero 2022.

A lo largo del mes no se presentó ningún reporte de concentración por encima de los valores máximos definidos en la licencia ambiental.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de las concentraciones del efluente durante el mes de enero 2022.

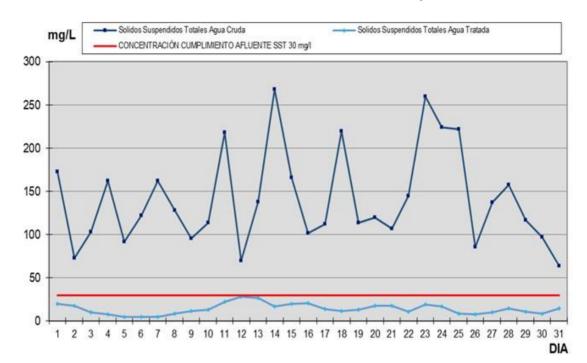

Gráfica 3.1-5 Variación Concentraciones SST en Afluente y Efluente - Enero 2022.

#### 3.1.7 Demanda Biológica de Oxígeno

El comportamiento de la DBO $_5$  durante el mes de enero arrojó un valor promedio en el afluente de 226,61 mg  $O_2/I$ . El valor máximo de concentración registrado fue de 359 mg  $O_2/I$ , presentado el día 28 y el valor más bajo alcanzado fue de 75 mg $O_2/I$ , reportado el 15 de enero. En la Gráfica 6 - se observa el comportamiento de la DBO $_5$ .

En el agua tratada, el comportamiento del citado parámetro registró valores que oscilan entre 6 mgO<sub>2</sub>/l, reportado el día 23 de enero 2022, y un valor máximo registrado fue de 40 mgO<sub>2</sub>/l, obtenido el día 11 de enero. La concentración promedio del efluente para el mes del reporte fue de 21,06 mgO<sub>2</sub>/l.


A su vez se presentaron 7 días con reporte de concentraciones de salida por encima de los valores mínimos definidos para brindar cumplimiento. En la siguiente tabla se muestran los días con los reportes más altos.

Cuadro 3.1-6 Relación de fechas y resultados asociados a valores de concentración de DBO5 Que superan los 30 mg/L.

Día	Concentración Efluente DBO <sub>5</sub> (mgO2/l)
4	31
6	31
11	40
27	33
28	35
30	35
31	36

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de las concentraciones del efluente durante la operación de la planta para el mes de enero 2022.

Gráfica 3.1-6 Variación Concentraciones DBO5 en Afluente y Efluente Enero 2022.

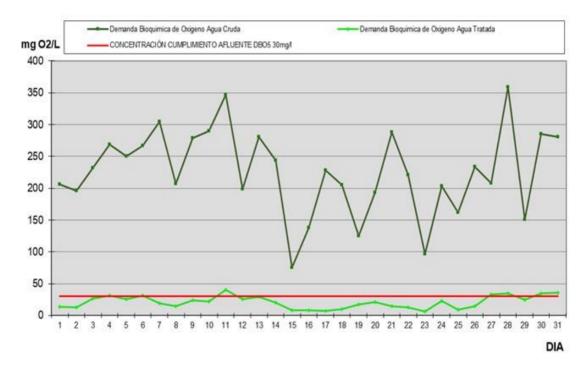

#### 3.1.8 Sobrenadantes, Grasas y aceites

En el siguiente cuadro se reporta los resultados obtenidos de la muestra mensual tomada por el laboratorio de la EAAB para el mes de enero 2022.

Cuadro 3.1-7 Concentración del parámetro Grasas y aceites para el mes de enero 2022

ORIGEN DE MUESTRA	Valor concentración
AFLUENTE (mg/L)	77
EFLUENTE (mg/L)	5

De acuerdo a la tabla anterior, el valor registrado en el efluente de 5 mg/L, se encuentra dentro del rango establecido en la resolución 631 de 2015 del MADS "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones", la cual establece para prestadores del servicio de público de alcantarillado, con una carga mayor a 3000 kg/día DBO5, un valor máximo de 10 mg/L en el efluente.

#### 3.1.9 pH

El valor promedio para pH en el efluente para el mes de enero, alcanzó un dato de 7,20 el cual sugiere un comportamiento normal para la operación de la planta y se encuentra dentro de la norma mencionada en el ítem anterior, la cual establece un rango permitido entre 6 y 9 unidades de potencial de hidrógeno.

#### 3.1.10 Temperatura

El valor promedio para la temperatura en el efluente para el mes de enero, alcanzó un dato de 19,83 °C, el cual sugiere un comportamiento normal para la operación de la planta y se encuentra dentro de la norma mencionada en el ítem 2.1.6.3., la cual refiere un valor máximo de 40 C para cualquier tipo de vertimiento.

#### 3.1.11 Tratamiento de agua - FASE I

Para el presente mes evaluado, los datos de remoción y cargas obtenidas en el tratamiento que se llevó a través de la infraestructura en PTAR El Salitre Fase I. alcanzaron valores de 78,41% para SST y 46,19% para DBO<sub>5</sub>, presentándose el día 28, la remoción más baja del mes con 40,89% de SST y 7,29% de DBO<sub>5</sub>, con una concentración de entrada de SST de 302,80 mg/l.

En cuanto a los alcances operativos para el mes de enero en el tratamiento del agua residual, se obtuvo una carga removida de 79,77 Ton. de SST y 50,79 Ton. de DBO₅ durante el mes. Las concentraciones de sólidos presentaron un promedio de 498,13 mg/l en el agua cruda y 112,03 mg/l en el agua tratada.

El comportamiento de la DBO₅ durante el mes de enero arrojó un valor promedio en el afluente de 666,64 mg/l, mientras que en el agua tratada la concentración promedio del efluente para el mes alcanzó un valor de 373,63 mg/l O₂.

**LOGROS**: Durante el mes de enero de 2022 se dejaron de verter al rio Bogotá, 1.636,50 Ton. de SST y 2.493,39 Ton. de DBO<sub>5</sub>, correspondiente al cálculo de cargas contaminantes para cada parámetro.

**DIFICULTAD**: Para el mes de enero se presentaron dificultades en el los reactores Biológicos, específicamente en las balsas 60.1 - 60.2 por manejo de bacterias filamentosas. Su proliferación puede provocar esponjamiento de los lodos, formación de espumas y natas en reactores biológicos y sedimentadores secundarios, afectando en algunas ocasiones la remoción de material orgánico.

**ACCIONES DE MEJORA:** Se continuará el seguimiento a la eficiencia de los reactores dando continuidad la aplicación hipoclorito sodio para controlar el crecimiento desmedido de bacterias filamentosas.

#### 3.2 LINEA DE LODOS

Procedentes del área de Decantación primaria Fase I, se extrajeron lodos con valor promedio de concentración de 12,83 gr/l en la batería uno y 31,27 gr/l en la batería dos. El volumen promedio mensual de extracción de los sedimentadores 4-1 al 4-4, fue de 278,41 m3/d, el cual se ubica en los rangos de operación bajos. Para los decantadores 4-5 al 4-8 la extracción de lodo alcanzó un valor de 208,61 m3/d, valores que se ubica en rangos bajos. Para la Decantación primaria de Fase II se extrajeron lodos con valor promedio de concentración de 10,92 gr/l en edificio 58-1, 9,36 gr/l en edificio 58-2 y para el edifico 58-3 un valor de 5.86 g/l. El volumen promedio mensual de extracción de los decantadores 57-1 al 57-6, fue de 1.546,70 m3/d y un total de 143.844 m3 de lodo primario bombeado hacia espesamiento.

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de la línea de lodos.


Cuadro 3.2-1 Datos línea de lodos Enero 2022

Parámetro	Registro
Lodo primario Fase I	13.358 m <sup>3</sup>
Lodo primario Fase II	143.844,56 m <sup>3</sup>
Rechazado Reactores	217.179,72 m <sup>3</sup>
Lodo Mesas espesadoras	216.004,70 m <sup>3</sup>
Lodo espesadores por gravedad	31.851,47 m <sup>3</sup>
Lodo digerido	59.801,68 m <sup>3</sup>
Lodo deshidratado centrifugas	53.028,10 m <sup>3</sup>
Lodo deshidratado filtrobandas	4.580 m <sup>3</sup>
Lodo Bypass Mixto a digerido	2110.08 m <sup>3</sup>
Biosólido generado	4563,68 Ton.
Sequedad del biosólido	24,92%

#### 3.2.1 Mesas Espesadoras

El lodo de rechazo (WAS) proveniente del proceso de lodos activados debe tener ciertas características específicas como la concentración antes de ingresar al proceso de digestión. Para alcanzar los valores requeridos de concentración (5-30 g/L²), se debe espesar este lodo, para lo cual, la PTAR El Salitre ampliada y optimizada, dispone de ocho (8) Mesas Espesadoras, en las cuales se lleva a cabo el proceso de separación de una fracción de agua al lodo, a través de la dosificación de una mezcla de polímero y agua al lodo. Esta mezcla es transportada por una cinta horizontal porosa en movimiento, de tal modo que se alcancen los valores de concentración requeridos.

Gráfica 3.2-1 Caudal WAS (m3/día) /Concentración SST (mg/l) / Consumo Polímero (Kg/día) Enero 2022.

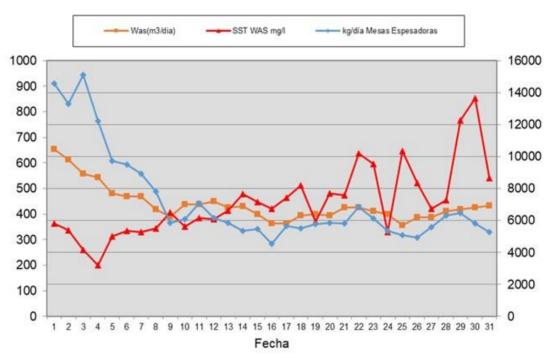

El volumen total tratado de lodo de rechazo WAS para este mes fue de 217.179,72 m³, se obtuvo el valor de 5700 m³/día el cual fue el menor valor desechado obtenido el día 19 enero 2022, como valor más alto de 10448 m³/día presentado el día 31 del mes en curso.

Las concentraciones de SST para lodo espesado por mesas promedio obtenida durante el mes fue de 7,14 g/l, el día 4 enero 2022 se registró el menor valor 3,19 g/l y el día 30 del presente mes se registró el máximo valor obtenido de 13,65 g/l.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Manual de instalación, operación y mantenimiento – Espesador de banda por gravedad EMO.

El consumo de polímero para el mes fue de 14.000,92 Kg, para el día 16 enero 2022 se presentó el menor consumo de producto 285,32 Kg, y el consumo más alto fue de 944,34 Kg presentado el 3 de enero. En el área se usaron dos referencias de polímero Catiónico, Flopam 4190 VHM utilizado desde 1 enero hasta el 28 enero de 2022, y Flopam FO 4490 VHM AN para los 3 últimos días del mes.

Con los datos obtenidos y el análisis de la Gráfica 7 - Caudal WAS (m³/día) /Concentración SST (mg/l) / Consumo Polímero (Kg/día), se evidencia el exceso en las dosificaciones de polímero ya que con consumos promedio se obtuvieron resultados similares a las dosificaciones de consumos altos, dejando como referencia que el caudal tratado fue relativamente estable durante el mes sin evidenciar picos de caudal de lodo WAS.

**LOGROS**: durante este mes se trató el 100% del lodo de rechazo WAS 217.179,72 m<sup>3</sup>, obteniendo los resultados deseados de concentración adecuadas de lodo espesado por mesas hacia el tanque de lodos mixtos.

**DIFICULTAD**: durante este periodo de tiempo, se observaron formaciones de grumos de polímero en los tanques del skid de preparación de polímero, características negativas provenientes del mal funcionamiento del equipo generando una mala preparación del producto, lo que infiere un consumo mayor como se puede evidenciar en el Gráfica 7 - Caudal WAS (m³/día) /Concentración SST (mg/l) / Consumo Polímero (Kg/día), los Skid de preparación de polímero presentaron fallas en algunos de sus componentes que no permitieron la utilización de algunos de ellos. La falla más recurrente es la rotura del tornillo sin fin de alimentación a la tolva de preparación, en la gran mayoría de Skid de preparación de polímero no se tienen todos los tornillos operativos, lo cual obligo a el personal operativo a realizar el cargue de esta tolva de forma manual generando riesgos físicos sobre el trabajador y locativos sobre el equipo.

**ACCIONES DE MEJORA:** Todas las acciones de mejora apuntan a que una vez se reciba la PTAR SALITRE ampliada y optimizada, se determinarán acciones de mejora en la planta, las cuales involucran en su mayoría, la optimización de diferentes equipos en la planta.

#### 3.2.2 Digestión

De acuerdo al proceso de digestión adelantado, el cual recibe una mezcla de lodo espesado derivado de las purgas de los decantadores primarios, y el deshidratado en mesas espesadoras del rechazo proveniente de los reactores biológicos, se monitorean las variables necesarias para garantizar la estabilidad del tratamiento. En el anexo 6 se compilan los diferentes parámetros evaluados para el proceso.

El proceso de digestión anaerobia para el presente mes alcanzó un promedio de biogás de 25.411,15 nm3/día, de acuerdo a la sumatoria de las unidades de digestión disponibles, las cuales se comportan de acuerdo al cargue de digestión y la producción de lodo. En la Gráfica 8 se registra la producción de Biogás generado en cada uno de los biodigestores.


A partir del control de proceso adelantado; la operación registró lodos digeridos con las siguientes características: AGV's con valores promedio de 346 mg/L; pH entre 7,30 y 7,76 unidades, alcalinidades promedio cercanas a los 2693,36 mg CaCO3/L, garantizando valores bajos de la relación AGV's / Alcalinidad para los digestores y un contenido de sólidos volátiles promedio de 10,93 g/l.

La producción de biogás del mes fue de 780.512,52 nm³, con una generación promedio/día de biogás de 5.082,23 nm³ y remociones promedio de material volátil del 48% para el digestor 72-1, 2.689,15 nm³ y remociones promedio de material volátil del 51% para el digestor 72-2, 8.978,62 nm³ y remociones promedios de material volátil de 48% para el digestor 72-3 , 6.336,70 nm³ y remociones promedios de material volátil de 50% para el digestor 72-4, y remociones promedio de material volátil del 42% para el digestor 72-5 y 1.446,60 nm³.

A partir del control de proceso adelantado se realizó a principios del mes, la puesta en marcha del digestor 72-5, realizando transvase de lodo digerido acompañado de alimentación de lodo crudo a partir del 06 enero 2022, aumentando de manera gradual el cargue del mismo.

En cuanto a los AGV's se presentaron valores dentro de los rangos de operación normal del sistema de digestión anaerobia.

La Gráfica 3.2-2 - muestra la tendencia en la producción de biogás

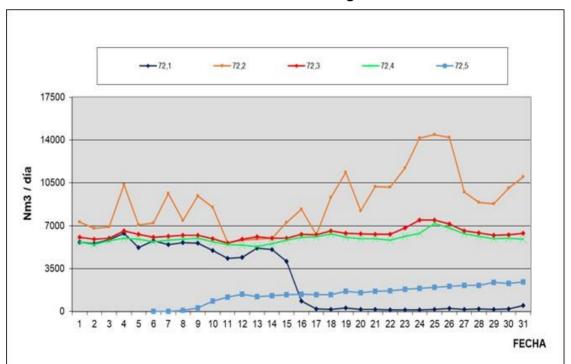

Gráfica 3.2-2 Producción de Biogás Enero 2022

**LOGROS**: Durante el mes de enero de 2022, se obtuvo un promedio de remoción de material volátil de 43%, disminuyendo de manera considerable su carga, estabilizándolos para hacerlos de esta manera menos nocivos al medio ambiente.


**DIFICULTAD**: Para el mes de enero se presentaron dificultades en la digestión, específicamente en el digestor 72-1, pues hubo una reducción del flujo, lo que provocó que 2110.08 m³ de lodo mixto fuera enviado de manera directa al tanque de lodo digeridos.

**ACCIONES DE MEJORA:** Para mejorar la eliminación de material orgánico y poder controlar la cantidad de lodo que se genera en los biológico, se inició la puesta en marcha del digestor 72-5.

#### 3.2.3 Centrifugas

Respecto a la operación de centrifugas, para para el mes de enero 2022, se registró una producción promedio diaria de 151,74 Ton. de biosólido, para un total de 4248,650 Ton/mes. El porcentaje de sequedad promedio obtenido en proceso del biosólido fue de 24,92%.

En la Gráfica 3.2-3 - se muestra sequedad de biosólido para el mes evaluado. El valor de dosis promedio demandada de polímero catiónico fue de 12,67 kg por tonelada de material seco, considerado como un consumo alto dado que en diseño se tiene contemplado 10 kg por tonelada de material seco, el polímero Catiónico usado en el área Flopam FO 4490 VHM AN, para los días 8, 9, 10 de enero 2022 no se deshidrato dado que el flujo de lodo digerido fue utilizado para puesta en marcha digestor 72-5.

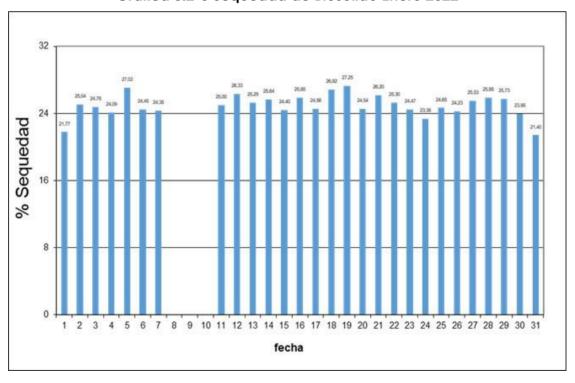

Gráfica 3.2-3 Sequedad de Biosólido Enero 2022

Durante los días 15, 16, 17 y 18 de enero 2022, se adelantó deshidratación de lodos a través de la infraestructura instalada en fase I, debido a un problema surgido con las bombas que cargan los silos. El total de lodo deshidratado en fase I, alcanzó un valor de 315,03 Ton/mes. Para el mes evaluado la dosis promedio demandada de polímero catiónico fue de 16,67 kg por tonelada de material seco, para el correcto funcionamiento de la zona se utilizó el polímero Catiónico Flopam FO 4190 y se utilizó un total de 725 kg.

**LOGROS**: Durante el mes de enero de 2022, se registró una producción total de lodo deshidratado por la centrifuga - Filtrobandas de 4563,68 Ton/mes. La sequedad asociada a esta producción de material, alcanzó un promedio de 25,41%

**DIFICULTAD**: Para el mes de enero se presentaron dificultades en los equipos que impulsan el biosólido hacia los silos de almacenamiento, pues debido a una pérdida de eficiencia en estos, fue requerido adelantar deshidratación de lodos en fase I, enviando digerido hacia el almacenador de lodos de fase I y realizar el proceso de deshidratación a través filtro prensas.

Este evento involucró acciones no previstas desde la división operativa, debido al movimiento de polímero y personal operativo para atender la necesidad de deshidratación de lodos.

En cuanto a la preparación de polímero en fase II, las fallas recurrentes en los skid de preparación de polímero asociados a roturas de tornillos de alimentación a tolvas, generó una condición insegura para el personal operativo, debido a la modificación en la maniobra del cargue de polímero, pues el operador en procura de garantizar la continuidad del proceso, debía cargar la tolva de forma manual generando riesgos físicos sobre el trabajador y locativos sobre el equipo.

**ACCIONES DE MEJORA:** Para mejorar la eliminación de material orgánico y poder controlar la cantidad de lodo que se genera en los biológico, se dio puesta en marcha del digestor 72-5. A su vez se realizaron pruebas con los índices de dosificación para mejorar la calidad y preparación de polímero en los Skid.

#### 3.3 TRATAMIENTO DEL BIOGÁS - MOTOGENERACIÓN

El biogás producido en la planta se somete a un proceso de eliminación de impurezas para poder utilizarlo como combustible tanto ellos motogeneradores como en calderas debe ser sometido a un tratamiento para mejorar sus características como combustible, y proteger de las impurezas que contiene principalmente a los equipos de motogeneración.


La planta de tratamiento de biogás (PTG) tiene por objetivo la reducción/eliminación de componentes tales como humedad, H<sub>2</sub>S, siloxanos, así como el ajuste de la temperatura del biogás a la entrada a motores. Para el mes analizado se realizó una recuperación de 697.583 nm³/mes para su posterior uso en los cogeneradores.

En el presente mes en el proceso de cogeneración se reutilizaron 697.583 nm³/día de biogás y 94.032,66 m³ de gas natural, en este proceso se generaron 2.240.820,00 Kw de energía eléctrica.

El calor recuperado del circuito de alta temperatura del motor (refrigeración de camisas) es utilizado en el proceso de calefacción de los lodos. Así mismo se reutilizan 20.185,97 nm³/día de biogás para las calderas y 10.153,34 m³ de gas natural para mantener la temperatura óptima que requiere la digestión anaerobia mesofílica alrededor de 37°C.

La línea de gas se completa con las teas (antorchas), cuyo objeto es el quemado del biogás excedente en el proceso. Para el mes de enero se quemaron 15.358,15 nm³/día de biogás.

A continuación, se detalla consumo diario de biogás - gas natural utilizado en el proceso

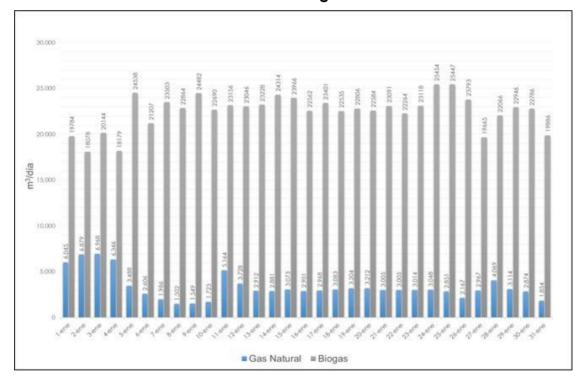

Gráfica 3.3-1 Consumo Diario de Biogás - Gas natural Enero 2022.

**LOGROS**: Durante el mes de enero de 2022, se aprovecharon 717.769 nm³ de biogás en el proceso a su vez se generaron 2.240.820 kw de energía eléctrica.

**DIFICULTAD**: Para el mes de enero se presentaron dificultades en el área, específicamente con el equipo analizador de  $H_2S$ , siloxanos que se encuentra en la línea de descarga del flujo de planta de recuperación de biogás, y no registra datos de calibración.

**ACCIONES DE MEJORA:** realizar verificaciones del sistema de cogeneración, generando mayor control de variables de producción referente a consumos de biogás y gas natural en el sistema.

#### 3.4 CARGUE Y TRANSPORTE DE BIOSÓLIDOS

El transporte de Biosólido desde la PTAR el Salitre hasta el predio El Corzo, se realiza con vehículos doble Troque de capacidad de 15 Ton aproximadamente, los cuales operan de forma intermitente 24 horas al día los 7 días a la semana. Para el período de ejecución del 1 al 31 de enero de 2022, la operación de la PTAR El Salitre ampliada y optimizada, realizó el transporte 4563,68 toneladas de biosólido,

El cargue actual de biosólidos de la PTAR SALITRE ampliada y optimizada dado que las condiciones operativas cambiaron debido a la ampliación de la planta, el cargue del biosólido actualmente opera a través de apertura y cierre de silos. Cada silo tiene un volumen de 120 m³, y para el almacenamiento se encuentran ubicados seis estructuras de este tipo.

En el sentido que la puesta en marcha de la PTAR SALITRE FASE Il inicio a partir del 16 de diciembre de 2021, la operación será asistida entre el consorcio CEPS (CONSORCIO EXPANSIÓN SALITRE) y la empresa de ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA (EAAB), dicho lo anterior la producción y transporte de biosólidos quedo a cargo de Aguas de Bogotá SA ESP (AB)

INGRESO A LA PTAR SALITRE

REGISTRO DE PESO DE INGRESO

CARGUE BIOSÓLIDO

CARGUE BIOSÓLIDO

LIMPIEZA DEL ÁREA DE SILOS

REGISTRO DE PESO DE SALIDA

CARPADO VOLQUETA

Imagen 3.4-1 Actividades asociadas al carque y transporte de biosólido

Diariamente en la zona de cargue de los vehículos de transporte del biosólidos se desarrollan las siguientes actividades:

**Revisión De Vehículos:** La revisión diaria de cada uno de los vehículos permite garantizar las condiciones de operación, seguridad, y ambiental establecidas en el plan de manejo, como condiciones hidráulicas, carpado, capacidad de los vehículos, entre otros, este seguimiento se realiza mediante un checklist de inspección preoperacional

**Seguimiento y control:** El auxiliar de patio de área de operaciones de biosólidos, junto con el Operador Técnico del área de silos realizan el seguimiento y control al cargue a cada una de las volquetas establecidas para tal fin, verificando que el volumen no sobrepase la capacidad de carga, para posteriormente registrar los pesajes del biosólido en el formato preoperacional de patio.

**Aseo general:** diariamente se realizan actividades de aseo, limpieza y lavado en la bodega, en la zona de silos en el patio de cargue, en las áreas con caída de material, zona de pretratamiento, hilazas de la zona de espesadores, en las vías y desde el sito de cargue hasta la portería en la báscula, para evitar malos olores y mantener el orden y aseo de la zona.

Aseo general de zona de silos, ver fotografia No.1.






# 3.4.1 Ruta del Transporte del Biosólido desde PTAR El Salitre Hasta dl Patio de Secado Predio El Corzo

La ruta de transporte que actualmente toman los vehículos hacia el patio de secado fue planeada conforme a lo establecido en el PMA para el predio El Corzo I: "Aprovechamiento del biosólido en mezcla con suelo para la cobertura del predio El Corzo I", aprobado por la Resolución CAR 3292 de diciembre del 2017 se culminó el aprovechamiento, sin embargo desde enero del 2018 se está utilizando el predio La Magdalena el cual fue autorizado por medio de la Resolución 1301 de 2016 emitido por la Autoridad Nacional Licencias Ambientales.

La ruta de aproximadamente 25 Km que realizan los vehículos para el transporte del biosólido desde la PTAR El Salitre hacia el Predio El Corzo es: PTAR – calle 80 – avenida Ciudad de Cali – calle 49 sur N° 95 A – 90 Bosa.

Imagen 3.4-2 Ruta a predio El Corzo

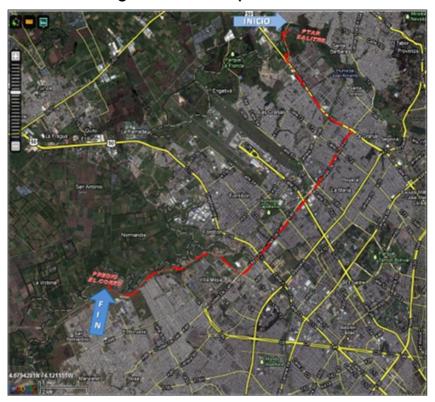

Fuente: Google Maps, 2015

Imagen 3.4-3 Recorrido entre predio El Corzo y predio La Magdalena



#### 3.4.2 Aprovechamiento del Biosólido

Las 4563.68 Toneladas Transportadas desde PTAR el Salitre FASE II hacia el Predio El Corzo del 1 al 31 de enero de 2021 fueron acondicionadas en la zona de procesamiento (patio de secado), efectuándose el proceso de extensión, nivelación, volteo y secado según las especificaciones establecidas en al plan de manejo ambiental PMA. Este ítem se desarrolla en general como se muestra en la imagen No. 3.4-4 Actividades para el aprovechamiento del Biosólido, predio El Corzo y La Magdalena.

DESCARGUE EN EL PATIO DE SECADO

EXTENDIDO Y VOLTEO BIOSÓLIDO

CARGUE DE BIOSÓLIDO PARA
APROVECHAMIENTO

RESTAURACIÓN VEGETAL

PROPORCIÓN 3:1

CARGUE DE BIOSÓLIDO PARA
APROVECHAMIENTO

DESCARGUE DE BIOSÓLIDO EN CELDA

Imagen 3.4-4 Actividades para el aprovechamiento del e Biosólido, predio el Corzo y la Magdalena

En el patio de secado se realizaron las siguientes actividades:

**Recepción y extendido:** Diariamente salen de la PTAR El Salitre las volquetas con el biosólido producto de la estabilización del lodo, producto del tratamiento de las aguas residuales tratadas por la planta. El biosólido recibido es descargado en el submódulo indicado por el controlador de patio y se extiende en capas de 0,5 m de altura formando una división entre los submódulos.

**Control de olores:** Como parte de las actividades tendientes al control de olores generados, una vez el biosólido es descargado y extendido en el patio de secado, el controlador de patio realiza inmediatamente una (1) aplicación (aspersión) de 3,0 litros del producto (ECCO ODOR 200), llevando un control de la aplicación del producto para control de olores.

**Volteo:** A los cinco (5) días es realizado el volteo por medio de la retroexcavadora de llantas y se aplica de nuevo el producto inhibidor de olores.

Cargue para aprovechamiento: Una vez el material ha cumplido con el proceso de secado es cargado en volqueta doble troque de capacidad 15 m3 aproximadamente y transportado hacia el predio la Magdalena, donde se realiza la mezcla del biosólido con el suelo en proporción 3:1 Biosólido: Suelo, como aprovechamiento del biosólido para enmienda de las características del suelo.

**Limpieza de canaletas y piezómetros:** Durante el turno, el controlador de patio realiza el retiro de material caído dentro de la canaleta, escurriendo el agua lluvia y hace el deshierbe de los piezómetros.

Fotografía 2. Zona de procesamiento, extensión, nivelación, volteo y secado Predio el Corzo



Fotografía 3. Aplicación de inhibidor de olores



Durante el mes de enero de 2022, fueron aprovechadas 4698.52 toneladas transportadas desde el patio de secado ubicado en el Predio el Corzo hasta las celdas de aprovechamiento en el Predio la Magdalena, correspondiente a 404 viajes con un peso promedio por viaje de 11.63 toneladas aproximadamente. El aprovechamiento del biosólido fue realizado en las celdas del Predio la Magdalena, según lo establecido en la Resolución 1301 de octubre de 2016.

El área utilizada para el aprovechamiento del biosólido durante el mes de enero fue de 0,2963 ha.; las cuales fueron mezcladas en proporción 1:3 con el suelo en la celda No. 3 (0,1085 ha), y en la celda No. 4 (0.1878 ha), realizando esta actividad con los equipos que se muestran en la fotografía No.4.

Las actividades asociadas al aprovechamiento se realizan con los siguientes vehículos y maquinaria:

- (1) una Retroexcavadora de llanta tipo pajarita en ubicado en el patio de secado.
- (2) dos volquetas doble troque de 15 m3
- (1) una excavadora de oruga
- (1) Un Tractor de cadena Bulldozer

Fotografía 4. Maquinaria empleada en el patio de secado retroexcavadora de llanta tipo pajarita y el predio la Magdalena bulldozer y excavadora de oruga




# 3.4.3 Disposición de residuos de pretratamiento en el relleno sanitario doña Juana (RSDJ)

Actualmente las actividades de transporte y disposición de residuos ordinarios están a cargo del operador de aseo Bogotá Limpia SA ESP. A partir del 16 de diciembre el esquema operativo de la planta cambio, dado lo anterior la generación de residuos ordinarios aumento ya que se tienen puntos de generación adicionales, en este sentido los residuos ordinarios provendrán de la cámara de recepción o rocas, del cribado grueso y fino, arenas y sobrenadantes de la planta. En la Imagen No. 3.4-5 se observan las acciones implícitas para el proceso de recolección de residuos ordinarios.

Imagen 3.4-5 Actividades asociadas al cargue y disposición de residuos en el RSDJ



Imagen 3.4-6 Puntos de Generación de Residuos sólidos.

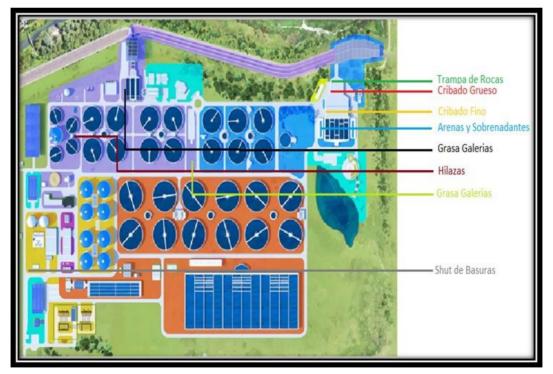

A partir del 16 de diciembre de 2021, con el nuevo esquema operativo de la planta y hasta el 31 de diciembre se realizaron trece (13) viajes; como se evidencia en el acta de inspección técnica con aforo que Bogotá Limpia entrega para verificación del ingreso del residuo al relleno Sanitario Doña Juana –RSDJ, se transportaron y dispusieron un total de 91.89 toneladas de residuos de pretratamiento, de las cuales 52.78 toneladas provienen de material de rejas finas, 14.20 toneladas provienen de material de rejas gruesas y 24.91 toneladas provienen de material de rocas o cámara de recepción.

Durante el mes de enero de 2022 se transportaron y dispusieron un total de 111.51 toneladas de residuos de pretratamiento, de las cuales 32.82 toneladas provienen de material de rejas finas, 47.95 toneladas provienen de material de rocas o cámara de recepción y 30.74 toneladas de arenas y sobrenadantes transportadas en vehículos de Bogotá Limpia S.A. ESP.

Para el transporte de los residuos de pretratamiento al Relleno Sanitario Doña Juana se realizaron quince (15) viajes; como se evidencia en el acta de inspección técnica con aforo que Bogotá Limpia entrega para verificación del ingreso del residuo al relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ, los cuales fueron concertados con la División Técnica y Operativa para dar salida a cada volcó de la PTAR El Salitre.

Durante el mes de enero de 2022 las actividades relacionadas con el transporte y disposición final de los residuos de pretratamiento provenientes del descargue de contenedores del material cribado, residuos de pretratamiento en los volcó ubicados en el área de rejas finas y rejas gruesas, grasa galerías (sobrenadantes), hilazas de la zona de espesadores y arenas, la recolección y disposición de residuos de pretratamiento se da por medio de contenedores de acuerdo a las actividades diarias

De igual manera dado que el esquema operativo de la planta cambio, Bogotá Limpia S.A. ESP tiene a cargo realizar la recolección de residuos ordinarios que se generan en las diferentes actividades de la planta como lo son puntos ecológicos, cafeterías y casino, los cuales son almacenados en un shut de basuras. Para el mes de enero se realizó la recolección mediante el carro compactador de 271 bolsas industriales equivalentes a 30,08 m³.

Fotografía 5. Contenedores del material cribado resultante de grasa galerías(sobrenadantes) y arenas







Fotografía 6. Residuos de pretratamiento provenientes del descargue de contenedores del material cribado resultante de Gruesos y Finos.





Fotografía 7. Residuos de pretratamiento provenientes del descargue de la cuchara bivalva



# 4. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO INTRODUCCIÓN

Como soporte a la gestión administrativa de la PTAR el Salitre se continúa con la implementación del sistema de información de mantenimiento SAP, en las áreas de mantenimiento, laboratorio y control de almacenes.

El Departamento de Mantenimiento Electromecánico de la PTAR el Salitre tiene bajo su responsabilidad mantener los equipos operativos de la planta, crear las órdenes de mantenimiento que sean necesarias para las intervenciones de los equipos mecánicos, eléctricos, electrónicos y de instrumentación, velando por el manejo de la información y el stock de repuestos en almacén para cualquier tipo de intervención. Para cumplir con esta gestión del mantenimiento, la PTAR Salitre cuenta con el siguiente personal: 1 jefe de división de mantenimiento electromecánico, 1 profesional de mantenimiento electromecánico, 1 Auxiliar de mantenimiento, 1 coordinador de mecánicos, 1 coordinador de electricistas, 1 coordinador de instrumentación 7 Técnicos Mecánicos y 6 Técnicos en electricistas y 2 Técnicos en Instrumentación.

A partir del 16 de diciembre de 2022 se inicia la recepción de la PTAR fase II en conjunto con personal de CEPS EAAB, IVK & CAR. Por otro lado, se continúan realizando tareas de mantenimientos en conjunto con el personal de CEPS y AB para la PTAR Salitre fase II. Seguidamente se realizan también mantenimientos en PTAR Salitre fase I. Por otro lado, se organizan turnos de trabajo las 24 horas divididos en 3 grupos para suplir el apoyo de los respectivos mantenimientos para la PTAR salitre.

## 4.1 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

De acuerdo a la reestructuración del área de mantenimiento se integró el plan de mantenimiento eléctrico y mecánico, esto con el fin de tener control en el seguimiento de los indicadores del área.

Se realiza revisión a la programación de frecuencias del plan de mantenimiento, el cual se reevalúa la reducción en la generación de órdenes de trabajo preventivo debido al inicio de actividades en la PTAR fase II de acuerdo a la recepción y entrenamiento en mantenimiento de equipos respectivamente, dejando registró en una ayuda de memoria generada según programación.

Los mantenimientos que se reprograman para los siguientes meses se encuentran relacionados en el Anexo Cap 4 4.

#### 4.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo se genera de acuerdo al formato MPML0302F19-01 - Plan de Mantenimiento Preventivo PTAR el Salitre en donde se especifican las frecuencias de mantenimiento para las Ubicaciones Técnicas y Equipos de la PTAR. De igual forma se realizar el mantenimiento correctivo de acuerdo al formato MPML0301F04-01 Seguimiento de Solicitud Mantto, los cuales van de la mano para el análisis detallado del índice de mantenimiento y la matriz de equipos críticos.

#### 4.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Las órdenes generadas bajo este tipo de mantenimiento, son las que provienen las rutas de inspección de las solicitudes de los usuarios de mantenimiento, o del personal que reporte una inconsistencia en un equipo. Estos trabajos en algunas ocasiones no son de ejecución inmediata y permiten realizar una planeación y programación de tareas a realizar y los recursos a utilizar.

La gestión del mantenimiento correctivo se realiza a través del programa SAP, para ello se están realizando ajustes en los procedimientos para el reporte de fallas y el trámite correspondiente de las órdenes.

## 4.4 DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS

En los cuadros 4.4-1 y 4.4-2 se relacionan los equipos críticos disponibles y los equipos que se encuentran fuera de servicio o con operación restringida.

El indicador de los equipos críticos se encuentra relacionados en el Anexo Cap 4 10.

Cuadro 4.4-1 Equipos Críticos enero 2022

Sistema	Equipo critico	Equipos instalados (EI)	Equipos disponibles (ED)
\$1	Equipos de supervisión sala de control	2	2
S2	Tornillos de elevación	5	3
\$3	Medidores de Caudal de agua cruda	10	10
S4	Rejas finas	4	4
S5	Bombas dosificadoras de cloruro ferrico	4	4
S6	Bombas de todas las aguas pretratamiento	2	2
S7	Celdas Subestación electrica principal	10	10
\$8	Bombas polimero	4	4
S9	Puentes desarenadores	3	3
\$10	Puentes decantadores	8	8
\$11	Clasificador de hilazas	1	1
\$12	Bombas de lodos espesados	3	3
\$13	Bombas de todas las aguas 13	3	3
\$14	Medidores de Caudal de agua tratada	5	5
\$15	Compresores de biogás	4	4
\$16	Bombas de recirculación	4	4
\$17	Calderas	2	2
\$18	Filtrobandas	5	4
\$19	Bandas transportadoras 12	5	5
S20	Rastrillo Viajero	1	1
\$21	Neveras Toma Muestras	2	2
S22	Bombas Descarga Cloruro Ferrico	2	2
S23	Compuertas PTAR Salitre	2	2

## Cuadro 4.4-2 Equipos Fuera de Servicio o con Operación Restringida

TAG	EQUIPO	DESCRIPCION	COMENTARIO	SOLUCION
	SUMINISTRO AIRE ARRANQUE	Falla eléctrica , no	compresión frenado. No se cuenta con	Se inicia proceso para la consecución de los repuestos y reparación de este equipo
	GENERA DOR	•		por un contratista externo.

De acuerdo a los cuadros anteriores se garantizó la disponibilidad de los equipos críticos para la operación por parte de mantenimiento.

## 4.5 INTERVENCIONES MAYORES

TAG	EQUIPO	TRABAJOS MAYORES	DIA			
	FASE I					
01P01D	Tornillo de Arquímedes d	Montaje de la caja y alineación puesta en marcha	01/01/2022 al 30/01/2022			
12SB01A	Filtro banda a	Se finalizo el montaje de los elementos faltantes se entrega a operaciones	01/01/2022 al 30/01/2022			
	FASE II					
076DEP001A	Mesa espesadora	Se realizo mantenimiento correctivo cambio de tela	01/01/2022 al 03/01/2022			
054D5801B	Puente desarenador	Reparación del cable guía	03/01/2022 al 05/01/2022			
054D58001E	Puente desarenador	Reparación de las ruedas	06/01/2022 al 10/01/2022			
061C001C	Soplador de biológicos	Se realizo cambio de cheque	10/01/2022			

#### 4.6 COSTOS

Como parte fundamental de la gestión de mantenimiento se relacionan los materiales utilizados durante el mes de enero, en las labores de mantenimiento y operación de la planta, igualmente se relacionan los costos de mano de obra, y los costos directos generados en la gestión Ambiental.

- Anexo Cap 4\_1 Consumo de energía eléctrica desde enero de 2019
- Anexo Cap 4\_ 2 Costo de la energía eléctrica comprada por KWH desde Enero 2019
- Anexo Cap 4\_ 3a Plan de mantenimiento enero 2022
- Anexo Cap 4 3b Plan de mantenimiento enero 2022
- Anexo Cap 4 4 Ordenes Reprogramadas de mantenimiento enero 2022
- Anexo Cap 4\_ 5 Descripción del mantenimiento por zonas
- Anexo Cap 4 6 Costo mano de obra por áreas
- Anexo Cap 4 7 Consolidado costo total por áreas
- Anexo Cap 4\_8 Consolidado costo total por áreas
- Anexo Cap 4 9 Órdenes de Trabajo por Zonas
- Anexo Cap 4\_ 10 Indicadores de Gestión

#### 4.7 GESTIÓN DE ENERGÍA


La gráfica 4.7-1 incorpora el consumo total de ACPM de la Planta, discriminando este valor para cada uno de los generadores y de igual forma para calderas.

En la gráfica 4.7-2 se presenta el consumo de energía eléctrica de la Planta desde enero de 2019.

Gráfica 4.7-1 Consumo de ACPM en los generadores y calderas durante el año 2022




Gráfica 4.7-2 Consumo de la energia eléctrica comprada en KWH desde enero de 2019

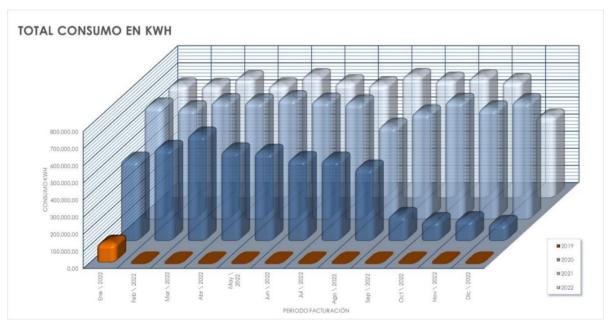

#### 4.8 HECHOS RELEVANTES EN EL MES DE ENERO:

- 1. Se realizaron labores de mantenimiento preventivo a los diferentes equipos de la planta programados para el mes de enero según modulo PM de SAP.
- 2. El contratista SAURUX termina el montaje del tornillo 01P01D queda alineado probado y de esta manera se termina con el proceso de reparación de este equipo y queda disponible y corregida la falla que lo mantuvo fuera de servicio.

Fotografía 8. Mantenimiento general tornillo D

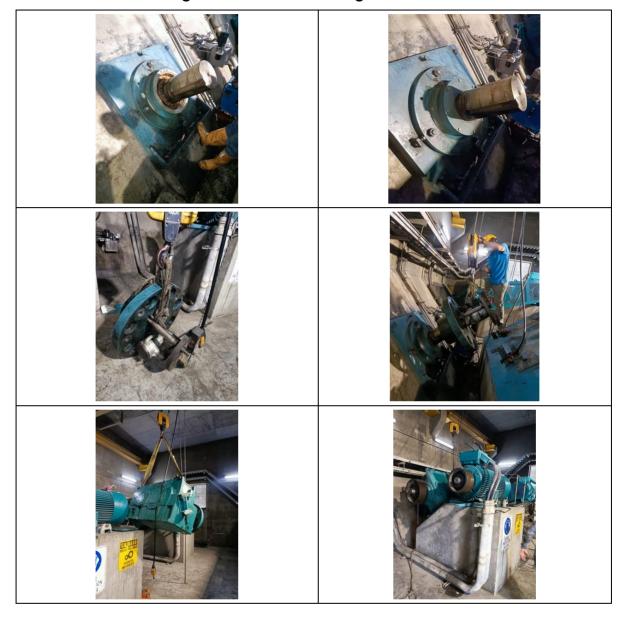

- 3. Se terminan trabajos de la filtro banda A la cual estaba en proceso de mantenimiento general queda probada y disponible para la operación.
- 4. El contratista hace entrega motor del tornillo de elevación de agua cruda 01P01A al cual le realizo mantenimiento general incluye cambio de rodamientos balanceo dinámico y rebobinado, al recibirlo se hacen pruebas de aislamiento las cuales pasaron, se instala, se acopla y se entrega a operaciones

# Fotografía 9. Mantenimiento tornillo de elevación de agua cruda 01P01A



- 4. El Grupo de mantenimiento electromecánico de PTAR I continúan labores de mantenimiento preventivo y correctivo junto con personal técnico de CEPS, en todas las áreas de la PTAR II mediante turnos rotativos las 24 horas.
- 5. El Grupo de mantenimiento electromecánico de PTAR I continúan labores de mantenimiento preventivo y correctivo junto con personal técnico de CEPS, en todas las áreas de la PTAR II mediante turnos rotativos las 24 horas.
  - 5.1 Se realizan acompañamientos en los *mantenimientos* en las mesas espesadoras 07DEP001D a la cual se le realizo mantenimiento correctivo en los encausadores y ajustes de la maquina 076DEP001A a la que se le cambio la tela filtrante

Fotografía 10. Mantenimeinto mesas espesadoras PTAR fase II







5.2 se realizó el mantenimiento correctivo a los puentes desarenadores 054D5801B realizando cambio de guía del cable que estaba deteriorado, por su parte el puente 054D58001E fue necesario alinear las ruedas ya que estaban atravesando el puente.

Fotografía 11. Mantenimeinto puentes desarenadores PTAR fase II





## CAMBIO GUÍA DEL CABLE PUENTE DESARENADOR







5.3 Se realizan trabajos en los sopladores de biológicos 061C01J - 061C001C a los que se le realizo un cambio de cheque de clapeta para esto se realiza trabajo en alturas armado de andamio y maniobras de retiro reparación y montaje del cheque, en esta área también se les realiza mantenimiento preventivo a los sopladores desde el 061C001A hasta el 061C001K.

Fotografía 12. Mantenimeinto sopladores de biológicos PTAR fase II








5.4 Apoyo al personal del consorcio CEPS para indicarles cuales las acometidas salen de funcionamiento desde el CCM-17 de calentamiento para la adecuación y reforma de este por demolición de los digestores

Fotografía 13. Adecuacion CCM 17 y Calentamiento









5.5 Continuamos con la verificación de equipos electromecánicos con la participación del personal de CEPS, IVK, EAAB y aguas de Bogotá en el área de pretratamiento

Fotografía 14. Verificación de equipos PTAR fase II



5.6 Se presenta una falla en el variador de la bomba 053P002A uno de los filtros se quemo

# Fotografía 15. Falla variador PTAR fase II







# 5. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

#### **ACTIVIDADES AMBIENTALES**

En este capítulo se describen las actividades de gestión ambiental y social realizadas dentro del cumplimiento de los requisitos legales en la PTAR El Salitre (Plan de Manejo Ambiental, Licencia Ambiental y Resoluciones posteriores) y en la zona de almacenamiento temporal de Biosólido del predio El Corzo (Resolución 3292 de diciembre de 2006, expedida por la CAR) y su aprovechamiento en el Predio La Magdalena autorizado por medio de la Resolución 13001 de 2016 y con la modificación menor bajo el comunicado de la ANLA 2020121983-2-000 del 29 de julio de 2020.

# 5.1 PLAN DE MANEJO FORESTAL Y PAISAJÍSTICO

El Plan de Manejo Forestal y Paisajístico, plantea una serie de medidas encaminadas a revegetalizar, embellecer y generar barreras ambientales, teniendo en cuenta no sólo las funciones y objetivos que debe cumplir la vegetación como elemento de adecuación y conformación paisajística, sino además como elemento de protección compuesto por franjas de aislamiento visual, sonoro, olfativo y conservación ambiental; buscando una combinación de tonos, texturas y formas adecuadas que realcen y caractericen cada área de manejo, e implementando acciones enfocadas a mitigar y compensar el impacto causado por la operación de la PTAR El Salitre.

Cuadro 5.1-1 Barreras forestales y ambientales de la PTAR El Salitre

Barrera	Área (m²)
Interna	12.104
B1	17.760
B2 y 3 antigua	12.767
B3 nueva	7.657
B5	2.557
В6	7.557
B1-6	3.654
TOTAL	61.499

En la Imagen 5.1-1 se muestra la ubicación espacial de cada una de las barreras ambientales con las que cuenta la PTAR El Salitre.

Barrera 6

Barrera 7

Barrera 2

Barrera 3

Imagen 5.1-1 Localización de las barreras ambientales en la PTAR Salitre

Fuente: ArcGis, 2021

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre – PTAR, cuenta con barreras ambientales y zonas de jardines que requieren complementarse y desarrollar actividades de mantenimiento periódico y básico que faciliten el cumplimiento del propósito ambiental para el cual fueron establecidas.

En los predios de la PTAR, se encuentran ubicados 5540 árboles vivos y 666 m² de jardines.

En la siguiente tabla se relaciona la distribución de los árboles por cada una de las barreras ambientales:

Cuadro 5.1-2 Distribución de número de árboles por cada una de las barreras ambientales de la PTAR El Salitre

Barrera	Número de árboles vivos
Interna	335
B1	1509
B2	625
В3	1410
B5	708
B6 +B1-6	953
TOTAL	5540

Fuente: Inventario Forestal-Consorcio Mantenimiento Forestales 2021

### 5.1.1 Actividades de Mantenimiento y Establecimiento

Para el mes de enero se desarrollaron las siguientes actividades: (2) dos riegos a individuos arbóreos, cada riego equivalente a 369 árboles (93 en el predio La Magdalena y 276 en el predio El Corzo), para un total de 738 unidades de riego ejecutadas en el mes de enero. (1) un ciclo de fertilización edáfica con triple 15 a 49 árboles de la barrera 6. (1) un ciclo de plateo a 210 árboles ubicados en el predio El Corzo. (1) un ciclo de corte de césped equivalente a 53.702 m2 en las barreras forestales de la PTAR Salitre. (1) un ciclo de manejo fitosanitario a 68 árboles ubicados en la barrera 6. (1) un ciclo de fertilización de los jardines internos de la PTAR Salitre con triple 15 por sistema al voleo. (1) un ciclo de limpieza del terreno de los jardines internos de la PTAR Salitre. (1) un ciclo de poda de los jardines internos de la PTAR Salitre. (1) un ciclo de control de acacias altura 5-10 metros de 5 árboles ubicados en la barrera 6. (1) un ciclo de control de acacias altura 11-20 metros de 22 árboles ubicados en las barreras 6 y 1.

#### Alcance mensual

El alcance mensual de este séptimo ciclo corresponde a lo ejecutado entre el periodo comprendido del 1 al 31 de Enero, realizando el mantenimiento de las barreras forestales de la PTAR El Salitre, predios El Corzo, La Magdalena y el mantenimiento interno de jardinería en la PTAR El Salitre, ejecutando las siguientes actividades: Mantenimiento de jardinería que comprende; limpieza del terreno, abonado, poda, riego, Fertilización edáfica y/o foliar (previa evaluación técnica), manejo fitosanitario Comprende (Manejo químico, físico y biológico, Corte de césped, plateo, control de acacias de altura 5-10 metros, control de acacias de altura de 11-20 metros, riego a individuos arbóreos.

En el siguiente cuadro se especifican las actividades asignadas para el mes de enero, las áreas intervenidas, la periodicidad con la que se realiza la actividad, el número total de unidades intervenidas y unidades ejecutadas.

Cuadro 5.1-3 actividades ejecutadas en el mes de enero

ACTIVIDAD	AREAS INTERVENIDAS	PERIODICIDAD POR MES	NÚMERO TOTAL DE UNIDADES INTERVENIDAS POR AREA(m²)/MES- INDIVIDUOS/MES	TOTALIDAD DE UNIDADES EJECUTADAS
Fertilización edáfica y/o foliar (previa evaluación técnica)	BARRERA 6 PTAR SALITRE	1 CICLO	49	49
Manejo Fitosanitario. Comprende (Manejo químico, físico y biológico)	Barrera 6	1 CICLO	68	68
Mantenimiento Jardinería. Comprende (Limpieza del terreno)	Zona interna PTAR	1 CICLO	634	634
Mantenimiento Jardinería. Comprende (Fertilización)	Zona interna PTAR	1 CICLO	634	634
Mantenimiento Jardinería. Comprende (Riego)	Zona interna PTAR	1 CICLO	634	634
Mantenimiento Jardinería. Comprende (Poda)	Zona interna PTAR	1 CICLO	634	634
Riego	Predio la Magdalena Predio el Corzo	2 CICLOS 2 CICLOS	93 276	186 552
Control de acacias altura		1 CICLO	15	
11-20 metros	Barrera 6 Barrera 1	1 CICLO	7	15 7
Control de acacias altura 5-10 metros	Barrera 1	1 CICLO	5	5
Plateo	Predio el Corzo	1 CICLO	210	210
	Zona interna PTAR	1 CICLO	32.000	32.000
	Barrera 1	1 CICLO	6.459	6.459
Corte de Césped.	Barrera unión 1-6	1 CICLO	311	311
Comprende (Corte,	Barrera 2	1 CICLO	1.775	1.775
acopio, cargue y	Barreras 3 antigua	1 CICLO	507	507
disposición de césped)	Barrera 3 nueva	1 CICLO	2.829	2.829
	Barrera 5	1 CICLO	2.264	2.264
F last	Barrera 6	1 CICLO	7.557	7.557

Fuente: Informe Mensual Consorcio Mantenimiento Forestales enero 2022

#### 5.1.1.1 Mantenimiento de jardinería

Esta actividad se desarrolla en los jardines que se encuentran ubicados en las áreas internas de la PTAR Salitre aledaños a las vías de acceso y las estructuras, están conformados por especies ornaméntales, plantas y algunas especies arbustivas, para el mes de Enero se ejecutó (1) un ciclo de limpieza del terreno, (1) un ciclo de poda, (1) un ciclo de fertilización,(1) un ciclo de riego, con la ejecución de estas actividades se garantizó la supervivencia y buen estado funcional de los jardines, permitiendo una adecuada aireación y disponibilidad de nutrientes y agua, necesarios para desarrollar procesos metabólicos y de fotosíntesis.

### Mantenimiento de jardinería – limpieza del terreno

Comprende la recolección de residuos de maleza, plantas en mal estado, logrando dejar libre el jardín con la limpieza, que consiste en la eliminación de la capa vegetal alrededor de la plántula sembrada para evitar competencias de malezas. Para este periodo comprendido para el mes de enero se evidencio que con la ejecución de la limpieza se disminuyó la proliferación de hongos, Bacterias y vectores, ya que al despejarse el área del jardín se mejoró la aireación y la disponibilidad de nutrientes para las plantas.

## Mantenimiento de jardinería – Poda

Por medio de esta actividad se eliminaron hojas secas, ramas, y flores que ya cumplieron el ciclo o estaban en mal estado en el jardín, la actividad se realiza con tijeras de poda o de forma manual. Las podas permiten un mejor desarrollo de las plantas sembradas, además se nota un mejor aspecto físico del jardín, observándose un mejor paisaje.

### Mantenimiento de jardinería – Fertilización

Se aplicó triple 15 al voleo en los jardines con el propósito de brindar nutrientes necesarios para la supervivencia de las plantas del jardín y establecimiento efectivo de las plantas sembradas en forma de esqueje con el fin de dar una mayor densidad al jardín, teniendo en cuenta que el nitrógeno es un elemento fundamental en el desarrollo de las raíces de las plantas.

## • Mantenimiento de jardinería – Riego

Se realizó un riego en los jardines, sin embargo, para el siguiente mes se plantea la ejecución de por lo menos dos riegos, Ya que durante las últimas semanas se ha presentado altas temperaturas y muy poca precipitación en la ciudad, causando que el terreno se seque rápidamente, dificultando la absorción del agua necesaria para los procesos metabólicos de las plantas del jardín.

#### 5.1.1.2 Riego

Se suministró agua potable por individuo arbóreo en el predio El Corzo y Predio La Magdalena con el fin de garantizar la disponibilidad suficiente del recurso hídrico necesario para el funcionamiento de las estructuras de los árboles y por lo tanto su supervivencia, en el mes de enero ha predominado una temporada de altas temperaturas y baja precipitación en el área del proyecto, por esta razón para este mes se ejecutó la actividad de riego en dos ocasiones, los primeros y últimos días del mes, con el propósito de suplir las necesidades hídricas de las especies establecidas en estos predios.

#### 5.1.1.3 Corte de césped

Se realizó un ciclo de poda de césped en las barreras aledañas e internas de la PTAR salitre con el fin de promover la aireación y embellecimiento paisajístico de las barreras, además de esto con la poda se disminuye la proliferación de zancudos y otros vectores que pueden ser causantes de enfermedades.

# 5.1.1.4 Manejo fitosanitario

Se continuo el manejo fitosanitario aplicando productos a base de Mancozeb y Benomyl permite el control y eliminación de enfermedades causadas por hongos como Microcyclus ulei, Colletotrichum gloeosporioides, se aplicó funlate 50 wp y cobrethane en conjunto, notando así una mejoría más rápida para el control de hongos presentes en los árboles de la barrera 6. Posterior a la aplicación del producto mencionado se ha realizado seguimiento semanal a los individuos arbóreos intervenidos de la especie Myrsine guianensis donde se ha evidenciado la germinación de nuevas de nuevas yemas y hojas sanas. Se agrega registro fotográfico del avance.

Fotografía 16. Manejo fito sanitario



5.1.1.5 Fertilización Edáfica y/o foliar

Permite dotar de los nutrientes necesarios a los árboles favoreciendo los procesos de conversión de materia inorgánica a materia orgánica mediante el proceso de fotosíntesis, ayudando así al correcto crecimiento y desarrollo radicular, foliar y estructural de los árboles. Para el mes de enero se avanzó con la fertilización edáfica de 49 árboles presentes en la barrera 6 de la especie Cucharo o *Myrsine guianensis* los cuales se encontraban en un estado de crecimiento bajo respecto al promedio de altura de los árboles de la barrera que es de 3,15 metros, por lo cual con la fertilización se les otorgaron los nutrientes necesarios para que logren un crecimiento óptimo.

El aporte de nitrógeno, potasio y fosforo mediante la aplicación del fertilizante triple 15, favorece el aceleramiento de la división celular, y la elongación de las raíces, también permite que los árboles sean más resistentes frente a la presencia de plagas y vectores, gracias al potasio y fosforo se favorece el desarrollo de tallos fuertes y se ayuda a mantener un rápido crecimiento de los árboles jóvenes.

### 5.1.1.6 Plateo

El plateo permite eliminar malezas del área cercana al fuste del árbol, evitando así competencias por nutrientes y agua, además de esto la forma del plato permite una mejor entrada del recurso hídrico y por ende la fijación de nutrientes se ve afectada positivamente.

#### 5.1.1.7 Control acacias

Control de acacias altura de 5-10 metros

El control de acacias se toma como medida de prevención ante la posible caída de estas, lo que puede ocasionar una afectación en el área, y a los individuos arbóreos nativos que se han venido sembrado como medida de fortalecimiento de las barreras forestales de la PTAR El Salitre. Al momento de realizar la actividad se evidencio el deterioro de la medula y duramen de algunas acacias, situación que en el tiempo puede ocasionar daños en la estructura del tronco y la caída de estos árboles. Esta tala permitió una mayor entrada de luz a arboles de porte medio, bajo. En el mes de enero se ejecutó la tala de 5 árboles en la barrera 1, sin embargo, se deja constancia de que los demás individuos que no fueron autorizadas para tala mediante el Concepto SSFFS-14934 – 2021 Se encuentran en riesgo de volcamiento teniendo en cuenta que pueden presentar las características anteriormente mencionadas, y que algunos se encuentran con inclinaciones que cuando el árbol tome más peso podrían aumentar el riesgo de volcamiento.

Control de acacias altura de 11-20 metros

Se talaron 22 acacias debido a su gran tamaño y a la inclinación que tenían algunas de ellas presentaban un alto riesgo de volcamiento, encontrando así como en las acacias de altura de 5-10 metros, pudrimiento de la medula y duramen, algunas de estas acacias también se encontraban enredadas con otros árboles de porte alto lo cual ocasiono daños menores al momento de retirar las ramas cortadas, sin embargo para estos daños se tomaran medidas como la aplicación de cicatrizante y la realización de cortes parejos en ramas partidas. Los demás individuos que no fueron autorizadas para tala mediante el Concepto SSFFS-14934 – 2021 también presentan estas condiciones aumentan el riego de volcamiento.

# Fotografía 17. Control acacias



5.1.1.8 Registro de presencia y manejo de fauna silvestre

La ejecución del mantenimiento requiere retirar coberturas vegetales, lo que genera impactos sobre los hábitats y por ende sobre la fauna localizada principalmente en el área de influencia directa por ello se realiza el registro y manejo de fauna.

Todas las actividades descritas anteriormente se pueden apreciar en el siguiente registro fotográfico



Fotografía 18. Corte de cesped 04/01/2022



Fotografía 19. Mantenimiento de jardineria limpieza del terreno 19/01/2022




Fotografía 20. Fertilizacion 18/01/2022



Fotografía 21. Control acácias 24/02/2022 31/01/2022



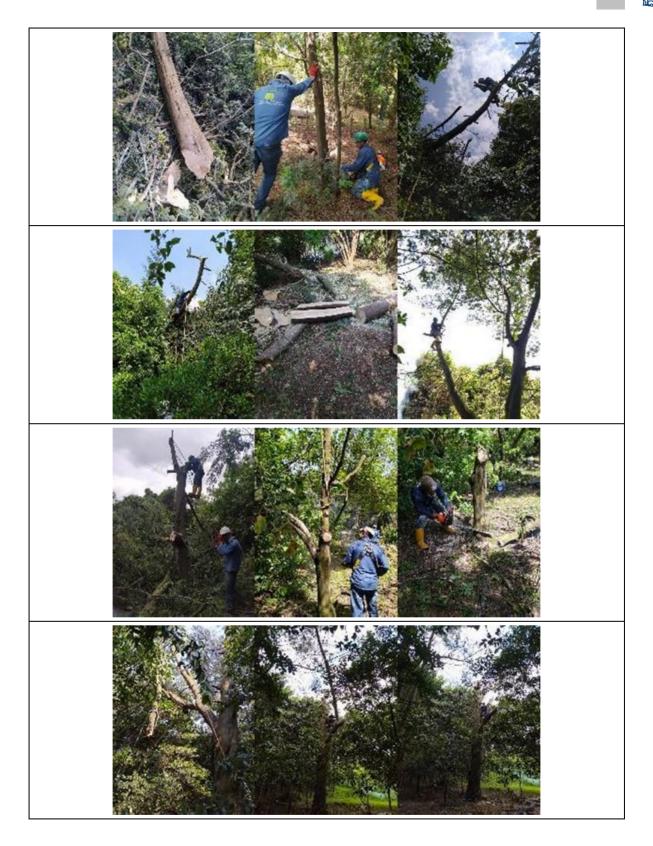



Fotografía 22. Riego de individuos arboreos 12/01/2022 28/01/2022





Fotografía 23. Manejo fitosanitario 31/01/2022



## Fotografía 24. Plateo 18/01/2022



Fuente: Informe Mensual Consorcio Mantenimiento Forestales enero 2022

#### 5.2 OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA

El programa de ahorro y uso eficiente del agua tiene como objetivo mantener el consumo de agua en los mínimos posibles durante cada actividad identificada en la PTAR El Salitre.


Durante el presente mes se continuaron las medidas de control y seguimiento sobre el consumo de agua potable al interior de la PTAR, estas se realizaron por medio de inspecciones visuales donde se verificó que los puntos de suministro hidráulico se encontraran en buen estado. Así mismo se tomó lectura de los medidores internos instalados con el objeto de determinar el consumo total y en cada área de la PTAR El Salitre.

En el Cuadro 5.2-1 Se muestra el registro del consumo de agua potable en cada área de la PTAR durante el mes de enero de 2022.

Cuadro 5.2-1 Consumo de agua potable enero 2022


UBICACIÓN DEL MEDIDOR	CONSUMO m <sup>3</sup>
CASINO	83
RED C.I.	11
DECANTADORES 5.1	7,7
DECANTADORES 5.2	0
DECANTADORES 5.3	11,2
DECANTADORES 5.4	61,2
REJAS GRUESAS	0
REJAS FINAS	24,9
PRETRATAMIENTO	162
DESHIDRATACION	275
CONT. TRANSP	6,8
EDIF ADMIN	43
ESPESA DORES	0
GALERIA ORIENTAL	0
GALERIA OCCIDENTAL	0
JARDINERIA	20,5
PORTERIA	0

Tal como se observa en la gráfica 5.2-1 el mayor consumo de agua que corresponde a la zona de Deshidratación, en la cual para los días entre el 14 y 18 de enero se preparó 0,75 toneladas de polímero y adicionalmente el consumo fue por procesos de lavado de telas con agua potable debido a la reducción de los caudales provenientes del barrio Lisboa. El segundo mayor consumo corresponde a la zona de Pretratamiento, donde se llevaron acabo labores de limpieza y lavado. Los consumos durante el mes de las diferentes zonas han disminuido debido a que actualmente se viene trabajando en un proceso de puesta en marcha en donde la operación de la Fase I se encuentra al 5% mientras que la Fase II opera al 95%; mientras que, de las áreas comunes, el edificio administrativo incremento su consumo frente al último mes.

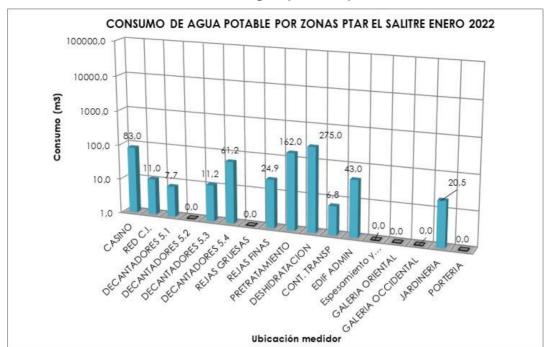

Gráfica 5.2-1 Consumo de agua potable por áreas enero 2022

A continuación, se presenta en la gráfica 5.2-2 el comportamiento del consumo mensual total, incluyendo las pérdidas del sistema, deducidas de los registros del macromedidor registrando 868 m³ de consumo en el mes de enero, cumpliendo así con el límite máximo fijado en el PMA el cual debe ser <15240m³/mes (línea roja), siendo este uno de los meses con menor consumo.

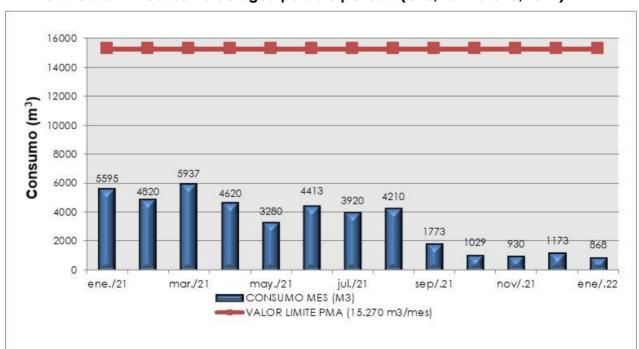

Gráfica 5.2-2 Consumo de agua potable periodo (ene/2021 a ene/2022)

# 5.3 CONTROL DEL TRANSPORTE DE BIOSÓLIDOS

La ruta de transporte se realizó conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental para el predio El Corzo I: "Aprovechamiento del biosólido en mezcla con suelo para la cobertura del predio El Corzo I", aprobado por la Resolución CAR 3292 de diciembre de 2006, en diciembre del 2017 se culminó el aprovechamiento y desde ese mismo mes se inicia el aprovechamiento en el predio La Magdalena el cual fue autorizado por medio de la Resolución 1301 de 2016 emitido por la Autoridad Nacional Licencias Ambientales y con la modificación menor bajo el comunicado de la ANLA 2020121983-2-000 del 29 de julio de 2020. Este predio está ubicado a 4 km del predio el Corzo el cual está siendo usado para la recepción temporal del biosólido para posteriormente ser llevado hasta el predio la Magdalena para su aprovechamiento.

Durante este mes el transporte de biosólido desde la PTAR El Salitre hasta el predio El Corzo I, y posteriormente hasta el predio La Magdalena se realizó a través de volquetas con capacidad de 15 m³ las cuales cumplieron con las especificaciones establecidas por la Licencia Ambiental y las normas de tránsito.



Imagen 5.3-1 Localización Predios El Corzo y La Magdalena

Fuente: Google Earth

## 5.4 PLAN DE USO BENÉFICO DE LOS LODOS

El biosólido de la PTAR El Salitre generado para el mes de enero es proveniente de la Fase II, por parte de la Fase I desde el día 25 de septiembre no se está generando biosólido. Para la PTAR El Salitre el biosólido es clasificado según el Decreto 1287 del 10 de julio de 2014 establecido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por el cual se establecen criterios para el uso de los biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales" que incorporó gran parte de las disposiciones contenidas en la norma US EPA 40 CFR part 503, e incluyó algunos requerimientos adicionales, de igual manera al aplicar esta nueva regulación al biosólido obtenido en la PTAR El Salitre se categoriza como un biosólido Tipo B, y se encuentra que se está dando cumplimiento en parámetros fisicoquímicos.

Con base en los criterios para el aprovechamiento de las distintas clases de biosólido, establecidos en el Decreto 1287 de 2014, la PTAR El Salitre realiza aprovechamiento del biosólido con mezcla de suelo como cobertura final para el restablecimiento de la cobertura vegetal del predio La Magdalena

Esta actividad fue autorizada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA a través de la Resolución 1301 de 2016 y con la modificación menor bajo el comunicado de la ANLA 2020121983-2-000 del 29 de julio de 2020; es así como desde el mes de diciembre de 2017 se inició al aprovechamiento del biosólido en este predio propiedad de la EAAB –ESP, el cual se encuentra localizado al suroccidente de la ciudad en los límites de las localidades de Kennedy y Bosa el cual fue empleado para la disposición de los sobrantes de excavación de las obras de alcantarillado del Tintal y del Canal Cundinamarca.

Las características fisicoquímicas del biosólido de la PTAR El Salitre presentan concentraciones típicas de enmiendas orgánicas en cuanto a sus formas nitrógeno, fósforo y sólidos volátiles que hacen de este material muy útil en aplicaciones agrícolas y no agrícolas, como es el caso del aprovechamiento actual llevado a cabo en el predio La Magdalena donde se ha generado la cobertura vegetal de manera rápida y con una buena estructura, textura y apariencia de los pastos (lo cual se comprueba mediante muestreos y análisis fisicoquímicos y microbiológicos realizados en diferentes puntos del predio con periodicidad anual).

El área de Gestión Ambiental de la planta realiza seguimiento al aprovechamiento del biosólido en el predio La Magdalena, en concordancia con el PMA, aprobado por la Resolución 1301 de 2016 y con la modificación menor bajo el comunicado de la ANLA 2020121983-2-000 del 29 de julio de 2020, a través de inspecciones planeadas el día 7 de febrero del 2022 el aprovechamiento del biosólido se está realizando de manera efectiva en la celda 4; se ha evidenciado un aumento debido a la puesta en marcha de la Fase II de la PTAR el Salitre, incrementando el flujo de volquetas y material para aprovechamiento, de igual manera en las celdas intervenidas se evidencia que han presentado un crecimiento masivo del pasto kikuyo, así como el seguimiento a la disposición de los residuos sólidos, vectores, olores, limpieza de canaletas, vías, higiene y seguridad industrial, señalización y demarcación, máquinas y herramientas

En el siguiente registro fotográfico se presenta el patio de secado y progreso del aprovechamiento en el predio.

Fotografía 25. Registro fotográfico patio de secado predio el Corzo y proceso de mezcla predio la Magdalena enero 2022



Vista general de la cubierta de secado



Disposición de secado en módulos en la cubierta tipo invernadero



Descargue de biosólido en celda 4 Magdalena, metodología 3:1



Labores de mezcla Aprovechamiento predio la Magdalena celda 4, metodología 3:1

Fuente: Fuente propia.

#### 5.5 CONTROL DEL MANEJO DE RESIDUOS

La gestión de residuos en la PTAR se realiza de acuerdo con el tipo de residuos, su impacto y los requisitos normativos asociados al mismo; esta gestión se divide en residuos provenientes del sistema de tratamiento, residuos convencionales no aprovechables, residuos convencionales aprovechables y residuos peligrosos.

El almacenamiento temporal de los residuos provenientes del sistema de tratamiento (residuos de cribado, desarenado y desengrasado que no son aprovechables), se realiza en diferentes contenedores, mientras la fracción de residuos No aprovechables generados por el personal de la planta, visitantes y casino, son recogidos en bolsas negras, y posteriormente todos estos residuos son unidos y transportados hasta el relleno sanitario Doña Juana para su disposición final.

La fracción de residuos convencionales reciclables (papel, cartón, plásticos y vidrio principalmente) se separa en recipientes provistos de bolsa blanca y son posteriormente acopiados y donados a una Asociación de Recicladores sin ánimo de lucro en convenio con la FAAB.

Para el mes de enero se realizó la recolección el día 05 del material aprovechable, por parte de la Asociación Pedro León Trabuchi.

Cuadro 5.5-1 Residuos donados a la Asociación Pedro León Trabuchi

Periodo	Tipo de residuo	Cantidad (Kg)
	Cartón	21,8
	Archivo	3,5
	Plegadiza	15
9/12/2021	Vidrio	2
а	Chatarra	2
5/01/2022	PET	15
	Tatuco	1
	Pasta	4,2
	Plástico policolor	15
	PVC	1,6
TOTAL		81,1

#### 5.6 CONTROL DE RUIDOS

Las fuentes de mayor generación de ruido están constituidas por los motores que hacen parte de los equipos de bombeo y los compresores ubicados en el edificio de calentamiento; por esta razón, estas estructuras están provistas de dispositivos silenciadores y puertas a prueba de ruido.

Mediante inspecciones quincenales se evaluó el funcionamiento de los sistemas utilizados, e igualmente las medidas de mitigación establecidas, en ese sentido se tuvieron en cuenta aspectos como:

- Control de ruido en los compresores de aire de baja velocidad
- Verificación de la efectividad de los silenciadores
- Que el personal de mantenimiento y operaciones cumplan con las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional.
- Que los cuartos que sirven como sistema de aislamiento de motores, compresores y bombeo permanezcan con las puertas cerradas para mantener confinado el ruido generado por estos elementos.

Mediante las inspecciones realizadas se identificó que se cumple con lo dispuesto en la Plan de Manejo Ambiental de la PTAR, además se llevan a cabo buenas prácticas ambientales y los trabajadores tienen presente el Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

Como medida adicional, anualmente se realiza un monitoreo de ruido por intermedio de una firma acreditada por el IDEAM. Los resultados del último monitoreo, realizado el día 06 de agosto de 2021 demuestran que las emisiones de ruido de la planta permanecen por debajo del límite máximo establecido por la normatividad nacional, Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente (Sector C – Ruido intermedio restringido, subsector zonas con usos industriales permitidos, Estándar máximo < 75 dB (A) jornada diurna y nocturna). En la siguiente tabla y graficas se pueden observar los resultados obtenidos.

Cuadro 5.6-1 Resultados del monitoreo diurno

Punto	LRAeq,1h (dBA)	LRAeq,1h,Residual (L90, dBA)	Leq Emisión (dBA)
P1	60.4	59.6	*
P2	59.8	53.7	58.6
Р3	62.4	54.0	61.7
P4	67.1	60.9	65.9

<sup>\*</sup>En el punto 1 no fue posible calcular la emisión de ruido ya que la diferencia aritmética entre LRAeq,1h y el nivel percentil Lo es igual o inferior a 3 dB(A), por lo cual nivel de ruido de emisión (LRAeq,1h, Residual) es del orden igual o inferior al ruido residual.

Gráfica 5.6-1 Comparación de emisión de ruido horario diurno con la Resolución 2006



Cuadro 5.6-2 Resultados del monitoreo nocturno

Punto	LRAeq,1h (dBA)	LRAeq,1h,Residual (L90, dBA)	Leq Emisión (dBA)
P1	58.9	58.6	*
P2	54.1	53.8	*
P3	54.2	50.2	52.0
P4	61.1	54.2	60.1

<sup>\*</sup>En el punto 1 y 2 no fue posible calcular la emisión de ruido ya que la diferencia aritmética entre LRAeq,1h y nivel percentil L<sub>00</sub>l es igual o inferior a 3 dB(A), por lo cual el nivel de ruido de emisión (LRAeq,1h, Residual) es del orden igual o inferior al ruido residual.

Gráfica 5.6-2 Comparación de emisión de ruido horario nocturno con la Resolución 2006



#### 5.7 CONTROL DE EMISIONES

Las emisiones atmosfericas generadas por fuentes fijas en la PTAR El Salitre, están directamente relacionadas con la combustión del biogas en las calderas instaladas en el edificio de calentamiento, y la quema del biogas en la Tea. Ademas se cuenta con un sistema de electrógenos los cuales son operados con combustible (ACPM) y sirven como equipo de respaldo en el momento de presentarse un corte en el suministro de energía electrica; estos ultimos, durante el periodo evaluado sólo funcionaron 1 hora al mes, debido a que no se presentaron cortes en el suministro principal.

Para cuantificar las emisiones atmosféricas generadas por los equipos de calderas, tea y equipos de respaldo, se realiza un monitoreo anual de emisiones, cumpliendo los requisitos establecidos en la Resolución 2153 de 2010 del Ministerio de Ambiente y la Resolución 6982 del 2011 de la Secretaría Distrital de Ambiente, el último monitoreo se ejecutó en el mes de octubre 2021, resultando todos los parámetros por debajo de los límites máximos de emisión contemplados en las citadas normas.

Cuadro 5.7-1 Resultados de monitoreo de Emisiones / octubre de 2021

Fuente Fija	Contaminante (Mg/ M³)	Resultado del monitoreo corregido 3% (mg/ M³)	Decreto SDA 6982/2011 (mg/M³)
	MP	9,38	50
Caldera A	CO	1,08	N.A
Caldela A	SO2	4,72	N.A
	NO <sub>X</sub>	20,33	200
	MP	20,75	50
Codeles on D	CO	1,39	N.A
Caldera B	SO2	23,96	N.A
	NO <sub>X</sub>	7,23	200
Fuente Fija	Contaminante	Concentración corregida con O2 al	Decreto SDA 6982/2011
	(Mg/M <sup>3</sup> )	15% mg/m3	(Mg/M <sup>3</sup> )
	(Mg/M°) MP	<b>15% mg/m3</b> 3,49E-05	(Mg/M <sup>3</sup> )
Flacké sanoundos 1	MP SO <sub>2</sub>		
Electrógenerador 1	MP SO <sub>2</sub>	3,49E-05	100
Electrógenerador 1	MP SO <sub>2</sub>	3,49E-05 1,01E-08	100 400
Electrógenerador 1	MP SO <sub>2</sub> NO <sub>X</sub>	3,49E-05 1,01E-08 1,54E-04	100 400 1800
	MP SO <sub>2</sub> NO <sub>X</sub> CO MP SO <sub>2</sub>	3,49E-05 1,01E-08 1,54E-04 3,32E-08	100 400 1800 N.A
Electrógenerador 1  Electrógenerador 2	MP SO <sub>2</sub> NO <sub>X</sub> CO MP SO <sub>2</sub>	3,49E-05 1,01E-08 1,54E-04 3,32E-08 8,77E-06	100 400 1800 N.A 100
	$\begin{array}{c} \text{MP} \\ \text{SO}_2 \\ \text{NO}_X \\ \text{CO} \\ \text{MP} \\ \text{SO}_2 \end{array}$	3,49E-05 1,01E-08 1,54E-04 3,32E-08 8,77E-06 8,20E-09	100 400 1800 N.A 100 400
	MP SO <sub>2</sub> NO <sub>X</sub> CO MP SO <sub>2</sub>	3,49E-05 1,01E-08 1,54E-04 3,32E-08 8,77E-06 8,20E-09 1,25E-04	100 400 1800 N.A 100 400

#### 5.8 CONTROL DE OLORES

Los olores generados por los procesos de tratamiento de las aguas residuales y los lodos generados son prevenidos, mitigados y estimada su influencia sobre los barrios circunvecinos.

Son varias las medidas aplicadas que confluyen hacia la disminución de la perceptibilidad de olor dentro de las comunidades aledañas a la planta, dentro de los más importantes se cuentan:

- Mantenimiento de distancias mayores a 300 metros entre los focos de olor (estación elevadora, Espesadores, decantadores) y las áreas residenciales
- Establecimiento de barreras forestales y ambientales perimetrales

- Monitoreo constante de la eficiencia de la digestión de lodos (reducción de sólidos volátiles)
- Uso de cal para elevación de pH en caso de ser necesario (inestabilidad de lodos)
- Monitoreo trimestral de la condición de olor

Para el año 2021 se realizó la metodología de olores dispuesta en la Resolución 1541 de 2013 de olores ofensivos, dicha información se encontrará consignada en los informes de Cumplimiento Ambiental - ICA de la PTAR Salitre fase I.

#### 5.9 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

## 5.9.1 Componente de Comunicación e Información.

## 5.9.1.1 Divulgación de información por medio de plegables.

En el mes de enero de 2022, se dio continuidad a la divulgación de información por medio de los plegables técnico y general de la PTAR El Salitre fase I, los cuales fueron enviados mediante correo electrónico a residentes de las localidades de Kennedy, Chapinero, Suba y Engativá, quienes participaron en algunas de las jornadas de PTAR al barrio realizadas durante el mes de enero.

En total durante el mes, se envió a setenta y una (71) personas el plegable técnico y el plegable con información general de la planta. Teniendo en cuenta que a cada persona le fueron remitidos los dos plegables, en total se logró difundir mediante correo electrónico ciento cuarenta y dos (142) plegables informativos.

A continuación, se presenta el consolidado del material informativo (plegables) enviados.

Cuadro 5.9-1 Consolidado plegables generales y técnicos enviados mes de enero 2022

Comunidad informada	Ejemplares enviados plegable general	Ejemplares enviados plegable técnico
Residentes localidad de Kennedy	6	6
Residentes localidad de Chapinero	7	7
Residentes localidad de Suba	12	12
Residentes localidad de Engativá	46	46
Subtotal plegables enviados	71	71
Total piezas informativas enviadas	14	42

Así mismo, se continuó realizando el seguimiento al contador de mensajes ubicado en la página Web de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, a través del cual se reporta la cantidad de veces que se visita el link, el cual contiene la información de la PTAR El Salitre fase I.

En el mes de enero de 2022, el reporte del link de las visitas correspondió a treinta (30) personas. A continuación, se presenta la gráfica con el número de accesos al link de la PTAR El Salitre fase I durante el mes.



Gráfica 5.9-1 Visitantes link PTAR el Salitre

Cuadro 5.9-2 Comunicaciones correo: ptar.salitre@acueducto.com.co

Comunicaciones entrantes			
Tema	Cantidad		
Solicitud visitas presenciales o virtuales	5		
Solicitud información y varios	5		
Quejas	0		
Asignación visitas presenciales o virtuales	2		
Respuesta a solicitudes de información y varios	5		
Respuestas a quejas	0		

Las solicitudes de información y varios, se relacionaron con la posibilidad de realizar pasantía universitaria en la PTAR El Salitre fase I, información acerca del proceso de tratamiento efectuado en la planta, presentación de Brochure de servicios de mantenimiento en las plantas de tratamiento de aguas residuales, suscripción de convenios de cooperación tecnológica para la producción de hidrógeno verde utilizando el biogás de la planta y solicitud de muestra de agua residual para desarrollar proyecto de investigación por parte de la Universidad Central de Bogotá.

En el cuadro 5.9-3, se especifica el número de personas cubiertas por cada actividad realizada. En la categoría "Entrega de material informativo por solicitud" se incluyen los plegables, herramientas pedagógicas y videos enviados o socializados durante el mes de enero. En la categoría "Total piezas comunicativas entregadas" se incluyen el total de las mismas en todas las actividades desarrolladas.

Cuadro 5.9-3 Total de población informada en las diferentes actividades de divulgación mes de enero de 2022

	Tipo de actividad	Cantidad de personas informadas por medio de cada pieza comunicativa y/o actividad de divulgación	
Α	Visitas guiadas/recorridos pedagógicos.	0	
В	Envío de material informativo por solicitud.	71	
С	Talleres, charlas y otras actividades externas.	42	
D	Actividad institucional.	804	
Е	Comunicaciones entrantes a los correos electrónicos.	10	
F	Comunicaciones salientes de los correos electrónicos.	10	
Total	Total personas informadas directamente $(a+b+c+d+f) = 927$	Total piezas comunicativas enviadas (plegables, videos, herramientas y otras formas de comunicación): <b>213</b>	

#### 5.9.1.2 Difusión del video institucional de la PTAR El Salitre fase I.

Durante el mes de enero de 2022, se continuó informando mediante correo electrónico a las comunidades y ciudadanía en general, acerca de la ruta de acceso al link del video institucional de la página web de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB: <u>www.acueducto.com.co.</u>

En total durante el mes, la información y/o socialización del video institucional se dirigió a setenta y una (71) personas.

#### 5.9.1.3 Participación en seminarios, ferias ambientales o congresos.

En el mes de enero de 2022, se realizaron siete (7) jornadas informativas de PTAR al barrio con la participación total de ochocientas cuatro (804) personas.

En el cuadro 5.9-4 se relacionan las jornadas de PTAR al barrio realizadas durante el mes de enero de 2022.

Cuadro 5.9-4 Jornadas PTAR al barrio mes de enero de 2022.

Fecha	Comunidad	Localidad	N° de participantes
4/01/2022	Jornada PTAR al barrio Portal de Transmilenio Calle 170.	Suba	32
6/01/2022	Jornada PTAR al barrio Lisboa	Suba	10
11/01/2022	Jornada PTAR al barrio Centro Comercial Plaza de las Américas		24
14/01/2022	Jornada PTAR al barrio Centro Comercial Plaza Imperial	Suba	32
18/01/2022	Jornada PTAR al barrio Alcaldía Local Engativá	Engativá	29
24/01/2022	Jornada PTAR al barrio Colegio Rodolfo Llinás IED, Localidad Engativá	Engativá	631
26/01/2022	Jornada PTAR al barrio Centro Comercial Portal Ochenta, Localidad Engativá	Engativá	46
	Total participantes		804

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las jornadas de PTAR al barrio ejecutadas durante el mes de enero de 2022.

### Fotografía 26. Jornada PTAR al barrio, Portal de Transmilenio calle 170, localidad de Suba Enero 04 de 2022







Fotografía 27. Jornada PTAR al barrio Lisboa ubicado en la localidad de Suba Enero 06 de 2022







Fotografía 28. Jornada PTAR al barrio Centro Comercial Plaza de las Américas-Localidad de Kennedy Enero 11 de 2022







Fotografía 29. Jornada PTAR al barrio Centro Comercial Plaza Imperial - Localidad de suba Enero 14 de 2022






Fotografía 30. Jornada PTAR al barrio Alcaldía Local de Engativá Enero 18 de 2022







Fotografía 31. Jornada PTAR al barrio Colegio Rodolfo Llinás IED - Localidad de Engativá Enero 24 de 2022

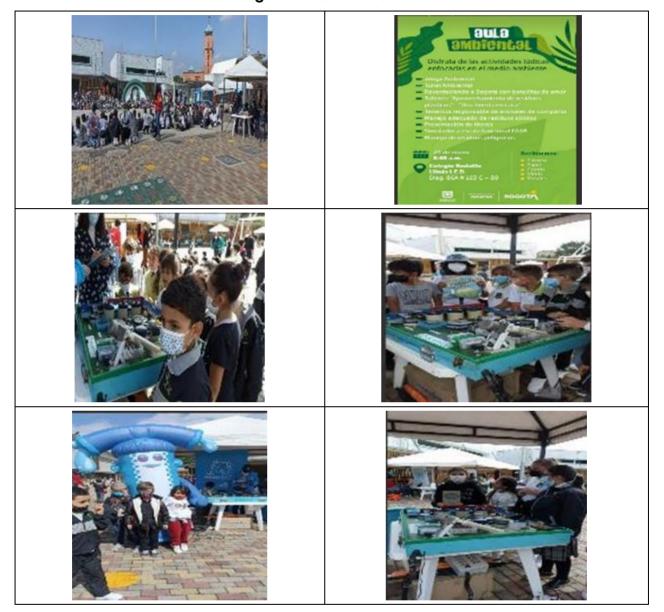

Fotografía 32. Jornada PTAR al barrio Centro Comercial Portal Ochenta- Localidad de Engativá Enero 26 de 2022







#### 5.9.1.4 Difusión de información por correo electrónico.

Con la finalidad de brindar información de la PTAR El Salitre fase I relacionada con la ubicación geográfica, historia, tratamiento, actividades de educación ambiental y gestión realizada para el tratamiento de las aguas residuales, en el mes de enero de 2022, se enviaron setenta y un (71) correos electrónicos dirigidos a residentes de las localidades de Kennedy, Chapinero, Suba y Engativá, quienes participaron en algunas de las jornadas de PTAR al barrio realizadas durante el mes de enero.

#### 5.9.2 Componente de Participación Comunitaria

### 5.9.2.1 Realización de charlas y/o talleres dirigidos a líderes comunitarios y comunidades

En el mes de enero de 2022, se llevó a cabo una charla pedagógica acerca del funcionamiento y beneficios de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Salitre fase I por parte de un estudiante de servicio social de la institución educativa colegio Manuel Cepeda Vargas IED, perteneciente a la localidad de Kennedy.

Cuadro 5.9-5 Charlas participativas con comunidades mes de enero de 2022.

Fecha	Tema	N° de participantes
31/01/2022	Ruta del desagüe, uso inteligente del alcantarillado y PTAR El Salitre fase I	3
Total particip	pantes	3

Fotografía 33. Charla acerca del funcionamiento y beneficios de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Salitre fase I Enero 31 de 2022



De otra parte, el día 13 de enero de 2022, se llevaron a cabo reuniones informativas dirigidas a los líderes de las Juntas de Acción Comunal y a los residentes aledaños al proyecto de los barrios Santa Cecilia I y II sector y Lisboa, ubicados en la localidad de Suba, mediante las cuales se socializó el" Proyecto de cerramiento con malla eslabonada de las barreras 5 y 6 en la PTAR El Salitre fase I" a ejecutarse por parte de la firma contratista PRODIARQ SAS.

El proyecto consiste en realizar la instalación de 350 metros lineales de cerramiento en malla eslabonada con puerta de doble hoja del área común actual de las barreras ambientales 5 y 6 en las inmediaciones de la vía Lisboa, de conformidad con lo exigido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- en el Acta reunión de control y seguimiento ambiental No 82 del 26 de marzo de 2021, Requerimiento No 2: "presentar las evidencias documentales para el ICA 27 del reforzamiento del cerramiento perimetral de las barreras ambientales 5 y 6 con el fin de evitar daños mecánicos a los individuos por parte de terceros, en cumplimiento de la Ficha Manejo: 6.2.11 Proyecto de manejo forestal y paisajístico para la medida dos".

Fotografía 34. Principales problemáticas de las barreras 4,5 y 6 de la PTAR El Salitre fase I (disposición de residuos sólidos, árboles muertos, ramas rotas, acceso de personas no autorizadas, consumo de sustancias alucinógenas, afectación de placas de inventario arbóreo)




Los beneficios del proyecto de cerramiento con malla eslabonada se relacionan a continuación:

- Protección de fauna y flora presente en el área de cerramiento (barreras 5 y 6).
- 2. Disminución de la disposición de residuos sólidos contaminantes (basuras, plásticos, entre otros).
- 3. Control de ingreso de personas no autorizadas.
- 4. Disminución de eventos asociados con hurtos a personas que se movilizan a pie o en bicicleta principalmente.

- 5. Preservación y conservación de los 1.380 individuos arbóreos.
- 6. Mantenimiento de las actividades fitosanitarias.
- 7. Conservación de la barrera ambiental para oxigenación en la zona de cerramiento y vía Lisboa de Suba.
- 8. Preservación del inventario forestal.


Fotografía 35. Caracterización de la fauna y flora presente en las barreras 5 y 6 de la PTAR El Salitre fase I

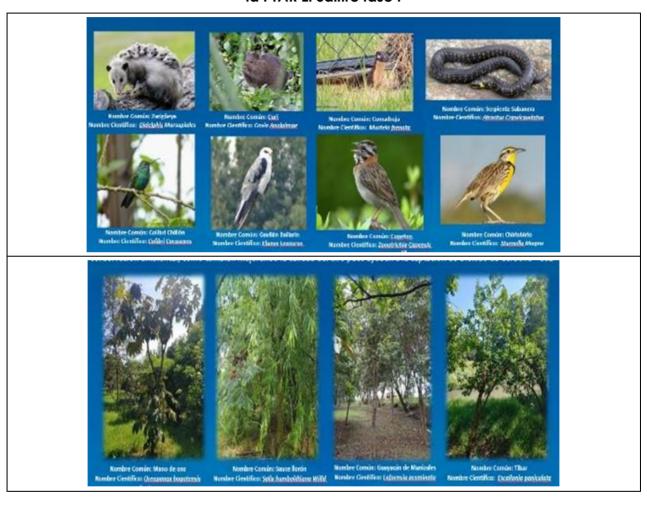

El proyecto contempla la instalación de 350 metros lineales de malla eslabonada 2x2 calibre 10" apoyada en tubo galvanizado calibre 2½", con pintura anticorrosiva y esmalte semibrillante, con cimientos en concreto 21MPA y tres líneas de alambre galvanizado Cal 12".

## Fotografía 36. Imagen de ejemplo y plano asociado con el montaje del cerramiento en malla eslabonada en las zonas comunes del área común de las barreras ambientales 5 y 6 PTAR El Salitre - vía Lisboa-Suba





En el cuadro 5.9-6, se relacionan las reuniones de socialización efectuadas.

Cuadro 5.9-6 Reuniones de socialización proyecto de cerramiento con malla eslabonada PTAR El Salitre fase I mes de enero de 2022.

Fecha	Barrio	Número de participantes
Enero 13 de 2022	Santa Cecilia I y II sector	8
Enero 13 de 2022	Lisboa	7
	15	

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las reuniones de socialización efectuadas.

Fotografía 37. Reuniones de socialización proyecto de cerramiento con malla eslabonada PTAR El Salitre fase I en los barrios Lisboa y Santa Cecilia sector I y II Enero 13 de 2022





# 5.9.2.2 Conformación grupo de seguimiento de las obras PTAR El Salitre Fase II Participación en reuniones, comités de seguimiento, entre otras actividades. requeridas por el grupo de seguimiento o veeduría de la obra de ampliación y optimización de la PTAR El Salitre fase I.

El día 20 de enero de 2022, en el marco de las reuniones de Comité de Seguimiento de Obra de las localidades de Suba y Engativá, la PTAR El Salitre fase I coordinó y programó la realización de dos charlas virtuales dirigidas a los integrantes de los comités, acerca del Plan de Identificación y Corrección de Conexiones Erradas – PICCE y Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV. Las charlas fueron efectuadas por parte de la Dirección de Saneamiento Ambiental de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- EAAB.

Mediante las charlas informativas, los integrantes de los comités conocieron las acciones preventivas, correctivas y de seguimiento respecto a la identificación de conexiones erradas las cuales provienen del agua residual generada en los baños, lavaplatos, duchas entre otros orígenes, las cuales desembocan en las tuberías de agua lluvia generando contaminación, siendo los principales tipos de conexiones erradas las provenientes de la caja sanitaria conectada a la red pluvial, caja domiciliaria conectada al pozo pluvial, caja domiciliaria conectada al sumidero y por conexiones internas.

Así mismo, se informaron acerca del conjunto de programas, proyectos y actividades con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarios para el saneamiento y tratamiento de vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema de alcantarillado tanto sanitario como pluvial. de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1433 de 2004, articulo 1.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las charlas virtuales efectuadas con los comités SEGOS de las localidades de Engativá y Suba.

Fotografía 38. Charla virtual PSMV y PICCE Comité de Seguimiento de Obra localidad de Suba Enero 20 de 2022





### Fotografía 39. Charla virtual PSMV y PICCE Comité de Seguimiento de Obra localidad de Engativá Enero 20 de 2022





#### 5.9.2.3 Visita a las JAC de la zona de influencia.

El día 6 de enero de 2022, se llevaron a cabo visitas informativas personalizadas a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal – JAC de los barrios Santa Cecilia I y II sector y a los residentes de los predios aledaños a las barreras 5 y 6 de la PTAR El Salitre fase I.

Mediante las visitas personalizadas, se socializó el Proyecto de cerramiento con malla eslabonada de las barreras 5 y 6 en la PTAR El Salitre fase I" a ejecutarse por parte de la firma contratista PRODIARQ SAS.

Como se indicó en el numeral 5.9.2.1.del presente informe de Gestión, el proyecto consiste en realizar la instalación de 350 metros lineales de cerramiento en malla eslabonada con puerta de doble hoja del área común actual de las barreras ambientales 5 y 6 en las inmediaciones de la vía Lisboa, de conformidad con lo exigido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- en el Acta reunión de control y seguimiento ambiental No 82 del 26 de marzo de 2021.

En total se visitaron 14 personas (presidentes de las JAC y residentes del barrio Lisboa) a quienes se informó acerca del proyecto. Con los representantes comunitarios se programaron y llevaron a cabo las reuniones de socialización el día 13 de enero de 2022.

De otra parte, durante el mes de enero de 2022, se realizaron visitas a la Junta Administradora Local – JAL de Bosa, Personería de Bosa, Junta Administradora Local – JAL de Kennedy y a los centros comerciales Plaza Imperial, Centro Suba, Subazar, Bulevar Niza, Parque La Colina y Santafé ubicados en la localidad de Suba, Portal 80 y Titán Plaza pertenecientes a la localidad de Engativá y centro comercial Palatino ubicado en la localidad de Usaquén.

Los centros comerciales se visitaron con el objeto de desarrollar actividades asociadas con la protección y preservación del medio ambiente y el recurso hídrico en el marco de los planes de Responsabilidad Social Empresarial y Ambiental.

#### 5.9.3 Componente De Educación Ambiental

#### 5.9.3.1 Socialización de la herramienta pedagógica participativa.

Durante el mes de enero de 2022, se enviaron mediante correo electrónico setenta y un (71) cartillas pedagógicas dirigidas a residentes de las localidades de Kennedy, Chapinero, Suba y Engativá, quienes participaron en algunas de las jornadas de PTAR al barrio realizadas durante el mes de enero.

En total durante el mes, se envió a setenta y una (71) personas la cartilla pedagógica denominada El saneamiento del río Bogotá.

Cuadro 5.9-7 Consolidado cartillas pedagógicas El Saneamiento del río Bogotá enviadas mes de enero de 2022

Comunidad informada	Ejemplares enviados plegable general
Residentes localidad de Kennedy	6
Residentes localidad de Chapinero	7
Residentes localidad de Suba	12
Residentes localidad de Engativá	46
Total cartillas pedagógicas enviadas mes de enero de 2022	71

### 5.9.3.2 Servicio Social estudiantes grado noveno, décimo y/o undécimo.

En el mes de enero de 2022, se continuaron desarrollando las actividades de servicio social virtual con los estudiantes de las instituciones educativas que se relacionan en el cuadro 5.9-8.

Cuadro 5.9-8 Consolidado colegios que continúan vinculados al servicio social de la PTAR El Salitre fase I hasta el mes de enero de 2022.

Nombre Institución Educativa	Localidad	Mes de vinculación	Mes de finalización y/o número de estudiantes vinculados
Colegio Manuel Cepeda Vargas IED	Kennedy	Diciembre de 2020	3
Colegio José Acevedo y Gómez	San Cristóbal	Marzo de 2021	35
Colegio El Carmen Teresiano	Barrios Unidos	Marzo de 2021	3
Colegio Manuel Cepeda Vargas IED	Kennedy	Agosto de 2021	12
Total estudiantes vincul	53		


Durante el mes de enero, los estudiantes de servicio social desarrollaron actividades relacionadas con el uso inteligente del alcantarillado, PTAR El Salitre fase I y campañas ambientales en los barrios de residencia.

A continuación, se presentan las evidencias de las actividades realizadas por los estudiantes (plegables o folletos, juegos pedagógicos, noticiero ambiental, clasificación de residuos- reciclaje y campaña ambiental).

### Fotografía 40. Plegable o folleto diseñado por estudiante de servicio social Enero de 2022




Fotografía 41. Juego pedagógico diseñado por estudiante de servicio social Enero 2022



Fotografía 42. Noticiero ambiental "Nacimiento del río Bogotá" creado por estudiante de servicio social Enero de 2022



### Fotografía 43. Clasificación de residuos: escultura elaborada en material reciclable por estudiante de servicio social Enero de 2022



Fotografía 44. Campaña ambiental "Todos por un mejor alcantarillado" adelantada por estudiante de servicio social Enero de 2022





#### 5.9.4 Componente de Relaciones Interinstitucionales

### 5.9.4.1 Reuniones CAR - Proyecto de construcción PTAR El Salitre Fase II.

El día 28 de enero de 2022, se llevó a cabo la reunión virtual de mesa de coordinación interinstitucional del proyecto de ampliación y optimización de la PTAR El Salitre fase II, mediante la cual, se efectuó la charla acerca del Plan de Identificación y Corrección de Conexiones Erradas – PICCE y el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV. La charla fue desarrollada por parte de la Dirección de Saneamiento Ambiental de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-EAAB.

#### Fotografía 45. Reunión virtual mesa de coordinación interinstitucional Proyecto de Ampliación y Optimización de la PTAR El Salitre fase I Enero 28 de 2022





#### 5.9.5 Componente de Investigación Social

#### 5.9.5.1 Realización de encuestas de percepción de la comunidad.

En el mes de enero de 2022, se diligenciaron cinco (5) encuestas de percepción con comunidades.

#### 5.9.5.2 Análisis de las encuestas de percepción de la comunidad.

El análisis de las encuestas de percepción que se apliquen entre los meses de enero a junio de 2022 con las comunidades, se llevará a cabo en el segundo semestre del año 2022.

#### 5.9.5.3 Realización de encuestas de percepción a los visitantes.

Durante el mes de enero de 2022, no se diligenciaron encuestas de percepción, debido a que no se recepcionaron solicitudes de visitas guiadas/recorridos pedagógicos en la PTAR El Salitre fase I.

### 5.9.5.4 Realización de encuestas de satisfacción en eventos y con niños.

El día 14 de enero de 2022, se llevó a cabo una reunión virtual con funcionarios del Sistema de Gestión de Calidad y la Dirección de Gestión Comunitaria de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- EAAB, mediante la cual se eliminó el uso de los formatos correspondientes a la encuesta de satisfacción en eventos y con niños(as).

Acorde a lo expuesto, únicamente se aplicará la encuesta de percepción dirigida a las comunidades y a las visitas guiadas.

#### 5.9.6 Componente Generación de Empleo

En el mes de enero de 2022, se cuenta con un consolidado de 97 empleados vinculados, de los cuales veinticinco (25) residen en la localidad de Suba y dieciséis (16) en la localidad de Engativá para un total de cuarenta y un (41) colaboradores que habitan en las localidades del área de influencia de la PTAR El Salitre fase I.

Teniendo en cuenta lo anterior, el porcentaje de empleados residentes en las localidades de Suba y Engativá y que se encuentran vinculados a la PTAR El Salitre fase I hasta el mes de enero de 2022 corresponde a 42%.

El consolidado de trabajadores vinculados a la PTAR El Salitre fase I, se relaciona a continuación:

Cuadro 5.9-9 Estado de vinculación laboral PTAR El Salitre fase I mes de enero de 2022

División	Total empleados	Suba	Engativá	% Empleados de la zona vinculados
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	17	3	1	17%
DIVISION OPERATIVA Y TECNICA	50	17	7	51%
DIVISION MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO	20	3	3	20%
DIVISION AMBIENTAL Y GESTIÓN SOCIAL	10	2	5	10%
TOTAL EMPLEADOS VINCULADOS	97	25	16	42%

#### 6. GESTIÓN DE CALIDAD

#### 6.1 INTRODUCCIÓN

A continuación, se describen las actividades desarrolladas en el marco del Sistema de Gestión de Calidad de la EAAB en la PTAR El Salitre durante el mes de enero 2022, así como el avance con respecto a las actividades programadas en el plan de trabajo de calidad de la PTAR Salitre 2022.

#### 6.2 ATENCIÓN CLIENTE EXTERNO

Se recibieron 11 comunicaciones de las partes interesadas de la PTAR, de las cuales 10 fueron respondidas y 1 no requería respuesta.

En el Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA 27 se reporta la gestión realizada entre el 01/01/2021 y el 30/06/2021 para los autos y requerimientos abiertos por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, este ICA fue radicado el 16/11/2021 a la Dirección de Saneamiento Ambiental mediante radicado 25510-2021-01581.

#### 6.3 PLAN DE TRABAJO SGC

Durante el mes de enero 2022 se resaltan las siguientes actividades del SGC:

- Seguimiento y presentaciones de la Planificación del cambio de la ampliación y optimización de la PTAR El Salitre (Fase II).
- Seguimiento a los oficios externos, internos de Fase II, organización digital (Drive y Lottus) y física de las comunicaciones relacionadas.
- Archivo, gestión documental y cargue digital a Lottus de la documentación de la PTAR El Salitre. Seguimiento al formato del inventario único de gestión documental – FUID de la PTAR El Salitre.
- Organización del Fondo acumulado de la PTAR El Salitre de los años 2005 a 2013.
- Realizar socializaciones periódicas del funcionamiento y el estado actual de la PTAR El Salitre a sus grupos de interés, autocontrol MIPG.
- Verificar el cumplimiento de lo establecido en el convenio y contratos administrativos vigentes asociados a la operación, mantenimiento y demás actividades que corresponden a la PTAR el Salitre.
- Revisión de Planes de Gestión y Calidad de los contratos de la PTAR El Salitre.
- Compilación y seguimiento soportes del acompañamiento y entrenamiento presencial de la EAAB a las pruebas y puesta en marcha de la PTAR El Salitre por parte de la CAR Cundinamarca.
- Mesas de trabajo para la actualización de la matriz de riesgos y oportunidades de alcantarillado sanitario y pluvial.

- Revisión de la creación y articulación de la documentación de la PTAR Salitre Fase II.
- Mesas de trabajo para la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales de la PTAR El Salitre.
- Mesas de trabajo para la identificación y valorización de los activos de información de la PTAR El Salitre.
- Seguimiento a la información estadística de la Dirección Red Troncal Alcantarillado respecto al Plan Estadístico Distrital. Reporte de los registros y operaciones estadísticas en el sistema Archer de la EAAB.
- Seguimiento requisitos documentales contrato interadministrativo entre Aguas de Bogotá y la EAAB.
- Seguimiento y reporte de la evaluación y re-evaluación de proveedores de la PTAR El Salitre.
- Mesas de trabajo y seguimiento sobre la Gestión Ambiental de la PTAR El Salitre Fase I y Fase II.
- Seguimiento actos administrativos ICA No.27.
- Cargar evidencias e informe Fase II.
- Reuniones, seguimiento y compilación a los contratos de consultorías para la recepción de la PTAR El Salitre Fase II y Tramite Permiso de Vertimientos.
- Solicitud Software usuarios PTAR Salitre.
- Compilación de evidencias, seguimiento y formulación de Indicadores de Gestión de la PTAR El Salitre 2021 en el Aplicativo al Plan de Acción – APA.
- Organización y seguimiento Comité de Supervisión PTAR El Salitre.
- Reporte autocontrol a planes de mejoramiento del SUG, de tratamiento de riesgos y oportunidades y de implementación de cambios de alto impacto. Corte diciembre de 2021.
- Seguimiento, compilación de Informes Técnicos hallazgos y ayudas de memoria PTAR Salitre Fase II semanales.
- Seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento de las auditorías internas de la EAAB y de la revisión por la dirección realizada por la Gerencia General de la EAAB.
- Reporte de Informe mensual de actividades y solicitud de publicación del informe mensual de la PTAR El Salitre.

- Informe de gestión de la EAAB-ESP con biosólidos producidos en la PTAR el salitre – Bogotá.
- Reporte de información de GEI de la PTAR El Salitre a la Dirección de Saneamiento Ambiental para el cargue a la herramienta ECAM.
- Socialización de los manuales del sistema Ariba y seguimiento de procesos de contratación en SAP Ariba.
- Revisión de la información relacionada con la PTAR El Salitre en la formulación del Plan de Acción Climática – PAC de la Secretaría Distrital de Ambiente.
- Seguimiento de usuarios y sistemas de información de la PTAR El Salitre.
- Seguimiento a la encuesta sobre el estado de salud de los colaboradores y la continuidad del servicio.
- Socialización nuevo Manual de Contratación de la EAAB, Resolución 1044 del 18 de enero de 2021.
- Mesas de trabajo para el seguimiento a los usuarios contaminantes de Zona 1 y Zona 2, área aferente de la PTAR El Salitre. Socialización material campaña publicitaria "Como el agua y el aceite".
- Compilación de información y respuesta de derechos de petición y solicitudes varias sobre la PTAR El Salitre.

#### 6.4 AUDITORÍA INTERNA

No se presentaron auditorías en el periodo.

#### 6.5 PLANES DE MEJORAMIENTO

Se realizó seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento de las auditorías internas de la EAAB y de la revisión por la dirección realizada por la Gerencia General.

Se realizó etiquetado de los transformadores de la PTAR EL SALITRE, según Plan de mejoramiento "Auditoría interna ambiental al plan de manejo ambiental (PMA) de la PTAR SALITRE"







Así mismo, se inició la formulación del análisis de causas y el Plan de mejoramiento derivado del informe de la auditoría de la OCIG, realizada entre septiembre y diciembre de 2021, y se citó a las áreas involucradas para el desarrollo del mismo.

#### 6.6 GESTIÓN DE RIESGOS

Se continuó con el desarrollo de las mesas de trabajo para la actualización de la matriz de riesgo de alcantarillado sanitario y pluvial entre la Dirección de gestión de Calidad y Procesos, la Gerencia Corporativa de Servicio Al Cliente y la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro.

#### 6.7 INDICADORES

Se realiza la compilación y verificación de indicadores de la PTAR del mes de enero 2022:

Indicador Meta 2022 Ene Atención Oportuna de Solicitudes Cliente Externo 100% 100% Índice de Análisis Ejecutado 100% 100% Índice de Cumplimiento del Mantenimiento 91% 74% Índice de Cumplimiento Plan de Manejo Ambiental 99% 99% PTAR Salitre Ausentismo laboral <2% 0.7% Costo por Metro Cúbico Tratado PTAR El Salitre (VPN \$527,45/m3 \$122/m3 Índice de Cumplimiento Operativo 100% 100% Caudal Medio de Agua Tratada  $4 \,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$  $4.57 \,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ 

Cuadro 6.7-1 indicadores de la PTAR mes de enero 2022

#### 6.8 PRODUCTO NO CONFORME

Para el mes de enero no se presentó producto no conforme ya que se tuvo concentraciones de salida de SST y DBO<sub>5</sub> de 14.18 mg/L y 21.06 mg/L, respectivamente. Se identificaron dificultades operativas dado que la PTAR El Salitre Fase II no se encuentra estabilizada ni terminada por parte de la CAR Cundinamarca.

Toda esta etapa de transición se le informó anteriormente a la ANLA desde el 16/04/2019 mediante radicado 2019049298-1-000, el 11/10/2019 mediante radicado 2019164940-1-000 y el radicado 2020102605-1-000 del 30/06/2020. Es de resaltar que a pesar de las dificultades presentadas se pudo dar cumplimiento a los requerimientos de la licencia ambiental del programa de Saneamiento del Río Bogotá para la PTAR El Salitre.

La licencia ambiental en mención exige como concentración de salida para SST y DBO5 que sea igual o menor ( $\leq$ ) a 30 mg/L, por lo que estamos cumpliendo con lo requerido. Así mismo, a partir de la literatura (Metcalf & Eddy, 2003)<sup>1</sup> y el RAS 2017 (Res. 330 de 2017) se confirma que el tratamiento secundario de aguas residuales remueve entre el 80% y el 95% en DBO5 y SST, es decir, que también se cumple con el promedio establecido por la literatura y el RAS 2017.

Se autoriza la liberación del producto (agua residual tratada) con restricción de uso, informando todas las características del agua tratada a las partes interesadas de la EAAB a través del Informe mensual de la PTAR El Salitre en la página web, y semestralmente a la Autoridad Nacional del Licencias Ambientales -ANLA mediante el Informe de Cumplimiento Ambiental -ICA.

En caso de que se requiera que el agua tratada por la PTAR El Salitre sea utilizada para consumo humano y doméstico, preservación de flora y fauna, uso agrícola, pecuario, recreativo, industrial u otro, el interesado deberá caracterizar el agua y dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 y la Resolución 1207 de 2014.

La FAO (1999)<sup>2</sup>, la OMS (2006)<sup>3</sup> y la EPA (2012)<sup>4</sup> establecen que, para el reúso del agua residual en actividades agrícolas o industriales, es necesario un tratamiento secundario con desinfección que obtenga valores por debajo de 10 mg/L para la DBO $_5$ .

En conclusión, la PTAR El Salitre contribuye considerablemente a la reducción de la carga contaminante del Río Bogotá, tratando las aguas residuales que provienen de la Cuenca Torca-Salitre, que corresponde a cerca del 30% de las aguas residuales de la ciudad de Bogotá<sup>5</sup> y actualmente se encuentran en desarrollo los otros componentes del Programa de Descontaminación del Río Bogotá con esfuerzo y coordinación interinstitucional entre la EAAB, la CAR Cundinamarca, la SDA y demás entidades involucradas.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Metcalf & Eddy (2003) Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 4th Edition, McGraw-Hill, New York <sup>2</sup> FAO. (1999). Wastewater treatment and use in agriculture..

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> OMS. (2006). Guidelines for the Safe Use of Wastewater. Excreta and Greywater in Agriculture. 2006, ed., Francia. <sup>4</sup>U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2012). Guidelines for Water Reuse. Washington D.C., Municipal Support Division Office of Wastewater Management Office of Water

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 2.564,655 habitantes asentados en la cuenca Salitre – Torca (Según Censo DANE 2018).

Por otro lado, es necesario aclarar que por orden de la honorable magistrada Nelly Villamizar y en razón del incidente 070, la EAAB inició la operación de la PTAR El Salitre Fase II desde el 16/12/2021, motivo por el cual la EAAB se encuentra ejecutando la Planificación de cambios de la Ampliación y Optimización de la PTAR El Salitre (Fase II) que se encontraba formulando desde el año 2019. Sin embargo, la planta aún no ha sido terminada ni estabilizada todavía por parte de la CAR Cundinamarca. La ampliación y optimización de la PTAR El Salitre se encuentra en desarrollo mediante el Contrato 803 de 2016 entre la CAR y el Consorcio Expansión PTAR Salitre – CEPS, este último aún no entrega la totalidad de los planos as-built aprobados, dossiers, manuales, pólizas, inventario de equipos, repuestos, garantías de los fabricantes, expertos para la operación asistida y demás requerimientos del Contrato 803 de 2016 necesarios para la adecuada operación, mantenimiento y administración de la PTAR El Salitre.

### 7. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado en la PTAR El Salitre, consiste en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de medicina preventiva, higiene y seguridad industrial; las cuales buscan garantizar conductas, condiciones, procesos seguros y saludables en el logro de los objetivos de la empresa.

A través de este Sistema de Gestión se establece el alcance de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo con relación al proceso de la PTAR El Salitre, que propenden la preservación, mantenimiento y mejoramiento de la salud individual y colectiva de los trabajadores para el desarrollo de sus funciones en un ambiente laboral seguro.

En la PTAR El Salitre se desarrollan actividades con el fin de prevenir o mitigar los efectos causados por los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, dando cumplimiento a los requisitos legales y contractuales de funcionamiento de la planta.

#### 7.1 Medicina Preventiva y del Trabajo

El programa de medicina preventiva y de trabajo tiene como finalidad la promoción, prevención de la salud frente a los factores de riesgo laborales, también recomienda lugares óptimos de trabajo de acuerdo a las condiciones psicofisiológicas del empleado con el fin que este pueda desarrollar sus actividades.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2022 se realizaron las siguientes actividades:


- Verificación diaria en el uso de los EPP's (Elementos de protección personal), en las diferentes actividades que se realizan en la PTAR.
- Se mantienen las actividades contempladas en el protocolo de Bioseguridad para prevenir el contagio del COVID 19.
- Se realiza el cargue de los dispensadores de jabón de manos.
- Se realiza seguimiento a las recomendaciones médicas dadas desde el área de coordinación de seguridad y salud en el trabajo.
- Se suministra gel antibacterial al personal y se realiza mantenimiento a los dispensadores dispuestos en el edificio administrativo, laboratorio, casino, taller, y sala de control.
- Teniendo en cuenta los lineamientos de la secretaria de salud y el ministerio de la protección social se continúa con la prevención de contagios por COVID 19.
- Se continúa con la programación de los turnos de trabajo de los colaboradores de la PTAR, entre el Gerente de Proyectos y Saneamiento Básico de Aguas de Bogotá y los jefes de área de la PTAR, los cuales fueron avalados por el Supervisor del Contrato.

A continuación, se relaciona registro de las actividades de aseo como prevención al contagio del Covid 19:

#### Fotografía 47. actividades de aseo como prevención al contagio del Covid 19:



Se mantienen las labores de apoyo por parte de la empresa de aseo Eminser




Apoyo en labores de aseo por parte de la empresa Eminser.



Se mantiene las condiciones de Bioseguridad para la toma de alimentos en el casino.



Protocolo de bioseguridad para ingreso al casino.



Se mantiene el distanciamiento físico para la toma de alimentos en el casino.



Distanciamiento físico para ingresar a zonas comunes.

 Se mantiene el control diario al uso de los elementos de protección personal de los trabajadores, según las actividades a cargo de los trabajadores, como se evidencia a continuación:

#### Fotografía 48. Control diário EPP



Supervisión de uso de EPP's en actividades de orden y aseo



Supervisión de uso de EPP's en labores de alto riesgo



Supervisión de uso de EPP's en actividades operativas.



Supervisión de uso de EPP's en los CCM

- Se realiza desinfección de equipos y herramientas por parte de los trabajadores.
   De Igual manera se supervisa la desinfección en las rutas de transporte del personal.
- Se ejecutan con mayor frecuencia las actividades de limpieza y desinfección de las zonas comunes de la Planta de Tratamiento El Salitre: taller, laboratorio, sala de control, edificio administrativo fase 1 y fase 2 y casino, esto con el apoyo del personal de servicios generales.
- La fumigación y desinfección en la planta y casino, se realiza con el apoyo del contratista TKC Fumigaciones S.A.S.
- Se realiza constante verificación al buen uso del tapabocas suministrado al personal de la PTAR Salitre.

- Se desarrollan actividades de sensibilización de autocuidado al personal con fundamento en las normas establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en temas de sintomatología y uso de protección respiratoria.
- Se mantienen las jornadas de sensibilización con el personal a fin de generar conciencia y entender la importancia del lavado de manos constante, el auto cuidado por contagio de virus y bacterias.

### Fotografía 49. sensibilización con el personal autocuidado por contagio de virus y bacterias.



Se realiza acompañamiento en la operación asistida.




Se realiza acompañamiento en actividades que se realizan en fase II.

- Se mantienen las carteleras informativas de autocuidado, higiene y sensibilización de prevención ante el contagio del covid-19.
- La manipulación de los alimentos se realiza con personal especializado y con los recursos suficientes para garantizar la bioseguridad y las buenas prácticas de manejo.
- Se mantiene identificada la ruta de notificación de casos ante las entidades de salud competentes.
- Se realiza control de acceso al casino de la PTAR Salitre, se mantienen separadas las mesas para la toma de alimentos con el fin de tener el distanciamiento entre los trabajadores.

#### Fotografía 50. limpieza y desinfección de las zonas comunes de la Planta



Se realiza verificación de los productos químicos a utilizar en la jornada de fumigación.



Se realiza instalación de cajas para el control de roedores.



Se realiza jornada de control de vectores y roedores.



Se realiza control de vectores y roedores

- Se realiza seguimiento en vacunación al personal según lo establecido por el gobierno nacional; así mismo, se promueve la vacunación como método de autocuidado y cuidado colectivo, teniendo en cuenta que la presencialidad es del 100% de los trabajadores, esto nos permite cumplir con las metas establecidas por el ministerio de salud.
- Ejecución de inspecciones correspondientes al mes de enero de acuerdo al cronograma

#### 7.1.1 Sistemas de vigilancia epidemiológica:

Dentro del programa de vigilancia epidemiológica se realiza seguimiento a los casos por enfermedad común los cuales son atendidos por las EPS.

Durante el mes de enero se continuó realizando seguimiento sintomatológico a todo el personal de turno en la planta, como control y prevención ante el contagio por Covid-19.

Durante el periodo se presentaron tres casos por Covid-19.

A continuación, se evidencia un resumen de los casos presentados desde sus inicios de la pandemia.

Gráfica 7.1-1 Histórico casos de covid-19 PTAR Salitre



Histórico, casos de covid-19 en la PTAR Salitre

#### 7.1.2 Indicadores subprograma medicina preventiva y del trabajo:

Durante el mes de enero, NO se presentaron accidentes de trabajo.

Durante el mes de enero se reportaron tres (3) incapacidades por enfermedad general.

#### 7.1.3 Fomento de estilo de trabajo y vida saludable

Durante el periodo se mantienen suspendidas las actividades deportivas y de contacto como mecanismo de prevención ante el COVID-19.

Se realizó actividad de socialización en estilos de vida saludable y buenos hábitos alimenticios.

Se realiza actividades de pausas activas con el personal administrativo.

Fotografía 51. Fomento de estilo de trabajo y vida saludable









#### 7.2 Seguridad e Higiene Industrial

El programa de Higiene y Seguridad Industrial tiene como objetivo la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores que se originan en los lugares de trabajo y que pueden afectar la salud de los trabajadores.

Para este componente se mantienen las actividades de evaluación de Higiene Industrial y Seguridad Industrial.

En el presente periodo se continúan entregando Elementos de Protección Personal, aumentado las frecuencias en el suministro de mascarillas. Continúan las actividades de prevención en los siguientes temas:

- Inducción en seguridad y salud en el trabajo al personal que ingresa al proyecto contratistas.
- Responsabilidades dentro del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
- Capacitación sobre Qué es ATEL y reporte de AT.
- Brigada de Emergencias MANEJO DE DERRAMES QUIMICOS
- Desinfección y limpieza de herramientas, guantes, botas PVC, maquinaria y almacenamiento de materiales.

#### 7.2.1 Inspecciones

INSPECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Se mantienen las inspecciones en cada una de las actividades con el fin de concientizar a los trabajadores del buen uso y mantenimiento de estos elementos, y queda registrado en el formato establecido por la EAAB-ESP.

Se mantiene control estricto frente al uso de sus elementos de protección personal.

INSPECCION DE EXTINTORES: Se realiza con el fin de verificar el estado actual de estos elementos para la extinción de incendios y poder reaccionar ante un evento de conato de incendio.

INSPECCION DE BOTIQUINES: En cumplimiento de la resolución 0705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, se realiza inspección de elementos de botiquines con el fin de evaluar el estado de los mismos en la planta.

INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO: Se evalúan las diferentes áreas de la planta teniendo como objetivo mantener las buenas prácticas de orden y aseo en los diferentes puestos de trabajo, registrando la información en el formato establecido por la EAAB-ESP.

INSPECCIÓN DE TRANSPORTE DE BIOSOLIDO: Con el fin de garantizar el adecuado trasporte del biosólido generado por la PTAR Salitre al lugar de aprovechamiento, de tal forma que se cumpla con los parámetros de seguridad. Se realiza la respectiva inspección y queda registrada en el formato establecido por la EAAB-ESP.

INSPECCIONES ATMOSFERICAS: Con el fin de garantizar un control en el manejo de gases y vapores se realizan mediciones en diferentes áreas de la planta en oxigeno O2, Monóxido de carbono CO, Gases explosivos, y Ácido sulfhídrico H2S. Quedando registro en el formato establecido por la EAAB-ESP.

#### 7.2.2 Tareas de Alto Riesgo Autorizadas

Las actividades que representan alto riesgo al trabajador son supervisadas y acompañadas por el profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien determina las medidas de seguridad a seguir, iniciando por la medición, evaluación de atmosferas peligrosas en estas áreas; es de uso obligatorio la protección respiratoria con cartuchos para gases y vapores, durante el trabajo.

En el periodo se realizaron las siguientes actividades de alto riesgo:

#### Cuadro 7.2-1 Tareas de Alto Riesgo Autorizadas

ACTIVIDAD	EQUIPO DE TRABAJO	FECHA
Desmonte riel de soporte cable puente 54,2	Mantenimiento Electromecánico.	3/01/2022
Instalación de la rueda en el puente 4,8	Mantenimiento Electromecánico.	3/01/2022
Instalación de rueda en el puente 4,8	Mantenimiento Electromecánico.	4/01/2022
Desmonte riel de soporte cable puente 54,2	Mantenimiento Electromecánico.	4/01/2022
Pretratamiento fase I, limpieza lavado canales de grasas	Operación y Técnica	5/01/2022
Cambio de ruedas puente desarenador	Mantenimiento Electromecánico.	7/01/2022
Instalación cheque y raqueta de bloqueo	Mantenimiento Electromecánico.	12/01/2022
Desarme andamio soplador C al E para labores de lubricación	Mantenimiento Electromecánico.	13/01/2022
Instalación encausador T 05	Mantenimiento Electromecánico.	14/01/2022
Revisión y cambio del extractor	Mantenimiento Electromecánico.	17/01/2022
Cambio rueda puente decantador 57,5	Mantenimiento Electromecánico.	18/01/2022
Revisión del sensor de nivel tanque flotantes 58,1	Mantenimiento Electromecánico.	18/01/2022
Instalación rueda puente decantador 57,5	Mantenimiento Electromecánico.	19/01/2022
Revisión polipasto	Mantenimiento Electromecánico.	20/01/2022
Extracción de grasas	Operación y Técnica	17/01/2022
Mantenimiento preventivo compuertas eléctrico y control	Mantenimiento Electromecánico.	21/01/2022
Extracción de manto de lodo	Operación y Técnica	24/01/2022
Mantenimiento trimestral polipasto rejas gruesas	Mantenimiento Electromecánico.	25/01/2022
Extracción manto de grasa	Operación y Técnica	26/01/2022
Instalación sensor de nivel	Mantenimiento Electromecánico.	26/01/2022
Desmontar cardan de la bomba de agua cruda	Mantenimiento Electromecánico.	26/01/2022
Conexión de la bomba del tanque del 86	Mantenimiento Electromecánico.	27/01/2022
Mantenimiento de sensores de flujo de aire	Mantenimiento Electromecánico.	27/01/2022
Limpieza de nata de grasa de espesadores	Operación y Técnica	27/01/2022
Extracción de bomba 13P01A	Mantenimiento Electromecánico.	28/01/2022
Corto en caja inspección clarificadores	Mantenimiento Electromecánico.	28/01/2022
Lavado del tanque 025 de agua potable	Operación y Técnica	31/01/2022

#### 7.2.3 Saneamiento básico

En la PTAR el Salitre se trabaja en la conservación de la salud de los trabajadores y juega un papel muy importante, la prevención de las enfermedades gastrointestinales cuyo origen podría estar en la contaminación cruzada, para tal fin de implementaron las siguientes medidas preventivas:

- Se mantienen las condiciones sanitarias y de limpieza en las diferentes áreas de trabajo.
- Se continúa con el manejo sanitario de los residuos sólidos generados en la Planta de Tratamiento.
- Se controla el ingreso al casino por turnos de igual forma el distanciamiento.
- Se continúa con el control de roedores y vectores

#### 7.2.4 Manejo integral de sustancias químicas:

En la PTAR el Salitre se utilizan sustancias químicas, para el mantenimiento y operación de la planta, que se encuentran almacenadas en contenedores de acuerdo con la matriz de almacenamiento de sustancias químicas.

#### 7.2.5 Registro fotográfico

#### Fotografía 52. Actividades mes de enero



Comité SST, entrega fase II PTAR Salitre, CEPS Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. y EAAB S.A. E.S.P.



Comité SST, entrega fase II PTAR Salitre, CEPS Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. y EAAB S.A. E.S.P.



Fumigación de volcos con material de rejas finas y rejas gruesas, para evitar olores ofensivos.



Orden y aseo en área de pretratamiento.



Mediciones de ruido en las diferentes áreas de la PTAR el Salitre fase II



Mediciones de ruido en las diferentes áreas de la PTAR el Salitre fase II



Medición de atmósferas en las diferentes áreas de la PTAR el Salitre fase II



Medición de atmósferas en las diferentes áreas de la PTAR el Salitre fase II



Recorrido de reconocimiento de zonas para la operación asistida.



Acompañamiento en actividades operativas con apoyo del vactor.

#### **ANEXOS CAPÍTULO 3**

# Anexo Cap $3\_1$ eficiencia de la planta


				П	_ ×	П						T	T	T	Ţ								T	T				T		T				Γ	]	П		_
				KIGENO	CARGA ELIMINADA	t O <sub>2</sub> /d	64,59	53,94	82,38	78,62	83,55	94,19	82'66	86,65	96,29	117.30	123,01	151,23	105,49	85,73	173,44	130,17	107,46	132,23	217.41	180,56	175,08	117,77	126,48	104.65	112,10	104,99	119,25	3610.93		217,41	116,48	53,94
				DEMANDA BIOQUIMICADE OXIGENO	CARGA ENT RADA	t/d	71,56	60,09	88,40	85,53	89'62	101,52	105,33	93,79	161.48	131,60	134,54	163,48	114,22	94,23	180,88	138,85	115,28	139,01	224.46	193,79	187,10	126,65	136,93	114.40	120,55	115,11	128,91	3881.57		224,46	125,21	60 09
			ITRE	ANDA BIOQU	AT	mg O₂/I	24,00	21,00	17,00	21,00	18,00	22,00	17,00	22,50	14,00	42.00	29,00	30,00	25,00	25,00	19,00	23,00	21,50	20,00	17.00	27,00	29,00	23,50	28,00	00'92	23,50	29,00	26,50			42,00	23,97	14.00
			OPTAR SAL	DEM,	AC	mg O₂/I	236,50	196,00	239,00	248,00	255,00	294,00	302,00	283,50	776,00	354.00	333,50	374,00	311,50	265,00	417,00	365,00	310,50	372,00	384.00	261,00	367,00	317,00	344,00	201.00	317,50	313,00	335,00			425,50	314,13	00000
			LABORATORIO INTERNO PTAR SALITRE		CARGA	pμ	29,22	24,08	56,35	35,32	29,07	44,46	45,38	35,32	37,15	56.64	36,45	89,47	68,26	45,17	50,98	82,21	53,03	44,41	80.68	178,39	114,27	78,38	51,45	39.72	60,01	52,56	33,64	1734.70		178,39	55,96	00.00
			LABORAT	ΤA	CARGA ENTRADA E		33,28	27,59	59,18	38,28	30,76	46,79	47,18	37,39	39,79	64.13	45,99	96,82	73,15	49,25	55,09	86,54	59,03	49,32	83.59	185,25	122,36	83,10	55,13	44.03	63,79	55,35	36,56	1865.27		185,25	60,17	01.00
ΑT	æ	as		OS SUSPENI	AT			+	8,00				+	+	+								-	+	2,00		19,50	1		+	10,50					24,00		
BOGC	RIO PTA	* 12 Hor		SOLID	AC	l/gm		90,00				135,50	+	+	108,50	H		H	_		Н	$\dashv$	+	+	143.00	H	240,00	+	+	+	-					249,50 2	+	
RE FASE	RESULTADOS LABORATORIO EAAB-LABORATORIO PTAR	TAS: (2)																										1						39		Н		
L SALIT	AAB-LAE	OMPUES		OXIGENO	_ =	t O <sub>2</sub> /d	58,2	56,28	88	9,77,	83,3	386	66,12	84,6	98,6	65.13	101	7'86	24,7	46,3	96'1	74,2	40,5	65,0	123.79	80'69	94,1	61,13	87,5	128	48,34	92,6	95,0	2493.39		128,01	80,4	170
UALESE	ORIO E	TRASC	DE BOGOTA	DEMANDA BIOQUIMICADE OXIGENO	CARGA	t/d	62,33	60,09	99,50	86,22	98'86	105,32	71,02	92,30	106,36	73.98	113,36	106,65	27,50	49,07	98'90	77,98	46,41	72,12	129.18	72,02	103,49	64,72	93,15	141 13	57,33	104,81	108,13	2728.58		141,13	88,02	21 20
S RESIDI	<b>ABORAT</b>	- MUES	FARILLADO D	EMANDA BIO	AT	ll₂O gm	14,00	13,00	31,00	26,00	31,00	19,00	15,00	24,00	22,00	26.00	29,00	20,00	8,00	8,00	2,00	10,00	12,00	21,00	13.00	00'9	22,50	9,50	33.00	35,00	25,00	35,00	36,00			40,00	21,06	2
E AGUA	ADOS L	PLANTA	CTO ALCAN	<u> </u>	AC	mg O₂/I	206,00	196,00	269,00	250,00	267,00	305,00	207,00	279,00	247.00	199,00	281,00	244,00	75,00	138,00	228,00	205,00	125,00	193,00	221.00	97,00	203,00	162,00	234,00	359.00	151,00	285,00	281,00		-	329,00	226,61	1100
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALITRE FASE II BOGOTA	RESULT	ANEXO 1 - EFICIENCIA DE LA PLANTA - MUESTRAS COMPUESTAS: (2) * 12 Horas	LABORATORIO EMPRESA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE BOGOTA	VLES	CARGA ELIMINADA	pμ	46,54	17,11	57,09	30'08	41,20	54,27	40,98	27,95	37,22	16.49	44,94	110,20	53,89	29,13	43,10	79,16	37,41	38,75	80.19	183,74	107,15	85,29	31,14	56.49	40,47	32,72	19,16	1636.50		183,74	52,79	46.40
TRATAN		EFICIENC	ATORIO EMPI	SOLIDOS SUSPENDIDO TOTALES	CARGA ENTRADA	t/d	52,35	22,38	59,92	31,73	42,89	55,94	43,92	31,76	41,81	26.02	55,67	117,14	60,87	36,27	48,58	83,69	42,32	44,84	39,06	193,04	114,20	88'69	34,23	62.11	44,42	35,86	24,63	1796.65		193,04	96'29	22.20
NTA DE		EX0 1 -	LABOF	LIDOS SUSP	AT	l/gm	20,00	18,00	8,00	2,00	2,00	2,00	00'6	12,00	13,00	28,00	27,00	17,00	20,00	21,00	14,00	12,00	13,50	18,00	11.00	19,00	17,00	00'6	8,00	15.00	11,00	00'6	15,00			28,00	14,18	2
PLA		A		SOI	AC	mg/l	173,00	73,00	162,00	92,00	122,00	162,00	128,00	00'96	218.00	70.00	138,00	268,00	166,00	102,00	112,00	220,00	114,00	120,00	145.00	260,00	224,00	222,00	137.00	158.00	117,00	97,50	64,00			268,00	140,98	64.00
					DIFERENCIA	%	-4,19	-4,61	-4,48	4,84	-3,82	-3,66	-4,96	-4,14	3,04	9.19	-1,50	90'2-	-5,02	-4,60	-10,86	98'0-	-2,04	-10,35	-40.83	-51,63	-22,91	-5,71	-2,80	-4 90	-5,57	-5,44	-5,60			-8,17	-51,63	98 0-
			S		ADA	m³/d	290405	293099	354025	328962	338605	333126	326886	317685	352851	340463	397439	408268	349144	339921	391282	377171	363833	338629	415063	489668	414804	377923	387229	374758	359644	348792	364379	11246120		489668,00	62778,07	0040600
			TOTALES		AGUA TRATADA	m³/s	3,36	3,39	4,10	3,81	3,92			1	4,08						4,53			3,92					4,48			4,04	4,22			5,67 4		
	2																							+				1						746		Н		
	2022		FOTALES		AGUACRUDA	m³/d	302583	306607	369872	344888	351554	345307	343103	330841	356765	371756	403412	437103	366679	355568	433759	380408	371264	373673	584540	742475	509822	399520	398063	393119	379684	367757	384801	12252746		742475,00	39524	
	ENERO		Ĭ		AG	m³/s	3,50	3,55	4,28	3,99	4,07	4,00	3,97	3,83	4,24	430	4,67	90'9	4,24	4,12	5,02	4,40	4,30	4,32	6.77	8,59	2,90	4,62	4,61	455	4,39	4,26	4,45			8,59	4,57	2
	MES:				DIA		-	2 6	4	2	9	7	80	6 5	5 £	12	13	14	15	16	17	18	19	2 5	5 25	23	24	52	97 20	28	3	30	34	TOTAL		MAXIMO	MEDIO	CHILINA

### Anexo Cap 3\_2 Lluvias Cuenca Salitre - Enero 2022

Tipo de Reporte : Lluvias Cuenca Salitre - Enero 2022

Fecha	Tiempo	Ferias	Bolivia	s Cuenca Salitr	Usaquen	PTAR	PROMEDIO
reciia	пешро	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia	Lluvia
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	24:00:00		0,10			111111	0,10
2	24:00:00		0,10				0,10
3			· ·				<u> </u>
	24:00:00		0,10				0,10
4	24:00:00		0,00				0,00
5	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	24:00:00	0,00	0,50	3,90	0,00		1,10
7	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	24:00:00	1,50	1,70	1,20	0,70		1,28
11	24:00:00	1,40	0,30	0,00	0,00		0,43
12	24:00:00	0,00	0,00		0,00		0,00
13	24:00:00	5,20	2,40	4,80	5,70		4,53
14	24:00:00	0,90	0,80	0,00	0,00		0,43
15	24:00:00	0,00	0,10	0,00	0,00		0,03
16	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17	24:00:00	2,30	1,20	7,00	0,00		2,63
18	24:00:00	0,10	0,10	0,00	0,00		0,05
19	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	24:00:00	10,60	2,20	2,60	21,80		9,30
23	24:00:00	3,60	1,90		0,00		1,83
24	24:00:00	0,10	0,00		7,00		2,37
25	24:00:00	0,10	0,00		0,40		0,17
26	24:00:00	4,10	0,00	0,00	2,10		1,55
27	24:00:00	0,10	0,00	0,00	0,00		0,03
28	24:00:00	6,30	0,00	0,00	0,00		1,58
29	24:00:00	0,10	0,00	0,00	0,00		0,03
30	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31	24:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

#### Lluvias Cuenca Salitre - Enero 2022

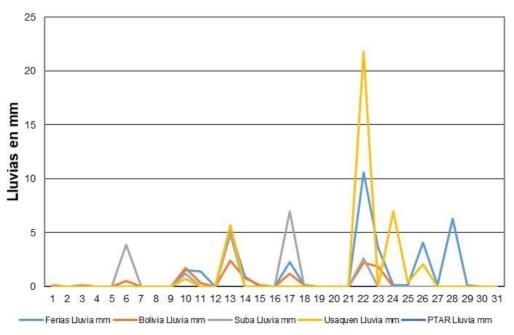

#### Anexo Cap 3\_3 Niveles Lamina de agua cotas a nivel del mar del Canal Salitre Vs Lluvias Canal Aferente

Niveles Lamina de agua cotas a nivel del mar del Canal Salitre Vs Lluvias Canal Aferente

		SAL	ITRE			BOG	OTA	
DÍA	NIVEL MINIMO	NIVEL MAXIMO	NIVEL MINIMO	NIVEL MAXIMO	NIVEL MINIMO	NIVEL MAXIMO	NIVEL MINIMO	NIVEL MAXIMO
	CANAL SALITRE	CANAL SALITRE	CANAL SALITRE LAMINA DE AGUA	CANAL SALITRE	CANAL BOGOTA	CANAL BOGOTA	BOGOTA LAMINA	BOGOTA LAMINA
1/01/2022	2540.87	2541.23	3.64	4.23	2539.82	2541.30	DE AGUA 1.52	3.00
2/01/2022	2540,87	2541,25	3,64	4,23	2539,82	2541,30	1,32	3,00
3/01/2022	,	- ,	3,72	4,09	2539,76	- /-	1,46	3.00
	2540,99	2541,87	- /	,-	, -	2541,30	, -	-,
4/01/2022	2540,89	2541,44	3,69	4,44	2539,89	2541,32	1,59	3,02
5/01/2022	2540,88	2541,12	3,70	4,12	2539,74	2541,31	1,44	3,01
6/01/2022	2540,83	2541,12	3,63	4,12	2539,67	2541,30	1,37	3,00
7/01/2022	2540,84	2541,00	3,70	4,00	2539,69	2541,28	1,39	2,98
8/01/2022	2540,83	2540,98	3,70	3,98	2539,64	2541,28	1,34	2,98
9/01/2022	2540,82	2541,06	3,67	4,06	2539,62	2541,29	1,32	1,53
10/01/2022	2540,86	2541,09	3,75	4,09	2539,67	2541,31	1,37	3,01
11/01/2022	2540,88	2541,22	3,69	4,22	2539,81	2541,31	1,51	3,01
12/01/2022	2540,95	2541,47	3,61	4,47	2539,70	2541,31	1,40	3,01
13/01/2022	2541,01	2541,66	3,67	4,66	2539,82	2541,31	1,52	3,01
14/01/2022	2540,95	2541,69	3,64	4,69	2539,80	2541,30	1,50	3,00
15/01/2022	2540,87	2541,34	3,64	4,34	2539,81	2541,31	1,51	3,01
16/01/2022	2540,89	2541,31	3,56	4,31	2539,72	2541,30	1,42	3,00
17/01/2022	2541,04	2541,69	3,73	4,69	2539,82	2541,30	1,52	3,00
18/01/2022	2540,89	2541,19	3,63	4,19	2539,66	2541,32	1,36	3,02
19/01/2022	2540,84	2541,09	3,61	4,09	2539,70	2541,31	1,40	3,01
20/01/2022	2541,00	2541,78	3,63	4,78	2539,55	2541,32	1,25	3,02
21/01/2022	2541,04	2541,28	3,66	4,28	2539,76	2541,31	1,46	3,01
22/01/2022	2541,27	2542,47	3,63	5,47	2539,76	2541,30	1,46	3,00
23/01/2022	2541,26	2542,25	3,67	5,25	2539,93	2541,30	1,63	3,00
24/01/2022	2540,93	2541,44	3,53	4,44	2539,82	2541,30	1,52	3,00
25/01/2022	2540,92	2541,25	3,74	4,25	2539,93	2541,30	1,63	3,00
26/01/2022	2540,91	2541,14	3,70	4,14	2539,86	2541,30	1,56	3,00
27/01/2022	2540,95	2541,31	3,58	4,31	2539,81	2541,30	1,51	3,00
28/01/2022	2540,97	2541,47	3,72	4,47	2539,89	2541,33	1,59	3,03
29/01/2022	2540,99	2541,34	3,67	4,34	2539,70	2541,33	1,40	3,03
30/01/2022	2540,92	2541,22	3,69	4,22	2539,65	2541,32	1,35	3,02
31/01/2022	2540,85	2540,98	3,67	3,98	2539,65	2541,31	1,35	3,01

### Anexo Cap 3\_4 Consumo polimero

E	EAAB	DI 41174 DE TD 4744151	TO EL OM ITRE DOCOT	
		PLANTA DE TRATAMIEN	TO EL SALITRE BOGOT	Α
		CONSUMOS FASE 2	ENERO 2022	
	POLIMERO MES	AS ESPESADORAS		ENTRIFUGAS
DÍA	kg/día Mesas Espesadoras	REFERENCIA	kg/día Centrifugas	REFERENCIA
1	911	Folpam-4190	672	FO 4490 VHM
2	831	Folpam-4190	394	FO 4490 VHM
3	944	Folpam-4190	593	FO 4490 VHM
4	765	Folpam-4190	558	FO 4490 VHM
5	609	Folpam-4190	556	FO 4490 VHM
6	594	Folpam-4190	416	FO 4490 VHM
7	557	Folpam-4190	257	FO 4490 VHM
8	488	Folpam-4190		FO 4490 VHM
9	365	Folpam-4190		FO 4490 VHM
10	380	Folpam-4190		FO 4490 VHM
11	442	Folpam-4190	345	FO 4490 VHM
12	384	Folpam-4190	571	FO 4490 VHM
13	365	Folpam-4190	366	FO 4490 VHM
14	335	Folpam-4190	313	FO 4490 VHM
15	342	Folpam-4190	198	FO 4490 VHM
16	285	Folpam-4190	101	FO 4490 VHM
17	354	Folpam-4190	258	FO 4490 VHM
18	345	Folpam-4190	478	FO 4490 VHM
19	360	Folpam-4190	585	FO 4490 VHM
20	365	Folpam-4190	716	FO 4490 VHM
21	363	Folpam-4190	665	FO 4490 VHM
22	428	Folpam-4190	563	FO 4490 VHM
23	383	Folpam-4190	482	FO 4490 VHM
24	336	Folpam-4190	772	FO 4490 VHM
25	318	Folpam-4190	636	FO 4490 VHM
26	309	Folpam-4190	456	FO 4490 VHM
27	348	Folpam-4190	401	FO 4490 VHM
28	396	Folpam-4190	376	FO 4490 VHM
29	404	FO 4490 VHM	383	FO 4490 VHM
30	365	FO 4490 VHM	575	FO 4490 VHM

Total	14000,92	13297,80	
Medio	451,64	474,92	
Mini	285,32	100,54	
Maxi	944,34	771,85	

612

FO 4490 VHM

FO 4490 VHM

329

31

# Anexo Cap 3\_ 5a balance consolidado de sólidos planta el salitre ampliada y optimnizada - enero 2022

			•	•	-		•		•	•	•	'	١	•						•	_	•	•	•	•	_	•	•	•	۰	•		•	_	_	۰	•	4
			1,0,1	55'55	0,00	15,51	16,93	08'40	1,58	90'91	3,38	13.83	18.0	33,36	10.83	100	91'61	08.88	17.0	15.03	01.0	177	59,63	513	15,57	11769	11.88	11.81	26.00	9736	134	71.17	50.00	58,88		18,40	111	13.81
		ь		×	r	ŀ	5 9		Ĺ	+	1		1			Ĺ	1	6	Ĺ	٥	1	Ĺ	Ţ	1	6 0		٥	0	1	_	٠	ŀ	ľ	H		-	-	н.
		Tegas	97 (10 A) 3N	6.0	950	9970	91'1	1971	50	10	071	100	10	880	9,0	60	1"1	41/0	3	680	60	033	0.7	10	OYO .	60	60	071	410	60	0,19	480	0.55	0,82		97		0.72
			\$1.52KB	μŢ	81	1.76	161	9.7	27	331	131	87	360	91	421	Q 7	#1	23.1	100	97	10	27	950	901	23.1	97	1731	371	41	97	11	=	5	101		1 10	2	860
	lembro a dgestide	ž.		101	977	33.0	946	461	117	0'61	27.5	117	9,01	177	24.4	21.8	567	577	-	38.6	107	992	24.2	897	16.1	1,91	28.0	300	187	24.6	23.8	10.8	10.0	24.4		45.94		18,98
	Benke	ži.	1 S	266	101	313	011	019	47.5	197	191	400	388	111	320	355	181	101	175	17.0	101	373	320	271	333	980	192	177	94	352	340	371	144	370		68,03	9,00	38,07
		No.		989	616	652	523	4479	19/9	\$179	113	153	159	1179	6,41	1,1	619	986	966	988	039	146	10,0	603	129	2	139	313	109	9179	1,06	474	52	6,43		j-	¢	ů
		b Bedales Dgrsfée	ø	100700	100700	10000	10703	1007001	10700	1007001	1007031	1007001	10000	10701	500001	10000	1007001	1007001	1007001	100,001	1007031	1007001	100,001	1007001	1000001	400'00	1007001	1007031	1007001	900001	500000	1000001	10700	100,001		-	-	H
		T manage	13.6a	938	1447	183	111	0262	933	1150	2011	020	188	301e	111	990	201	1887	210	100		4611	1656	08%	н	1 1998	13.8	1825	0511	039	018	0130	919	1840	11	3100	2020	1997
	H	70 70 70 70	18	200	30	3.6	2 15	1 585	100	701	34 3	100	1 11	28.1	2 41	22.	013	1 91	937	7 76°	197	12	d sto	000	4 (1)	P.	1 01	197	1 597	1 01	36	3/0	071	88'9	11	3700		2.51
		SST N	pSto	93.0	NIG.	3114	161	000	59.02	983	4156	0579	0196	1117	2600	6 0530	822	119.2	9(2)	3440	212	9040	7 93LL	059	0184	0790	8535	2910	2600	6.28	200	11.60	3662	1648		13652 13		3162
	8	8.W 8.X8	18	5.83	17.5	4.17	3'16	976	5.34	675	553	6779	1995	113	600	1979	191	1,15	91.49	1744	173	76%	1,7,1	651	10,18	95'6	97'8	9101	833	11.9	47.7	95.51	13.66	8,665		13,65	-	3,19
	is Rechan	Red		1048	100	60%	9336	9311	939	200	212	6243	200	200	000	1099	1039	1029	936	108	2020	1020	900	020	920	0200	1029	2100	0329	0379	0230	1024	1060	12/0		10448		3100
	Charliff codes Rech	WAS 3	eg/gs	2046	1800	1500	1434	1100	0011	1100	505	833	0001	1000	0001	035	1000	105	936	203	105	1000	1000	1100	1100	1100	1001	035	0001	0001	911	911	1300	1400		2046	100	900
		WAS 2	45.50	4302	1007	92.0	101	1007	930	120	1057	1304	9000	1000	9006	1057	1057	130	380	2403	2007	2400	180	120	120	380	120	220	2400	280	280	180	1301	1301		4302	1987	130
		WAS I	rggs	9377	900	0011	103	1000	930	937	2002	10.02	93%	00X	000	93%	OOX	930	935	2000	2000	108	200	OOX	000	993	0317	92%	200	038	OOX	000	933	1100		002	70	936
	H				Ľ	Ē			F							F		ľ	F			ľ	ľ			F						1	F	t		_	1	ī
	L	Rajo Beckedali	0	=	Ē	28	25	91	96	01	01	101	35	N	28	9.	Œ.	66	26	3)	Oi .	200	94	so .	OP .	8	17	15	16	09	20	11	8	9		Ξ	F	Ä
		Total		348870	11000	353655	348810	101111	348854	34833	378976	111111	15801	23211	410001	100453	30,1168	CRACK	155841	300010	10001	100046	154833	25.829	11001	158233	110014	102001	200756	225721	24077	11111	21811	192291		353055	28/8/48	19993
			OFFIRST	\$65	417	933	611	889	6443	447	182	776	448	557	147	990	788	1998	419	918	599	613	513	113	933	970	192	165	200	8.1.1	1112	tin	166	692		165	653	417
			SST(gb	7.43	6,11	480	17.1	8,76	600	583	1.40	1879	849	583	1979	683	571	11.11	8,477	559	8.13	8,002	10,9	1979	10.03	0001	11'6	11.83	838	10.38	1678	23.4	6.14	9,38		11.83	878	1,74
		RAS3	4.5		Ι	Γ			Γ				Г			Γ			Γ			Ι	Γ							Г	I	I	Ι	Γ			1	Ī
			rg,çu	68730	10399	TOMO	91999	11900	67,000	68172	01122	97722	10,03	31999	91,829	66542	\$1900	18979	13379	11/05	511333	86133	56510	4100.5	19297	10118	6088	6TT55	68343	95559	09309	Garan	67858	121193		6/8/58		19291
	reado		Q81,488	3.12	187	2,16	1,10	907#	976	2,5%	27.65	3,43	2355	101	481	4,43	167	4,42	9779	6115	0.82	15	976	1777	8,10	5,82	5.02	6.16	600	5,75	3.56	111	100	5,70		8.20		6119
	Chefficables Referrable		S (FFLSS	400	127	3,13	1,56	5975	8,78	3.58	3,43	4,36	3,62	3.81	2,42	5,65	879	500	5,75 8	120	071	481	1979	198	10,40	1,50	019	184	1,83	7.45	101	0.74	-	1,31	н	10,40		120
	Chalika	B362		65333	0000	2007.3	58650	10(4)	1000	65580	85789	87780	05980	91889	11170	9830	85929	87939	1000	1993	26019	64343	99179	65016	25000	50.11K	05166	i	l	İ	t	t	t	İ		20073		0576
			45.50	9388	98(4)	1113	161G	1803	5110	659X	2016	21439	8198	6916	11103	9830	12029	1803	2004	5119	9166	1809	2008	1110	11110	5591	8743	58(4)	001/00	98 box	20439	1441	5	516/E		11461	2017	38743
			(13)188	17.0	91	101	4.7	11.1	2	118	4.70	4.70	35.0	93.5	4.00	3.00	0.9	0.1	8	11.5	11.7	2	3.5	11.5	12.5	28.0	68.5	1176	9.9	89	2.0	97.0	199	2110	11	9,31	28.0	4.5
			SST (FR SS	01.	*	16	11.	187	5	107	100	07'6	907	747	150	-	707	1979	5	45	75	95	107	913	6701	197	91.	950	18.	113	907	100	953	873	H	20,50	4	2,17
		1990	П	10056 4	10	7.7	3 18	19	724	\$ 100	5 82	1 111	81	9 88	9 1,0009	- 29	12	0 88600	99	9 93939	\$ 22519	70	1 50	8 76	16337	10	1.11	37	-	ľ	ľ	ľ	ľ	-	11	T0701 20		35971 2
			19,00	1656 TO	12044 10021	34 100	11 658	2000 55	53.	T00 T000	63936 TECES	10074 100	7.4 6/7	60079 STOCKS	202 8000	45 49X99	19 19319	H	35 666	91009	19 95339	11 61304	09 45145	37 11	10013 100	90	38 11	19	14	96	5	SVAVA	9533	10241	11	+		3.011
	H	2	_	1.8	-	13	60	66899	(8)	100	100	101	0.100	A9 1	00	100	19 1	1000	266	109	577	17379 - 61	98	105	377	28	1	19029	0.000	100	100	3	0	100		102351	100	N.
8	-	F F			ľ	_	*	Ĺ	ľ	1	1	4	Ē		1	ľ	1	_	ŀ	_		-	-	7	3	-	2	7	-	2	ľ	ŕ	ľ	~		~	-	H
ERO 3	Evadends bobs	Victorium Lobo spesalores Flase I	02:513	1001	10998	9101	1001	1601	1098	8601	9311	1012	6931	1601	1601	1018	6931	1001	1001	6001	13/4	1001	99.5	166	245	655	661	166	0.6	1101	44	545	553	226		931	1001	833
A - EN	Ē	_			L		9	_				L	_			ŀ			ŀ		1	L					9	1		_	_	L	ļ			_	1	1
INZAI		Stifes Abuse erado	.0	88,31	810	17.79	183	0708	80.6	14/41	458	93,78	67,73	16'61	61,75	(6,6)	176	1117	1,18	10,08	13000	19,58	18.80	78.8	87,1	180	140,4	142.8	100,13	106,7	130	181	185	71,19		142,83	92.0	61,74
arro.		durantele lodos spresalos	ta3	3706	3665	3706	3316	3311	1691	3316	3255	30.00	28.8	1996	3118	1691	3316	3311	3316	3706	302	377.0	3706	3316	3316	3710	37.06	3710	3316	3706	3706	11.00	1100	3706		370400	167.31	2828,55
(VDV )	ke 7,2	Na ficado Ye hee to de e do		970	9	92	970	90	2	900	17	2	- 5	18	80	2	900	90	90	900	970	9	92	970	900	92	900	970	90	90	92	98	9	970		n	4	000
AMPL	Espe sader T.	M E S E S			ľ.	F		L	ŀ				H		l	F			F			ŀ	F							ľ.	_			01		-	4	0.00
LIBE		m mathematolic	13	3.5	8	2	9 0	0	8	70 8	70 %	0	8	73 0	8	8	3 0	8	9	9	7 1	2	8	1 1	1 00	10	9 H	6 6	8	6	0	-	0	079		42.7		ш
PÁGINA 1 NNTA EL SA		d de aqu		8.	Ę	9	9 0	1	× ×	8 8	3 7	4	8	9 0	3	8	9 8	3	8 8	8 0	3 7	9	8	3 9	4 5	9	8 9	1 5	9,	0,	9	4	9	XX.	1 1	10 6	31.88	23,60 5,97
PAG	L	Lops	ŭ.	A	F	n	α	4	n	×	ss .	D)	8	×	75	n	11	75	G.	12	14	ŕ	Ä	×	R	8	LP .	10	2.	8	3	8	ľ	R		48.20	+	Н
IDOS		Schilles Irnace radio		58,84	80,16	09'88	0.711	58.42	158.29	10'65	8775	60'65	63.55	5505	19/0	11,58	1000	05'88	18'83	80'05	17011	09/85	56,42	2,001	101.94	146,78	142.83	158.25	MIL	MAIL	05701	1996	0.101	80'05		358.20	10631	688
ESÓL		No de la compansa de	tra3	3467	1401	3	to	10.1	-	to	021	860	2.5	1991	313	-	10.0	10	10	70	101	100.0	3	to	10.0	70	ż	to	70	3	70.	1.004	2	1201		почло		3891.56
DADO	1.1	ope and	Н	31	Î	^	3	H	Ĺ	3	1	-	-	Н		î	Н	4		3.	1	⊦	^	3	Н	1	3	3.	^	0	ľ	H		⊢	Н	4	× A	200
I SO	Especiator 7,1	Attern cherifical subce rounto de bottos		00	9	90	00	000	90	0'0	10	00	1,2	90'0	0,1	90	000	900	90	000	00	970	90	00	000	90	00	000	000	90	979	000	979	00'0	H	+		970
NCE CC		nabananfo2	13	18.0	2	161	171	130	90	111	170	13	23	4.8	0,4	3	0'6	0,7	100	2.8	01	ž	3	10	0.0	120	13.7	13.1	-	23.0	107	2	=	0,7		30,70		970
BALA		operands plf		5.73	3.83	0	609	agra	30'9	165 1	266 9	188	19,8	ayy c	188	188	666	096	975	1975	15,719	9,60	5,63	5.71	10'6	1	35'6	1,5,719	666	909	1000	N. Call	20.5	18,87		00		5.65
PÁGINA I ANEXO - BALANCE CONSOLIDADO DE SÓLIDGE PLANTA EL SALITRE AAIPLIADA Y OPTBNIZADA - EVERO 2022	L	3	18	127	٤	, a	187	20.0	Ë	317	187	337	ii)	317	1/4	ŕ	W.	200	É	, X	7117	ĺ	2º	787	×	44	9	- 25	100	36	É	Tig.	ľ	30,4	H	1220	+	31,60
~	-	Bernocide 4,5 - 4,8	çu	661	Ę	199	991	05	122	181	321	1111	357	151	101	118	121	481	15	955	11		l		316	127	347	111	88	981	227	4	Ξ	88		550	100	í
	edeln Fare	Byrac d če. 4,1 - 4,4	co3	255	187	055	120	177	300	233	007	906	335	961	491	100	307	336	100	1918	- 61	Ī				٥	307	0.1	131	0.0	111	=	16	3.1		9.44	×	٥
	Brankde		60 60			-	6		_	+	0		8	9	H	-	1	0	154	1361	Н	H	H	Н	9	-	7		-	9	869	ŀ	L	142	l	-	-	н
	L	TOPL	70	45	-	93	67	1	333	38	182	13	858		11	38	332	67	ř	ш	22		L	Ц		321	553	2.8	20	18	9	Ī	95	ı		1304	9	L
		Benoice 583	to a	1563	Ē	1831	1111	1184	1158	1767	1181	6611	1661	3366	1983	1683	0591	1768	1134	1891	1632	1886	1576	1961	1111											3366	1616	180
		Benoide 58,3	çu	482	010	568	151	1777	1000	2000	959	139	991	196	11.1	51.0	119	179	141	01.0	148	110	113	111	011	0.54	110	1113	411	988	489	9	9	9.6		861	500	180
				Ц	ŀ	ŀ	Н	L	ŀ	Н	Н	L	H	Н	L	H	_	L	ŀ	H	Н	ŀ	ŀ	Н	Н													H
		Barne dide 58.1	çu	1527	1653				1564	0991	1629	1981	171	1883	1673	1673	5191	1116	1150	1807	6991	1980	1550	1991	2151	135	1111	6551	1456	1469	1500					1853		
		£35.M	71	179	40	ś	651	90	è	90	171	77	9,0	17	81	-	131	80	ž	610	177	è	9/0	90	474		98					-	3	671		33,57	4.55	0.53
		TSA	71	879	3	1,1		01	L)	10	071	77	8,7	5'5	4,7	800	578		ŝ	80	61	00	1.0			34,2	179	1767	172	2.8	33	70	20	970		33,67	8.9	0.0
		l'85.M	3		1			10	9)		18		1.5	051				40	11.8			401			17			655		58	ш	90	9.0	1.1		33.63	8,40	850
		TOLOI	rg.uog		1771		179	472	101	971	8'4	90	22.3	1772	6721			1/8	21.2	611	411		11.7	81		57.4	17.3	179	7'7	679.1	107	1.7	-	5,4		97.39	10.75	110
	n Fase III	Beración Tod	tra3	4571	9006	Secti	47.34	2714	0/49	11.61	1995	4542	5434	9119	54.55	54.85	22.61	33.65	9300	52.99	1831	N.77	48.00	5857	98.87	1141	4165	9119	4355	9359	4575	31.00	21.86	2840		49,40 63,00,00	4640,11	2817.88
	Decadades Fase III	H 675	13	10	15	76	111	T/D	200	SID.	11	19	97	IV	93	5	222	1	5	60	101	1	23	NO.		90,9	52	61	177	13	184	91	(8)	SED		9		
		E.	ĺ	_	-	970	1761	19.	Ļ	10	60			6	100	Ļ		2	Ļ		100	Ļ	L		Ц	5	60			Ļ	Ļ		1	1.00		59	٩	Å
		\$1.5	1 th	Till I	ľ	ľ	161	ľ	ľ	Í		ľ	ĺ	ĺ	ľ		11	0	ľ	ĺ		ľ	ľ			48.6	Í	12	ľ		ľ	ľ	ا	ľ		48.64	2	0,44
		,			ž	376	\$'61	100	9/0	670		1.3	2.5	60	1.50	9/0	163	171	-	1.1	6.0	197	17	60	H	52.0	13	33.2	1.81	2.5	2	-	1	100		52,58	J	
		4.18	1.8	Į		Ĺ			Ĺ	2				L		Ĺ	Ų	-	L	93			Ĺ	4	Ц	3	Į	Ų		Ĺ	Ļ			L				
		57.3	13	117	0,7	6,0	1719	î	6.0	ď		4.8	ľ	107	8.6	6,9	36.6		ľ	ď	6	ľ	13.8	40	0,1	46.9	957	0.85	ľ	ľ	ľ	0.8	ĺ	0,1		10789	11.84	0.0
		,,	H	8.6	31.0	50	104	10	531	101	13.1	1,4	461	28.7	14.0	-	42.5	171	16,0	16.4	1.4	25.5	2	410	17	47,3	006	683	6,1	23.4	28	1	-	12,1		٥	J	d
		11.7	13				L	L		Ĺ			Ĺ	L			L	L		Ĺ	L			L	Ų			Ц			L		L			68.10		
		57.0	1 th	12	٦	ő	183	101	ő	90	50	12	۳	111	13	6	25.5	2	ľ	۲	0.8	ľ	٦	0.8	60	455	2	5.5	63	ř	ľ	0.0	أ	ľ	Н		4.08	
	ŀ	R da	۱		-	-	L		,	-			0	Н		_	Ļ		Į.			٥	0	L	Н	-	Ļ	ļ	,		-			31	ш	radistrate 4	1	90
		ž		Ц	Ĺ	Ĺ	ú	Ĺ	Ĺ	Ц	Ц	Ĺ	Ĺ	1	Ĺ	Ĺ	1	Ĺ	ſ		П	ſ	Ľ	1	1	Ĺ	1	1	Ĺ	Ĺ	Ľ	ſ	Ĺ	Ľ	Ц	ń	1	ř

Anexo Cap 3\_ 7 b balance consolidado de sólidos planta el salitre ampliada y optimnizada - enero 2022

יץי	'	11111			4	_	٠,	_	'	٠	4	•	_							•			•	_	•	•	•	٠	•		4	_	•	J	4	۷,
	Ī	reducción biogas	pregold be	5000	8166	2005	1059	6312	6000	-	6234	5035	1095	924	2609	0009	2005	9619	380	665	980	27	979	107				970		51.00	0140	9619	906438	7470	4337	1005
		1 2 E	600 003	22,1	22,1	22.1	Ц	26.1	24.7	L	10.1	19.0	27.2	24.5	9	9 797	35.6	24.5	24.5	9 577	34.0	23.0	23.0	23.0	9			2	1	274	274	24.5	J	30,00	34.7E	27,12
		Shimas Imación de MV		52,00%	26,31%	21,79%	551799	61,70%	45,50%	62,93%	48.04%	5470%	45779	25,59%	68533	84633	60,24%	00,400	49,765	9,1777	47.575	58,460%	44,61%	10,72%	25,16%	20,14%	21,04%	45,150		44.400	10.67%	2007%	1	190	0.48	0.11
		AGN / I		0.12	2170	2170	н	0.15	910	٠	0.12	0.12	0.13	0.13	110	1170	010	110	110	1170	210	0.12	010	6000				910	+	+	+	+	4	613	113	6000
		Youngo Cacos	1883	200	200	200	22.40	200	3840	22.00	250	27.70	200	2020	300	07%	0747	2380	300	900	2380	350	350	340	COL		2000	New Street	000	2007	070	3100		316000	2875.4K	270000
			Paled	0,00	2010	80	35'0	80	100	80	90.0	0.55	25.0	0.38	800	1970	800	96.0	0,68	9910	89.0	98.0	0.00	900	200			9 10	1	900	K	0.00		0,78	0.68	870
		Residente de Elemente	PYPACEL	0,76	617.9	91/0	σεσ	0,75	0.776	0.76	0.70	0.73	0,77	0,76	0,76	810	0,77	0,78	0,777	2470	0,76	0,76	0,17	0,19				100	0110	0.11	H	0,76		080	0,76	0,10
	ligator 72.5	ST.	18 18	6 11.2	771 0	711 7	11.2	7117	0 12.6	4 10.4	0.11.0	4 10.2	10.2	2 11.8	911 0	771 7	4 10.6	96 9	4 11.6	711 2	071 8	911.0	117.3	14.3	93		9	0 100		1	170	23.2		0.24.20	27.12.47	1760 970
	dip	ž.	.0	7,42 BS	7,40 19,	7,19 19,	7,44 19.	7,48, 23,	741 30	7.55 19.	7.58 19	7.59 18	7,51	7.49 30.	7.56 30.	7.51	7,59 BK	7,40 17,	7,18 BK	7,155 BK	7,48 79,	7,53	7,58 30	7,58 30	101	92	0,70	100		110	111	107		750 33,	7.53 20.	7,55 17,
		AGV	ydio	337	346	338	330	400	100	120	3.86	3.76	325	36	300	9.8	380	906	300	306	60	550	366	10	2	9	4	1		3.8	4	311		409,00	329.61	272,00
		Depavdénica	Kg SYrolon	1670	00'1	90'1	957	pt.	9810	1.00		22.0	0,58	0610	9810	371	35.0	= 1	1,17	871	=	1,00	1, 13	0.1			91	9		100		9.1		25.7	1,07	22.70
						L	H		-			L	_	L	L	L	L	L	L	L	L						1	1	1		ļ	L	l	L		950
		Carp vélnia	46.57/m3.48	1,10	1,33	171	Ц	2,12	100	ļ	ł	860	-	1,1	-	71	-	1	2	91	-	87	1,4	87	1	+	2		01.		071	ŀ		2,5	Ц	Ц
		Distribución di Carp.	,	25,85%	25,89%	26,25%	3,22,07	37.86%	3,356	25, 876	25,38%	28.11%	25,00%	28,31%	25,05%	25,05%	29,21%	35,800	80.00	20,30%	82.5	9.11	N. 25%	e Li	100	N. M.S.	N.N.S	N. Mar	20,000	0.00	0.00	20,45%		604	0.19	0.25
		Digway C	45.00	079	079	079	029	231	988	508	472	473	105	995	838	075	537	996	996	096	5772	87.8	878	87.8	E	7		200	900	975	0/4	025		029	557	472
		housedon p	rs 3 Bogs si	1111	6419	1200	67101	000	7240	0192	0432	9050	2014	5822	9686	1665	1288	1968	6879	1234	0951	8330	\$610	0110	17.55	9	1040	14141	1000	9810	wood	10001	178117	14467	9768	\$614
		4	605 (03)	23.7	23.6	23.8	Ц	198	24.8	Ļ	101	101	27.2	24.0	092	197	263	181	348	24.5	13.9	682	687	23.0	27.0	4	AV.	3		170	170	Ł	4	3008	Ц	23.61
		Strance Serection de NIV	,	40,000	Н	H	Н	4	87, Yes	+	2.30	St. 10%	2, 800	927	9/6/8	58.9	0,75%	8.88	8.66%	0,989	82.5	4,49.0	9,9810	1.01%	58.7	+	40.00	S. Care	100	20.30	╀	٠	4	880	н	570
		ACK IN		0,07	0,133	8 600	Н	0,855 5	0.141	٠	٠	8 90 0	0,035	O, M2 3	8 600	0,02	0,03	8 100	8 71170	0,142	80.0	\$ 53 Y	811.0	1110	97.0		9	+111	٠	+	٠	٠		0,16	0.12	010
		Ab death Occol	plan	2720	2100	т	H	7	2800	t	t	2760	2880	2840	2840	3160	2780	3800	2840	2820	2840	1920	0367	9000	2000	000	OD S	+	t	t	t	т	1	938000	н	270000
			PYTest	190	690	150	190	950	028	850	190	950	550	191	650	750	151	090	191	650	390	391	190	164	000	100	200	100	200	190	190	990		000	Н	228
		Restriccto de Binicados	Prekut Pa	o,Te	2 5470	0,74	Н	+	0.76	+	+	7.7	11	0,76	94	3 84	11.	3 84	3 44	2.5	92	9.1	3 44	61	ř	+	000	+	ł	╀		0,76	ł	080	Н	0,00
		à	gt Phi	0,0	B.2 0.	0 9'11	0,2 0,	_	M.S. O.	0.2	L	0.8	10,6	0,0	0 771	0 70	10,2	0 908	0,2 0,	11,4	0,4	0 7'0	0 9'0	14,4	H,0		1	1	1	1	0	₽	J	16,40		1780 1020 0
RO 2022	dgcace 72,2	st	13	961	161	202	20,0	+	201	212	30.6	19.4	101	161	7'61	2'61	17.8	17.8	200	101	101	961	18.8	22.4	21.4	100	707	100	200	316	108	24.8	1	3600	П	н
PÁGINA 2 NEXO - BALANCE CONSOLIDADO DESÓLIDOS PLANTA EL SALITRE ANFILADA YOPTDUNZADA - ENIRO 2922	0	E		7,37	7,35	17/1	7,18	7,50	7.17	15.7	1742	7.52	7,46	127	574	7,46	7,87	48.5	18.1	7,84	7,48	954	727	7,59	T.T	200	2	97/		ř	Ē	17.7		1.75	Ц	1,31
INIZAD		AOY	filler	346	360	61%	426	418	105	340	337	347	359	201	196	488	341	865	505	109	676	785	878	765	177	3	210	2	911	111	i	323		42600	353.45	31100
YOPTE		ap viasio	KgSVtsAda	980	160	197	174	13	000	100	101	0.71	0.58	860	180	1,12	680	901	911	1,28	1,12	101	1,12	011	22		QT-1	200	200	001	100	001		15.1	100	0,11
LIADA		videnia O	Kg STrolota K	1.13	1,25	15.1	191	200	1.13	177	38	2670	×-	61.19	-	- 77	ž	99	05	99/1	971	75	571	65"1	66	100					071	-		3706	1,59	1470
RE AMT		80	KgSI		L	L	Ц	+	+	ł	ł	H	-	L	1		-			ŀ	H	_	1		1	+	+	+	ł	ł	ļ	Ļ	1	H	H	H
LSALIT		Distribució Onga	,	24,17%	10777	517772	23,01%	23,71%	25,11%	25,14%	24.46%	24.84%	25,00%	24,50%	57157	55052	28,36%	527.18	1485733	50,50%	S2,000	51176	165775	24,17%	34,59%	Sales .	21212	21,18%	1000	1077%	107701	20,43%		0.05	0.19	0.23
PÁGINA 2 ANTA ELS		DipotorB	egoge	680	186	575	532	999	584	205	559	468	105	188	527	620	125	888	999	096	818	848	818	87.8	575	212	212	200	000	0/4	0/4	025		185	545	997
IDOS PI		Pecha		-	2	Y	7	ş	9 1-	×	0	01	=	12	1.8	71	18	91	1.1	18	10	10	21	22	23		9	gr as	2	10	Ot.	31		×	16	-
DESQF		Profit of 6n biogram	руквой си	5670	\$868	9889	6405	5211	5774	2646	5587	1007	4337	4430	0515	9906	4100	578	3.0	08	908	188	693	99	2	4	90	917	ŀ	N N	F	100	82364	6406	2689	194
DAD0		ś	dis	22.4	22,5	23,4	23,1	10.8	25.2	27.8	10.8	191	27,2	25.0	992	592	138	343	229	141	1/13	Ī			İ	ANII O	17.0			000	710	188		342.86	15,77	2,11
IOSNO		Bromoin Remotion GeMY	- 5	58,798	92519	45,67%	92039	53.54%	15.1%	1000	66.936	43.83%	1,000	1989.2	187	983	146.7	1070	9223	9613	1017	23.3	64.108	1001	4	40.5 FB	W on	1000			101.55	45.576		190	048	110
ANCE		ACN'TAC Ro		0,127 59	9 65170	9510	Н	+	0110	t	ľ	9 65170	3,166	S 081X	.7 94	9 91	981)	78	5 61	7 44	98	15	91	\$ 01	2	+	ł	+	t	0110	t	t	1	0,19	615	0.12
0 · BM				H	H	۲	Н	+	$^{+}$	+	+	H	ľ	F	10	100	Ĭ	100	100	100	100	10	100	13	3	+	+	0110	$^{+}$	+	╀	╀	+	H	Ц	Н
ANEX		Andreiga GCDS	Lilia	2840	2840	2800	2700	2780	1800	1940	2840	1920	2940	1910	1920	0957	9000	9000	0006	0818	3160	3540	3300	3400	3480	2440	AZM.	2000	0011	1440	11/10	3460	1	348000	Н	20000
		Residence de Elementes	PYTest	0.57	55'0	2910	Н	+	900	╀	0.55	0.62	0,68	0,57	200	25'0	9910	8.0	1910	(P)	00'0	0.68	0.56	0.05	+	+	+	8 10	+	+	90	╀	1	0,73	н	0.55
	Specific 72,1		Philips	0,76	8470	92/0 1	000 5	5 0,75	0.76	0.76	╀	0.73	5 0,77	0,76	9470 1	81.0	1 0,77	0,78	110 8	2470 5	9470	0,16	0,777	0,79	6		000	4	0,00	011	110	L	4	080	н	0,00
	dge	8	13 18	184 10.4	86 181	711 881	127	10.8	188	144	10.6	121	117	117	721 000	701 081	124 145	188	711 751	127	771 177	321	711 801	187	120	+ 2	186	100		174	NO.	186 120	4	24,40 17,60	9.58 12.00	17,40 9,00
		Ę.		1,40	7,17	272	57'4	7,17	7.41	1	074	7.43	19'4	1,36	2.50	8874	7,88	1,56	1874	77'4	357.4	101	1,00	7.03	TV.	SW.		W.	1	180	71.1	1,72	1	1X1	121	7,17
		HECOGED	plica	340	966	411	281	910	456	472	199	199	488	828	515	775	196	988	175	196	885	057	167	476	200	100	4	244		400	1	44.5		98800	475.74	360,00
		Grysvefenica	Rg SVest, da	140	5970	5910	0,70	030	0.16	150	2970	1970	89'0	0,48	040	850	603	9000	1000	010	600	000	000	000	900	900				110	710	6118		180	0.28	000
		Organdienies G	Mg STricklata N	П	Г	17.23	98	90	110	31	12.0	0.00		1.38	80	77	*	a	94	**	œ	0	00	000	8	9	N A	4 :			,	la,		15	0.73	8
		ve Orbi		Ц	L	L	Н	4	+	Ļ	ı		ı										ш	ш	П	П	п	П	1	1	L	L	1	*	ď	0
		Distribución de Carpa	*						24,71%		24,789	24,95%	25,001	24,819		10577	13,569	2,589	9458	46.05		0.14%		0000	0000	400	2.468	800	100	1,000	x ton	8,70%			910	
		Бірькел	190500	613	219	\$85	105	199	245	107	199	470	105	646		418	249	07	09		08	2	0	0	٥	ON .	91	941	981	971	041	091		919	288	0
		Differencia was y mas as	10.700	-33	-12	11	89	-80	300	122	316	310	32	300	190	536			10.	913	811	99:	16	200	4			om and		111	44	90			38	1122
							Ш		1	L	L	L	L		L	L	L	L	L	L	L	Ш		Ш	1	1	1	1	1	L	L	L	J	L	Ц	Ц
		IID TOTAL	"MADE							2014	0830	0122	101													T									SAS	
		COCCUTOD	10000							1011			L			11.0								918					п	1100					0011	
		OKCRTZ01C	707510	1570	6711	1341	1407	0911	1268	54.11	1377	1450	1253	1304	0921	1901	1882	1216	1221	1215	1811	2061	7571	1071	1233	021		927		7631	11148	1241		1450	1283	1150
	saden	060602018	10000	1362	1111	1282	1011	1163	1242	5411	Ī	1991	1240	1388	1200	1503	1419	1241	1228	1881	1134	9181	1186	1314	113	1040	I	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	1	1991	1263	1040
	Messa Experadoras	жентот се	10/00									14.50	116	1330	219	96			İ		11.00	н	H	Н	4		+	+		1100	100	120		ш	011	ш
		OCCUTODD OCC	ngoga m									t		1901					981	911	6001	2111	133	1225				+	T	0141					1007	
				Н	_	-	н	-	+	٠	٠	۰	۰	Н	Н	Н	Н	Н		ĺ	ř	Ė	Н	н	4	+	+		L	П	L	ш	П	⊨	н	н.
		118 000@T101C	10/00	Н	Н	Н	н	+	+	٠		1375							L	8	8/6	H	Н	1274	+	-	-	1	I	1301	t	t	1	⊢	108	н
		0.000001018	10000		1592	1209	1376	1076	101	Ī	1011	1364	1246	0111	\$601	686	1106	1181	1103	1181	1100	1831	7651	1274	92	1	1	ļ	1	1	141	10%		1071	1159	331
		0008T101A	100.00	196,59	l	l	U	l	J	185	1360												U								l			1860	100	110
			Ī																										•	1	•	•	-	_	_	_

Anexo Cap 3\_ 7c balance consolidado de sólidos planta el salitre ampliada y optimnizada - enero 2022

	_	•	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
	1			0.3	0,3	03	03	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0.3	63	0,3	0,3	0,3	0,3	03	0,3	0,3	0,3	0,3	03	2 : T	3 5	T	33	3 3	3 3	) (	3 3	3	0,3	1			
		tiempo de retencion de los digestores	diss	22.9	22.9	233	23.8	28,4	249	25.6	27.2	29.5	29.1	27.2	248	262	42.2	46.2	103.2	803	67.5	1,29	369	36,4	105	858	070	200	740	49,9	1	43.7	545	43,3		41.5		
				45.36	4503	50.36	45.89	39.38	54.16	42,14	42.96	37,11	36.46	38.91	43,37	40,66	40.09	35.45	30.30	32.89	32,42	35.27	32.79	33.36	33.70	34.99	33,00	34.00	30,00	30.99	34.03	30.40	420	40.57	Ì			
		GregaSTa de shidrancion	Tad	37.82	48.02	43.40	48.78	68.63	34.02	40.02	49,33	43.46	35.21	34.54	43.81	36,98	42,21	31,63	30.46	40.12	48.04	36,83	32.40	33.10	34,44	40.71	20,74	00000	30.03	48.32	4403	30.30	43.63	40.78	1298,78	69	42	
		CargaSV Eliminadas de	Tad	26.13	22.68	29.98	50.54	49.77	27,56	16.04	24.05	17.36	(8.8)	28.82	27,00	23,36	96'91	24.18	27,78	23.24	22,05	24.39	21,56	5703	97.7	27.40	200	0000	6000	13.04	200	97.07	77.77	18.10	1		L	
		Jugasv Elli	Tad	L	52.80	Ц	_	Ц					39.42	48.48	L	45,60	82,10	43.17		48.95	Ц	Ц	4	4	4	18.54	1	1	1	1	1	1	1	44.90	Ì			
		Cargo	Tnd	63.95	70,70	П	Ī	118.40	61.58	56.06	73.38	75.83	53.81	63.36	70.82	60,34	29.16	П	58.24	63.37	70,10	Ħ	1	T	Ť	6814	Ť	Т	0000	03.30	01.34	6334	1	58.88	1	Г	Т	
		SWST		0.76	0,75	0,74	0.80	0.75	0,76	0,73	0.76	0.79	0,73	0.77	0.76	0.76	0.78	0.77	0.78	0.77	0.74	0.76	0.76	0.77	0.79	0.27	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.77	27.7	0.76		0.80	0.76	272
		MANTOS	metros	10.0	0.02	000	000	000	0.07	000	0.56	010	1.34	0.08	0,76	0,08	000	000	000	000	0.04	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	0000	000		1,24	0.00	-
		Eficiencia	35	34%	43.6	58.86	63%	36%	3956	39%	43%	51%	17.96	30%	30%	918	9409	36%	94.19	47%	42%	52%	53%	36%	37.6	35.00	30.15	31.75	20.18	30.00	1000	30%	47.73	40%		0.63	0.49	
		ALK .	mgCaCOML	2755	2785	2780	2725	2775	2835	2850	2810	2775	2785	2855	2845	2855	2850	2880	2865	2880	2910	2900	2970	2990	2420	3170	2,000	2000	2000	3100	3133	3300	3150	3195		330000	2875.16	407.704
	RIDO	된	Unid	7.41	7,34	7,37	7.42	7.40	7,42	7,46	2,55	1,99	7.53	7.49	7,47	7,46	2,45	7,39	7.30	7,35	7,37	7,90	2,56	2,00	7,01	2,00	7.01	10.00	0.01	7.04	200	7.7	6,73	2.30		2.74	7.53	, and
	LODO DIGERIDO	W MV		0.39	0.62	0.51	0,00	0.57	0.48	0.62	0,63	0.63	66'0	0.56	19'0	0,0	85'0	00'0	0.58	0,64	0.62	19'0	0.59	0,00	0,00	0,01	0,02	0.00	0,00	0.00	0.00	000	0,00	99'0		29'0	0.00	and a
		N N	16	11.2	1173	971	671	9711	11.8	12.1	13.4	12.6	11.4	10.9	12.0	2711	11.2	971	10.5	12.3	9711	12.2	11.5	671	140	000	120	100	1	12.0	1000	120	20	14.5		15,45	12.18	
ENERO 20		T.S.	20	6'81	8.81	21.4	6.61	33.3	24.6	19.6	21.3	30'0	16.41	19.3	9.61	19,4	161	19.3	181	19.3	18.7	30.1	19.3	6.61	21.3	21.12	200	33.4	000	000	41.7	33.0	23.2	22.1		24.55	2021	
ZADA- E			P.	L		П		П					L	L	L	L				П		П	_ T	I T	I	I	I T	I T	I	I T	I	I	I			_	L	
OPTIMN		Producción biogas	m3 biogss/d						3	-	112	288	851	1195	1438	1229		Ц	1416	Ц	1374	1678	1516	_	1	1822	1	1	1	4	1	2002	1	Ц	37612	2418	L	
TVDA Y		% Efficiencia Remoción de MV	wip %														105,4	0'86	080	080	516	15,93% 80,3	52,60% 74.3	+	+	50,476 68.0	+	t	+	+	44,2479	+	+	3459% 57.2		0.69 ARRAS	0.42 74.90	
RE AMPI		AGV / Effe TAC Ren d													ŀ							0.15 1.5	0.12 52	0.11 28	0.13	013	000	0.00	+	210	+	0.12	+	0,13 34		910	L	
A 3 EL SALIT		Alcalinidad O.C.O.B	fgm											l								1200	1780	1860	1880	1980	1040	0000	0000	0017	2100	3370	2100	2140		2160,00	1966.15	25000
PÁGINA PLANTA EL		Renderiento de Eliminacion	Pvfirst																			0,73	000	0.71	and	0.90	0.00	0.67	000	0.67	(2)	100	+	0.68		0.73	₽	_
)L mos	12,5	SV Bindi	g/l Pvinicial											L	L	L						Ц	0.76		1	4.4 0.71	1	Т	1	0.70	Т	48 027	_	8.4 0.76		8,40 0,79	592 0.75	
DO DES	digestor 72,5	ph sr s	US US											ŀ	ŀ	F						8.2	_	0%	9%	7.62 88	900	701	970	200	901	1000	a a	7,71 12,4 8		7,71 12.40 8	7.56 9.57 5	Š
NSOLIDA		иду ндо	fgm											ŀ	ŀ	l						Н	+	+	+	200	+	t	t	200	†	2 000	+	27.2 7.7		308,00 7.	۰	
PÁGINA 3 ANEXO - BALANCE CONSOLIDADO DE SÓLIDOS PLANTA EL SALIFRE AMPLIADA Y OPTIMNIZADA - ENERO 2022		Orga volúmica C	Kg SV/m3.dia											l	l		0.28	0.24	0.28	0.29	0,33	0.33	0.33	0.37	0.36	0.43	0.44	0.43	0000	0.40	0.40	0.47	0,40	0,43		0.47	t	
0 - BAL		Jago volómica Car	Kg ST/m3.dia Kg											ŀ	ŀ	L	96'0	0.31	0.35	0.38	0.44	0,43	0,43	97.0	0.40	8.0	0.37	0.02		0.00	0.07	0.01	(9)	95'0		69'0	0.50	
ANEX			Kg ST											ŀ	_		H	Н	_	H	Н	Н	4	+	+	+	+	+	+	+	4	+	+	Н		H	H	
		or E Distribución de Cargo	th th														9/3/01/2	Н	-	819%	Н	Н	+	+	+	1203%	+	$^{+}$	$^{+}$	13.00%	+	13.19%	+	13,04%		0,14	H	
		s Digestor E	m3/dm b/sm	_							_				L	L	(6)	(0.1	190	H	Н	Н	+	+	+	200	ł	ł	ł	790	+	+	+	2.40	27	245	H	_
		Producción biogus	diss m3 biogss/d	23.4 5649	23.7 5466	Ш		Ц			27.0 5895	29.1 9970	29.0 57.18	27.2 \$460	24.8 5408	25.9 5298	26.4 5556	Ц	25.1 6088	Ш	25.7 6358	Ц			Т	26.0 0148	1	1	l	243 6030	1	1	1	24.5 5927	184762	29.06 71.87	L	
		% Efficiencia Remoción de MV	3	54,49% 2								48,11%	36,13%		50,42%		99,16% 2		58,11%							20000								42,62% 2		0.71		7
		AGV /		0.12	0,12	0.12	0.14	0.12	0.13	0,13	0.12	0.12	0.12	0,12	0,11	0,12	1170	0.10	0.13	0.11	0,11	0.11	0.10	010	0.94	010	000	+	100	010	010	0.00	600	0.10		101		
		Alc dinidad CACO3	1 mg p	┞	H	Н	2740	Н	_	Н	_	Н	L	L	2800	L	Н	2980	4	Ц	Н	Н	4	4	4	3000	+	+	4	3000	4	3180	+	3180		3180,00	-	_
		Renámiento de Eliminacion	icial PVinal	620 9	090 8	Н	+	Н	-	Н	-	990 6	19 0.64	0.54	19'0 94	H	Н	Н	-	Н	4 0.57	Н	+	+	+	000	+	+	+	+	+	+	+	8 0.65		0.70	-	
	r 72.4	SV Ren	g1 PVinicial	11.2 0.76	11.2 0,75	12.2	911	12,4	12.0	12,2	13,4	981	12.6 0.73	21	12.0 0,76	11.2 0,76	0.11	11.2	10.8	13,4	011	12.0	17	117	0 1	13.2 0.70		7		6 0	1	100	3.0	14.0 0.76		14,00 0,80	12.11 0.76	
	digestor 72,4	FF SI	16	7.45 19.0	7,44 18.6		7.42 18.4				20.2	7.65 20.6	8,8	7.56 20.6	976	7,53 18.2	7.50 18.8		18.0	19.2	19.2	20.8	19.8	13.6	0.12	7.65 21.0	010	000	000	7.38 21.0		7.72 20.0	7,078	7.70 21.6		7,74 27,20 14,00	7.55 20.12	417.4
		лду СИВСО2Н	fgm	336	Н	Н		П						334		Г					319	П	278	1	787	т	Т	Ť	200	Т	t	304	П	319		377.00		
		nga volómica	Kg SVm3.dfa	0.87	0.93	960	1,43	1.67	0.85	0,27	1.02	1111	0.72	0.88	860	0.84	1.12	160	1.08	1.12	1.17	1.03	0.94	1.04	1,02	071	100	071	000	100	100	607	1,08	1,00		1.67	1.04	
		Crego volúnica Corgo volúnica	Ng STm3.dis Ng	114	125	130	1.78	222	1.12	1.05	135	01/1	860	1.15	1.29	111	1,44	211	138	1,45	157	135	124	134	671	1.46	170	1.40	1713	130	1	77	140	131		222	137	
		Distribación Carga de Carga	% NgS	24,46%		Н	_	Н	_	Ц	Н	25,38%	25,11%	25,00%	3499%	L	25,03%	Н	32.52%	31,33%	Н	Н	4	4	4	3039%	+	+	+	31.176	4	4	4	30,43%		0.33	t	
		or Distrib		H	H	Н	-	Н	-	Н	_	Н	H	H	H	H	Н	Ц	-	Н	Н	Н	+	+	+	$^{+}$	+	+	+	+	+	+	+	Н		L	L	
		Digestor D	m3/dla	38.7	980	573	267	:9)8	361	\$65	308	47.2	473	804	263	529	520	530	546	535	534	532	334	230	â	610		070	300	9	000	98	300	360		587	688	3

# ANEXO - CUADRO RESUMEN DESHIDRATACIÓN POR CENTRIFUGA

# Anexo Cap 3\_6 resumen deshidratación por centrifuga

		POLIMERO:		ГОРО	0			B	BIOSOLIDO		
FECHA	TIPO	Kg polimero/	Polimero	gr polimero/	m³TOTAL	Sequedad	Densidad	Biosolido	Biosolido	ST (promedio	W L. Digerido
		Ton MS	Ton/dia	m3 Lodo	LPD/DIA	(%)	g/cm3	I on/dia	m3/dia	digestores) g/l	t.
01-01-22	FO 4490 VHM	13,80	0,672	248,77	2701,97	21,77	26'0	223,77	230,69	18,9	51,1
02-01-22	FO 4490 VHM	12,57	0,394	173,65	2269,29	25,04	1,00	125,17	129,04	18,8	42,7
03-01-22	FO 4490 VHM	12,57	0,593	238,68	2486,25	24,78	0,94	190,47	196,36	21,4	53,2
04-01-22	FO 4490 VHM	11,76	0,558	272,89	2044,19	24,09	0,94	196,94	203,03	19,9	40,6
05-01-22	FO 4490 VHM	11,77	0,556	262,43	2116,86	27,02	1,00	174,68	180,08	20,3	43,0
06-01-22	FO 4490 VHM	13,47	0,416	233,26	1782,08	24,45	0,94	126,20	130,10	24,6	43,8
07-01-22	FO 4490 VHM	13,09	0,257	245,09	1048,16	24,35	76'0	80,59	83,08	19,6	20,5
08-01-22	FO 4490 VHM									21,3	
09-01-22	FO 4490 VHM									20,0	
10-01-22	FO 4490 VHM									19,4	
11-01-22	FO 4490 VHM	12,71	0,345	239,75	1440,22	25,00		108,67	112,03	19,3	27,8
12-01-22	FO 4490 VHM	13,34	0,571	240,82	2372,43	26,33	1,01	162,68	167,71	19,6	46,5
13-01-22	FO 4490 VHM	11,16	0,366	235,39	1555,98	25,29	86'0	129,80	133,81	19,4	30,2
14-01-22	FO 4490 VHM	11,37	0,313	248,98	1255,55	25,64	66'0	107,21	110,53	19,3	24,2
15-01-22	FO 4490 VHM	12,45	0,198	233,46	849,80	24,40	26'0	65,33	67,35	19,3	16,4
16-01-22	FO 4490 VHM	14,10	0,101	224,28	448,29	25,85	66'0	27,59	28,44	18,1	8,1
17-01-22	FO 4490 VHM	12,95	0,258	255,66	1007,86	24,56	06'0	66'08	83,49	19,3	19,4
18-01-22	FO 4490 VHM	12,57	0,478	236,55	2019,70	26,82	1,01	141,73	146,11	18,7	37,8
19-01-22	FO 4490 VHM	12,68	0,585	288,85	2025,60	27,25	0,91	169,32	174,56	20,1	40,6
20-01-22	FO 4490 VHM	13,97	0,716	309,57	2311,49	24,54	0,98	208,75	215,21	19,5	45,0
21-01-22	FO 4490 VHM	12,49	0,665	268,50	2478,00	26,20	0,94	203,29	209,58	19,9	49,2
22-01-22	FO 4490 VHM	11,33	0,563	284,07	1980,74	25,30		196,33	202,40	21,3	42,1
23-01-22	FO 4490 VHM	12,57	0,482	280,64	1718,57	24,47	66'0	156,79	161,64	21,1	36,2
24-01-22	FO 4490 VHM	14,00	0,772	258,51	2985,70	23,38	0,98	235,85	243,14	19,5	58,2
25-01-22	FO 4490 VHM	11,31	0,636	290,94	2186,64	24,65	1,01	228,19	235,25	20,7	45,2
26-01-22	FO 4490 VHM	12,34	0,456	262,76	1734,57	24,23	1,03	152,48	157,20	20,6	35,6
27-01-22	FO 4490 VHM	12,69	0,401	221,20	1810,97	25,53	1,01	123,68	127,51	20,6	37,2
28-01-22	FO 4490 VHM	12,45	0,376	230,16	1634,08	25,85	96'0	116,84	120,45	21,4	34,9
29-01-22	FO 4490 VHM	12,82	0,383	227,41	1684,41	25,73	0,93	116,13	119,72	20,0	33,7
30-01-22	FO 4490 VHM	12,73	0,575	232,26	2477,60	23,95	0,91	188,77	194,61	23,2	57,5
31-01-22	FO 4490 VHM	13,60	0,612	235,43	2601,10	21,40	96'0	210,41	216,92	22,1	57,4
TOTALES			13,298		53028,10			4248,650			1077,8
								4563,680	315,030	4563,680	
MEDIO		12,67	0,47	249,28	1893,86	24,92	26'0	151,74	156,43	20,21	38,49
MAXIMO		14,10	0,77	309,57	2985,70	27,25	1,03	235,85	243,14	24,55	58,22
OMINIM		11,16	0,10	173,65	448,29	21,40	06'0	27,59	28,44	18,05	8,09

MES: ENERO 2022

# Anexo Cap 3\_7 Consumo Biogas

_							_					_			_								_	_				_	_					
		TOTAL	49,44	28,66	1062,83	4685,96	108,63	154,59	172,87	205,69	254,49	392,88	409,36	429,63	467,56	455,74	432,86	372,19	292,25	224,25	193,2	159,06	112,23	128,44	129,49	98'06	70,75	83,33	106,32	72,06	108,45	82,75	3791,33	15358,2
	(nm3/DIA)	10FT0 02C_FT_TOT.Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TEA	QUEMADO BIOGAS (nm3/DIA)	10FT002A_FT_TOT.Total 110FT002B_FT_TOT.Total 110FT002C_FT_TOT.Total	49,44	99'85	149,09	2092,69	108,63	154,59	172,87	205,68	254,49	392,87	409,32	429,63	467,54	455,73	432,86	372,17	292,24	224,25	193,2	159,06	112,23	128,44	129,49	98'06	70,75	83,33	106,32	72,06	108,45	82,75	1015,89	
		110FT002A_FT_TOT.Total	0	0	913,74	2593,27	0	0	0	0,01	0	0,01	0,04	0	0,02	0,01	0	0,02	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2775,44	
	GAS NATURAL (nm3/DIA)	TOTAL	22	23	72	2495	118	297	24	22	23	23	21	24	22	23	21	22	22	10	21	21	22	10	23	31	222	924	1796	2216	11	22	1596	10153,3
		111FT002E_FF_TOT.Tot	9	2	2	1082	20	23.4	2	2	7	7	2	2	2	- 4	- 4	2	2	3	- 4	2	2	3	- 4	- 4	101	123	330	340	3	2	7	
	DIA)	111FIT002D_FT_TOT.Tot al	∞	8	8	54	6	6	10	6	6	6	7	6	8	8	7	7	7	3	7	7	8	3	6	6	10	442	762	287	4	8	6	
	CONSUMO GAS NATURAL (nm3/DIA)	.11FIT002C_FT_TOT.Tota	3	3	4	258	25	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	4	4	2	4	3	4	2	4	10	107	355	446	632	2	3	62	
	CONSU	11FIT0028_FT_TOT.Tota	2	2	2	1100	2	49	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	143	200	1	2	735	
RAS		111FT0020_FT_101.7ct   111FT0028_FT_101.7cta   111FT002C_FT_101.7cta   111FT0020_FT_101.7ct   111FT002E_FT_101.7ct   all all all all all all all all all a	9	3	5	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	115	258	1	2	783	
CALDERAS	BIOGAS TOTAL (nm3/DIA)	TOTAL	1879,4	3355,3	511,2	91,6	188,8	190,2	191,3	185,1	189,0	344,5	95,4	516,5	190,8	330,4	185,9	188,1	191,3	86,4	187,4	189,8	192,0	87,0	188,6	193,9	1399,9	2387,2	3249,1	2735,0	87,3	187,7	190,0	20186,0
		111FTT001E_FT_TOT.Total	0,0	0'0	0,0	0,0	0,0	0,0	0'0	0'0	0,0	137,5	0'0	0,0	0'0	0,0	0,0	0'0	0,0	0,0	0,0	0'0	0'0	0,0	0,0	0,0	1182,0	1956,6	314,2	870,8	0'0	0,0	0,0	
	(vic	**	45,6	45,8	46,1	20,7	45,6	45,7	45,0	43,4	45,2	45,5	22,2	46,7	46,5	46,6	44,7	45,4	46,3	20,5	44,7	45,2	45,7	20,2	44,2	45,8	46,7	213,8	577,6	830,1	20,7	44,8	45,3	
	CONSUMO CALDERA BIOGAS (nm3/DIA)	1FT001C_FT_TOT.Total 11	1761,1	3236,3	390,6	36,7	70,0	9'02	6'02	9'89	8'69	86,5	32,4	397,2	70,1	208,4	68,3	69,3	70,4	32,0	9'69	7,07	71,7	32,8	70,8	72,9	95,3	143,3	1131,8	220,2	32,7	69,3	70,5	
	CONSUM	111FTT001A_FT_TOT.Total 111FTT001B_FT_TOT.Total 111FTT001C_FT_TOT.Total	72,7	73,2	74,6	34,2	73,2	73,9	75,4	73,1	74,0	75,0	40,9	72,6	74,2	75,5	72,9	73,5	74,7	33,9	73,2	73,8	74,6	34,0	73,6	75,2	75,9	73,6	1225,5	8'00'5	33,8	73,5	74,3	
		11FIT001A_FT_TOT.Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0'0	0,0	0,0	0,0	0,0	0'0	0,0	0,0	0,0	000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0'0	0,0	0,0	313,1	0,0	0,0	0,0	
	PRODUCCION TOTAL	BIOGAS	24721	23726	24563	29333	24504	24803	27093	25284	27511	26001	22210	23022	23705	23911	24584	23011	20262	23819	25785	22241	24289	24135	26691	30075	31240	30471	25059	23841	23529	24858	26234	780512,5


### **ANEXOS CAPÍTULO 4**

# Anexo Cap 4\_ 1 Consumo de energía eléctrica desde Enero de 2019

AÑO	PERIODO FACTURACION	CONSUMO ACTIVA	CONSUMO REACTIVA	TOTAL CONSUMO EN KWH	COSTO FACTURA	VALOR KW
	Ene\19	659.828,50	0,00	659.828,50	263.635.670,00	391,5
	Feb\19*	656.982,54	0,00	656.982,54	259.370.362,50	392,
	Mar\19	702.411,00	0,00	702.411,00	273.208.410,00	388,
	Abr\19	659.992,00	0,00	659.992,00	258.970.120,00	395,
	May\19	712.945,00	0,00	712.945,00	289.621.330,00	401,
2019	Jun\19	677.930,00	0,00	677.930,00	274.520.990,00	404,
2019	Jul\19	665.960,00	0,00	665.960,00	269.548.950,00	406,
	Ago\19	713.910,00	0,00	713.910,00	297.124.510,00	410,
	Sep\19	692.790,00	0,00		277.122.590,00	401,
	Oct\19	706.840,00	0,00	706.840,00	296.737.840,00	401,
	Nov\19	684.959,00	0,00		275.986.077,00	399,
	Dic\19	477.740,00	0,00		177.898.620,00	388,
otal 2019		8.012.288,04	0		3.213.745.469,50	398,0
	Ene \ 2020	667.691,00	0,00		267.812.122,00	398,
	Feb \ 2020	650.550,00	0,00		249.609.330,00	374
	Mar \ 2020	693.080,00	0,00		264.334.540,00	379
	Abr \ 2020	691.660,00	0.00		264.741.730,00	382
	May \ 2020	709.170,00	0,00		281.469.240,00	387
	Jun \ 2020	696.440,00	0,00		270.102.340,00	393
2020	Jul \ 2020	685.570,00	0,00		283.845.770,00	417
	Ago \ 2020	547.870,00	0,00		238.101.930,00	420
	Sep \ 2020	626.760,00	0,00		274.065.290,00	420
	Oct \ 2020	694.950,00	0,00		308.019.680,00	430,
	Nov \ 2020	650.150,00	0,00		285.339.150,00	430,
otal 2020	Dic \ 2020	693.260,00	17.975,00		297.557.770,00	418,
otal 2020	F ) 2024	8.007.151,00	17975		3.284.998.892,00	405,0
	Ene \ 2021	477.060,00	0,00		205.513.380,00	415,
	Feb \ 2021	545.170,00	0,00		234.202.251,00	421,
	Mar \ 2021	623.310,00	0,00		260.686.170,00	435,
	Abr \ 2021	530.690,00	0,00		232.391.250,00	439
	May \ 2021	522.700,00	40,00		232.643.280,00	437
2021	Jun \ 2021	480.310,00	30,00		223.131.160,00	456
	Jul \ 2021	476.900,00	5,00		218.143.070,00	449
	Ago \ 2021	430.470,00	20,00		196.958.750,00	452
	Sep \ 2021	153.380,00	900,00		69.705.640,00	452
	Oct \ 2021	123.190,00	1.980,00		58.084.080,00	462
	Nov \ 2021	128.610,00	2.970,00		60.758.120,00	465
	Dic \ 2021	107.260,00	2.700,00		50.461.570,00	457
otal 2021		4.599.050,00	8645		2.042.678.721,00	445,
	Ene \ 2022	116.830,00	1.730,00	116.830,00	56.669.840,00	479
	Feb \ 2022		0,00	0,00		0
	Mar \ 2022		0,00	0,00		0
	Abr \ 2022		0,00	0,00		0
	May \ 2022		0,00	0,00		0
2022	Jun \ 2022		0,00			0
2022	Jul \ 2022		0,00			0
	Ago \ 2022		0,00			0
	Sep \ 2022		0,00			0
	Oct \ 2022		0,00			0
	Nov \ 2022		0,00			0
	Dic \ 2022		0,00			0
	DIC \ 2022					
otal 2022		116.830,00	1730	116.830,00	56.669.840,00	39,9

\* Costos estimados

#### Anexo Cap 4\_2 Costo energía eléctrica comprada por KWH desde Enero 2019

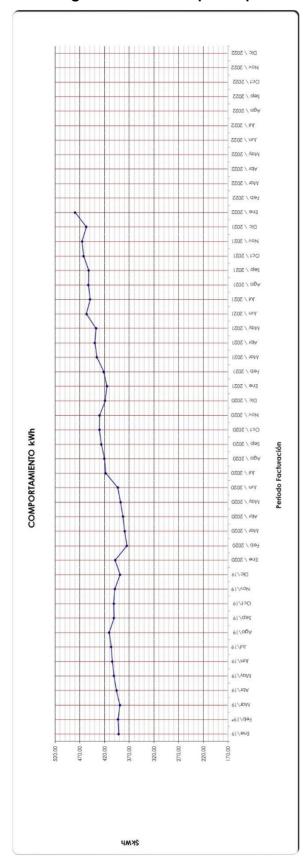

# Anexo Cap 4\_ 3a Plan de mantenimiento enero 2022

ORDEN UBICAC.TECNICA	DENOMINACION	EQUIPO	DENOMINACION	TEXTO BREVE
10018101 PTAR-12-DELO -USB01A 10018577 PTAR-12-TDES -UT	Unidad deshidratadora de lodos A Unidad transporte de biosólido	012T05	CINTA TRANSPORTADORA LODOS DESHIDRATADOS	MTTO PREVENTIVO GENERAL  MTTO PREVENTIVO GENERAL (APOYO CONTRATIS
10018699 PTAR-12-ALD -UA01	Unidad mezcla lodos digeridos	011A01C	AGITADOR DE LODOS DIGERIDOS C	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018709 PTAR-01-EAC -UAP 10018716 PTAR-10-TAB -UTD	Unidad tomamuestra agua cruda Unidad tablero control calentamiento			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018717 PTAR-10-TAB -UCCM	Unidad centro control motores			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018719 PTAR-12-TAB -UPS	Unidad potencia ininterumpida Unidad potencia ininterumpida			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018722 PTAR-18-DEE -UPS01 10018725 PTAR-18-GE -UGE01	Unidad potencia ininterumpida			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018736 PTAR-02	Unidad grupo electrágeno 1 Pretratamiento			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018737 PTAR-30-ADM -SCTR 10018748 PTAR-30-ACHI -ACH05	Sala de control Sis achique ductos eléctricos deshidrata	030UPS04	Unidad de potencia ininterrumpida	PLAN MENSUAL PTAR GENERAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018751 PTAR-12-ALD -UA01	Unidad mezcla lodos digeridos	O1 1LITO1	MEDIDOR DE NIVEL POR ULTRASONIDO ALMACEN	PLAN MENSUAL PTAR GENERAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018759 PTAR-30-ACHI -ACH02 10018760 PTAR-30-TALL -UELEC	Sis achique ductos eléctricos calentamie Unidad taller de mantenimiento eléctrico	030UPS03	Unidad de potencia ininterrumpida	PLAN MENSUAL PTAR GENERAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018764 PTAR-10-CRBG	Compresión y recirculación de biogas	00001000	omada de perenca mimorrompida	PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018767 PTAR-02-CLF 10018774 PTAR-00-EAT -UP01C	Alm y dosi cloruro ferrico y coadyuvante Unidad bombeo elevación agua tratada C			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL MTTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018775 PTAR-08-BLE -UPO1	Unidad estación bombeo lodos espesados	008MP01B	MOTOR BOMBA DE LODO ESPESADO B	MTTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018776 PTAR-08-BLE -UPO1 10018777 PTAR-18-GE -UAUX	Unidad estación bombeo lodos espesados Unidad equipos auxiliares generadores	008MP01C 018C02A	MOTOR BOMBA DE LODO ESPESADO C COMPRESOR ELECTRICO SUMINISTRO AIRE ARRA	MTTO PREVENTIVO SEMESTRAL MTTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018778 PTAR-30-13 -UPO1	Udad sis bombeo todas aguas decantación	013P01A 025C01	MOTOBOMBA TODAS LAS AGUAS DECANTACION A	MITO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018779 PTAR-30-25 -UAPOT 10018780 PTAR-01-CRI -UT01	Unidad almacenamiento agua potable Unidad polipasto limpieza rejas gruesas	025C01	COMPRESOR DE AIRE SERVICIO BOMBEO DE AGU	MTTO PREVENTIVO SEMESTRAL MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018781 PTAR-01-EAC -UP01C 10018782 PTAR-01-EAC -UP01C	Unidad de elevación agua cruda C	0010000	LINUDAD DE LUDDICACIONE CO INIETE INIEEDIOD	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018782 PTAR-01-EAC -UP01C 10018783 PTAR-02-ASP -UC01B	Unidad de elevación agua cruda C Unidad suministro aire a desarenadores B	001P03C	UNIDAD DE LUBRICACIÓN COJINETE INFERIOR	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018785 PTAR-02-BFL -UPO3 10018788 PTAR-02-CRI -UDGL01D	Unidad estación de bombeo grasas Unidad rejilla fina automática D	002P03B	BOMBA DE GRASAS GALERIA ORIENTAL B	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018789 PTAR-02-ERC -UP06	Unidad estación bombeo todas las aguas	002P06B	MOTOBOMBA TODAS LAS AGUAS PTR B	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018790 PTAR-02-PPA 10018791 PTAR-05-DP -UDCLE	Preparación dosificación polimero pretra Udad pte reparador arrastre periférico E			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018792 PTAR-05-DP -UDCLF	Udad pte reparador arrastre periférico F			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018793 PTAR-05-DP -UDCLG 10018794 PTAR-05-DP -UDCLH	Udad pte reparador arrastre periférico G Udad pte reparador arrastre periférico H			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018795 PTAR-05-PBF02-UP06	Udad estación bombeo lodos primarios 5,2	005P06B	BOMBA DE LODOS PRIMARIOS DECANTADOR D	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018796 PTAR-05-PBF03-UP03 10018797 PTAR-05-PBF03-UP07	Udad estación bombeo de grasas 5,3 Udad estación bombeo lodos primarios 5,3	005P03B 005P07B	BOMBA DE GRASAS DECANTADOR F BOMBA DE LODOS PRIMARIOS DECANTADOR F	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL  MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018798 PTAR-05-PBF04-UP08	Udad estación bombeo lodos primarios 5,4	005P08B	BOMBA DE LODOS PRIMARIOS DECANTADOR H	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018799 PTAR-08-CRI -UT 10018801 PTAR-12-ALD -UA01	UNIDAD DE TRANSPORTE DESECHOS LODOS ESPE Unidad mezcla lodos digeridos	011A01A	AGITADOR DE LODOS DIGERIDOS A	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL  MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018802 PTAR-12-CDL -UC01	Unidad suministro aire deshidratación	012C01B	COMPRESOR DE AIRE SERVICIO DESHIDRATACIO	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018803 PTAR-12-PPA 10018804 PTAR-12-TDES -UT	Prepa y dosif polímero deshidratación Unidad transporte de biosólido	012T04	CINTA TRANSPORTADORA LODOS DESHIDRATADOS	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018805 PTAR-00-MAT -UAP	Unidad tomamuestra agua tratada	012104	ON THE WAS CITED ON TEODOG BEGIND ON THE OC	PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018806 PTAR-01-EAC -UAP 10018807 PTAR-02-TAB -UTD	Unidad tomamuestra agua cruda Unidad tablero de control pretratamiento			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018808 PTAR-02-TAB -UCCM	Unidad centro control motores			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018809 PTAR-02-TAB -UPS 10018810 PTAR-05-PBF02-UTD	Unidad de potencia ininterrumpida Tablero de control 5,2			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018811 PTAR-05-PBF02-UPS	Unidad potencia ininterrumpida			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018812 PTAR-05-PBF02-UCCM 10018813 PTAR-10-TAB -UTD	Unidad centro control motores 5,2 Unidad tablero control calentamiento			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018814 PTAR-10-TAB -UCCM	Unidad centro control motores			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018815 PTAR-10-TAB -UPS 10018816 PTAR-12-TAB -UPS	Unidad potencia ininterumpida Unidad potencia ininterumpida			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018817 PTAR-12-TAB -UTD 10018818 PTAR-12-TAB -UCCM	Unidad tableros control deshidratación			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018819 PTAR-18-DEE -UPS01	Unidad centrol control motores Unidad potencia ininterumpida			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018820 PTAR-18-GE -UTCGE 10018821 PTAR-18-GE -UTC	Unidad tablero comun generadores Unidad tablero de control electrógenos			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018822 PTAR-18-GE -UGE01	Unidad grupo electrógeno 1			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018823 PTAR-18-GE -UGE02 10018824 PTAR-30-ALU	Unidad grupo electrógeno 2 Sistema alumbrado general PTAR			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018825 PTAR-30-ADM -SSER	Sala de servidores			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018826 PTAR-10-CRBG 10018827 PTAR-05	Compresión y recirculación de biogas DECANTACION			MTTO PREV. MENSUAL SEMANALES CALENTAMIEN MTTO PREV. MENSUAL SEMANALES DECANTACION
10018828 PTAR-30-TALL	Taller de electromecánica y almacen			CAPACITACION - INCAPACIDAD - PERMISO -AC
10018829 PTAR-30-GAP -UPAP 10018830 PTAR-02-CLF	Unidad puertas de acceso a la PTAR Alm y dosi cloruro ferrico y coadyuvante			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL MTTO PREV. MENSUAL SEMANALES CLFO
10018831 PTAR-10	DIGESTION Y CALENTAMIENTO			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018832 PTAR-12 10018833 PTAR-02	DESHIDRATACION Pretratamiento	-		MTTO PREV. MENSUAL SEMANALES DESHIDRATAC PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018834 PTAR-30-ADM -SCTR	Sala de control	030UPS04	Unidad de potencia ininterrumpida	PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018835 PTAR-00-MAT -UFET 10018836 PTAR-01-EAC	Unidad de medición flujo agua tratada Elevación agua cruda	-		PLAN MENSUAL PTAR GENERAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018837 PTAR-02-DSG -UDGR01B	Udad pte desar - desengr doble canal C/D			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018838 PTAR-02-DSG -UDGR01C 10018839 PTAR-02-ERC	Udad pte desar - desengr doble canal E/F Almacenamiento y bombeo todas las aguas	-		PLAN MENSUAL PTAR GENERAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018840 PTAR-05-ACHDP	Bombeo achique zona decantación			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018841 PTAR-05-CDP 10018842 PTAR-08	Suministro aire servicio decantación ESPESAMIENTO	1		PLAN MENSUAL PTAR GENERAL MITO PREV. MENSUAL SEMANALES ESPESAMENT
10018843 PTAR-18-GE -UAUX	Unidad equipos auxiliares generadores			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018844 PTAR-30-25 10018845 PTAR-30-ACHI -ACH05	Almacen agua potable y contra incendio Sis achique ductos eléctricos deshidrata	<u> </u>		PLAN MENSUAL PTAR GENERAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018846 PTAR-08-BLE -UPO1	Unidad estación bombeo lodos espesados			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018847 PTAR-01-MAC -UFEC1 10018848 PTAR-12-ALD -UA01	Unidad primera medición flujo agua cruda Unidad mezcla lodos digeridos	011LIT01	MEDIDOR DE NIVEL POR ULTRASONIDO ALMACEN	PLAN MENSUAL PTAR GENERAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018849 PTAR-18-GE	Generadores de energía		10 to 10 to	MTTO PREV. MENSUAL SEMANALES GENERADORES
10018850 PTAR-30-TALL -UMEC 10018851 PTAR-30-TALL -UMET	Unidad taller de mantenimiento Unidad de planeación	<u> </u>		PLAN MENSUAL PTAR GENERAL MTTO PREVENTIVO SEMANAL
10018852 PTAR-02-DSG -UDGR01A	Udad pte desar - desengr doble canal A/B			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018853 PTAR-30-ACHI -ACH04 10018854 PTAR-18	Sis achique ductos eléctricos pretratami DISTRIBUCION Y GENERACION DE ENERGIA			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018855 PTAR-01-CRI -UDGL01	Unidad primera reja gruesa 10 cm	001RAS01	RASTRILLO VIAJERO	PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018856 PTAR-30-ACHI -ACH02 10018857 PTAR-30-TALL -UELEC	Sis achique ductos eléctricos calentamie Unidad taller de mantenimiento eléctrico	030UPS03	Unidad de potencia ininterrumpida	PLAN MENSUAL PTAR GENERAL PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018858 PTAR-02	Pretratamiento			MTTO PREV. MENSUAL SEMANALES PRETRATAMIE
10018859 PTAR-05-PBF03-UCCM	Unidad centro control motores 5,3	1		PLAN MENSUAL PTAR GENERAL



# Anexo Cap $4_{-}$ 3b Plan de mantenimiento enero 2022

ORDEN	UBICAC.TECNICA	DENOMINACION	EQUIPO	DENOMINACION	TEXTO BREVE
10018860	PTAR-30-BAR -UPO1	Udad sistema bombeo aguas residuales			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018861	PTAR-10-CRBG	Compresión y recirculación de biogas			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018862	PTAR-05	DECANTACION			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018863	PTAR-12	DESHIDRATACION			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
	PTAR-02-CLF	Alm y dosi cloruro ferrico y coadyuvante			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018865		ESPESAMIENTO			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
	PTAR-18-GE	Generadores de energía			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
	PTAR-OO-MAT -UFET	Unidad de medición flujo agua tratada	006FIT01A	MEDIDOR DE FLUJO POR ULTRASONIDO DE AGUA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL
	PTAR-OO-MAT -UFET	Unidad de medición flujo agua tratada	006FIT01B	MEDIDOR DE FLUJO POR ULTRASONIDO DE AGUA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018869	PTAR-OO-MAT -UFET	Unidad de medición flujo agua tratada	006FIT01C	MEDIDOR DE FLUJO POR ULTRASONIDO DE AGUA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018870	PTAR-OO-MAT -UFET	Unidad de medición fluio aqua tratada	006FIT01D	MEDIDOR DE FLUJO POR ULTRASONIDO DE AGUA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018871	PTAR-02-CLF -MCF	Unidad Medicion cloruro ferrico	002FIT04B	MEDIDOR FLUJO CLORURO FERICO CANAL C/D	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL
	PTAR-05-PBF01-UP05	Udad estación bombeo lodos primarios 5,1	005FIT01A	MEDIDOR DE FLUJO DE EXTRACCION LODOS DEC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018873	PTAR-05-PBF01-UP05	Udad estación bombeo lodos primarios 5,1	005FIT01B	MEDIDOR DE FLUJO DE EXTRACCION LODOS DEC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL
	PTAR-05-PBF02-UP06	Udad estación bombeo lodos primarios 5,2	005FIT01D	MEDIDOR DE FLUJO DE EXTRACCION LODOS DEC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL
	PTAR-05-PBF03-UP07	Udad estación bombeo lodos primarios 5,3	005FIT01E	MEDIDOR DE FLUJO DE EXTRACCION LODOS DEC	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL
	PTAR-08-BLE -UMC	Und Med Caudal Lodos Espesados a Diaes	008FIT01	MEDIDOR DE CAUDAL DE LODO ESPESADO A DIG	MANTENIMEINTO PREVENTIVO ANUAL
	PTAR-12-PBD -UMF	Und Medicion Flujo de Lodos a Deshidrat	012FIT01A	MEDIDOR DE FLUJO DE LODOS A FILTROBANDA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL
	PTAR-12-PBD -UMF	Und Medicion Fluio de Lodos a Deshidrat	O12FITO1B	MEDIDOR DE FLUJO DE LODOS A FILTROBANDA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL
	PTAR-12-PBD -UMF	Und Medicion Fluio de Lodos a Deshidrat	012FIT01C	MEDIDOR DE FLUJO DE LODOS A FILTROBANDA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL
	PTAR-12-PBD -UMF	Und Medicion Flujo de Lodos a Deshidrat	012FIT01C	MEDIDOR DE FLUJO DE LODOS A FILTROBANDA	MANTENIMENTO PREVENTIVO SEMESTRAL
	PTAR-12-PBD -UMF	Und Medicion Fluio de Lodos a Deshidrat	012FIT01D	MEDIDOR DE FLUJO DE LODOS A FILTROBANDA	MANTENIMENTO PREVENTIVO SEMESTRAL
	PTAR-12-PBD -UMF	Und Medicion Flujo de Lodos a Deshidrat	012FIT01E	MEDIDOR DE FLUJO DE LODOS A FILTROBANDA	MANTENIMENTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018883		Toma de agua	012111012	THE BOOK BE 12000 BE 20000 THE MODITION	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-01-EAC -UPO1A	Unidad de elevación agua cruda A			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-01-EAC -UPO1A	Unidad de elevación agua cruda A	001P03A	UNIDAD DE LUBRICACION COJINETE INFERIOR	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-01-EAC -UPO1B	Unidad de elevación agua cruda B	001P03B	UNIDAD DE LUBRICACION COJINETE INFERIOR	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-01-EAC -UPO1B	Unidad de elevación agua cruda B	0011035	STAIDAD DE EUDITICACIOTA COSTINETE ITATEMON	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-02-ASP -UCO1C	Unidad suministro aire a desarenadores C			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-02-BFL -UPO3	Unidad estación de bombeo arasas	002P03A	BOMBA DE GRASAS GALERIA ORIENTAL A	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-02-DIE -UPO4	Unidad estación de bombeo cloruro ferrico	002F03A	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORURO FERRICO B	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-02-CRI -UDGL01B	Unidad rejilla fina automática B	0021 040	BOMBA BOSINCABORA DE CEORORO TERRICO B	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-05-PBF01-UP01	Udad estación bombeo de grasas 5,1	005AV02A	VALVULA MANGUITO BOMBEO GRASAS DECANT A	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-05-PBF01-UP01	Udad estación bombeo de grasas 5,1	005AV02B	VALVULA MANGUITO BOMBEO DE GRASAS DECANT	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-05-PBF01-UP05	Udad estación bombeo lodos primarios 5,1	005P05B	BOMBA DE LODOS PRIMARIOS DECANTADOR B	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-05-PBF02-UP02	Udad estación bombeo de grasas 5,2	005AV02C	VALVULA MANGUITO BOMBEO DE GRASAS DECANT	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-05-PBF02-UP02	Udad estación bombeo de grasas 5,2  Udad estación bombeo de grasas 5,2	005AV02C	VALVULA MANGUITO BOMBEO DE GRASAS DECANT	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-05-PBF04-UP04	Udad estación bombeo de grasas 5,2	005P04A	BOMBA DE GRASAS DECANTADOR G	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-05-PBF04-UP08	Udad estación bombeo de grasas 3,4  Udad estación bombeo lodos primarios 5.4	005AV01G	VALVULA MANGUITO DE EXTRACCION DE LODOS	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-05-PBF04-UP08	Udad estación bombeo lodos primarios 5,4	005AV01H	VALVULA MANGUITO DE EXTRACCION DE LODOS	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-08-CRI -USO1	Udad separación hilazas lodos primarios 3,4	COSAVOTA	VALVOLA /VALVOSITO DE EXTRACCION DE LODOS	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-08-EL -UDEP01				MITO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-08-EL -UDEPO1	Udad pte raspador arrastre central 7,1			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-U8-EL -UDEPUZ PTAR-12-ALD -UAO1	Udad pte raspador arrastre central 7,2	011A01B	AGITADOR DE LODOS DIGERIDOS B	MITO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-12-ALD -UAU1 PTAR-30-25 -UPO1	Unidad mezcla lodos digeridos	OTTAULB	WOLLWOOK DE FODOS DIGERIDOS B	MITO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018904	MIAK-30-25 -UPOI	Unidad estación bombeo agua potable	013P01C	MOTOBOMBA TODAS LAS AGUAS DECANTACION C	/MITO PREVENTIVO TRIMESTRAL





# Anexo Cap 4\_ 4 Ordenes Reprogramadas de mantenimiento enero 2022

ORDEN	UBICAC.TECNICA	DENOMINACION	EOUIPO	DENOMINACION	TEXTO BREVE
	PTAR-01-EAC -UPO1D	Unidad de elevación agua cruda D	1 2 2 2		FALLA ELECTRICA CONSTANTE
3906	PTAR-05-DP -ECIVH	Estructura civil decantador H			CAMBIO DE LLANTAS
10018101	PTAR-12-DELO -USBO1A	Unidad deshidratadora de lodos A			MTTO PREVENTIVO GENERAL
10018577	PTAR-12-TDES -UT	Unidad transporte de biosólido	012T05	CINTA TRANSPORTADORA LODOS DESHIDRATADOS	MTTO PREVENTIVO GENERAL (APOYO CONTRATIS
10018699	PTAR-12-ALD -UAO1	Unidad mezcla lodos digeridos	011A01C	AGITADOR DE LODOS DIGERIDOS C	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018709	PTAR-01-EAC -UAP	Unidad tomamuestra agua cruda			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018716	PTAR-10-TAB -UTD	Unidad tablero control calentamiento			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018717	PTAR-10-TAB -UCCM	Unidad centro control motores			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
	PTAR-10-TAB -UPS	Unidad potencia ininterumpida			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018719	PTAR-12-TAB -UPS	Unidad potencia ininterumpida			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018722	PTAR-18-DEE -UPSO1	Unidad potencia ininterumpida			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018725	PTAR-18-GE -UGE01	Unidad grupo electrógeno 1			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018736		Pretratamiento			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018737	PTAR-30-ADM -SCTR	Sala de control	030UPS04	Unidad de potencia ininterrumpida	PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
	PTAR-30-ACHI -ACH05	Sis achique ductos eléctricos deshidrata			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
	PTAR-12-ALD -UAO1	Unidad mezcla lodos digeridos	011LIT01	MEDIDOR DE NIVEL POR ULTRASONIDO ALMACEN	PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
	PTAR-30-ACHI -ACH02	Sis achique ductos eléctricos calentamie			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
	PTAR-30-TALL -UELEC	Unidad taller de mantenimiento eléctrico	030UPS03	Unidad de potencia ininterrumpida	PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018764	PTAR-10-CRBG	Compresión y recirculación de biogas			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018767	PTAR-02-CLF	Alm y dosi cloruro ferrico y coadyuvante			PLAN MENSUAL PTAR GENERAL
10018774	PTAR-00-EAT -UPO1C	Unidad bombeo elevación agua tratada C			MTTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018775	PTAR-08-BLE -UPO1	Unidad estación bombeo lodos espesados	008MP01B	MOTOR BOMBA DE LODO ESPESADO B	MTTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018776	PTAR-08-BLE -UPO1	Unidad estación bombeo lodos espesados	008MP01C	MOTOR BOMBA DE LODO ESPESADO C	MTTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018777	PTAR-18-GE -UAUX	Unidad equipos auxiliares generadores	018C02A	COMPRESOR ELECTRICO SUMINISTRO AIRE ARRA	MTTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018778	PTAR-30-13 -UPO1	Udad sis bombeo todas aguas decantación	013P01A	MOTOBOMBA TODAS LAS AGUAS DECANTACION A	MTTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018779	PTAR-30-25 -UAPOT	Unidad almacenamiento agua potable	025C01	COMPRESOR DE AIRE SERVICIO BOMBEO DE AGU	MTTO PREVENTIVO SEMESTRAL
10018780	PTAR-01-CRI -UTO1	Unidad polipasto limpieza rejas gruesas			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018781	PTAR-01-EAC -UPO1C	Unidad de elevación agua cruda C			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018782	PTAR-01-EAC -UPO1C	Unidad de elevación agua cruda C	001P03C	UNIDAD DE LUBRICACION COJINETE INFERIOR	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018783	PTAR-02-ASP -UC01B	Unidad suministro aire a desarenadores B			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018785	PTAR-02-BFL -UPO3	Unidad estación de bombeo grasas	002P03B	BOMBA DE GRASAS GALERIA ORIENTAL B	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018788	PTAR-02-CRI -UDGL01D	Unidad rejilla fina automática D			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018789	PTAR-02-ERC -UP06	Unidad estación bombeo todas las aguas	002P06B	MOTOBOMBA TODAS LAS AGUAS PTR B	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018790	PTAR-02-PPA	Preparación dosificación polimero pretra			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018791	PTAR-05-DP -UDCLE	Udad pte reparador arrastre periférico E			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018792	PTAR-05-DP -UDCLF	Udad pte reparador arrastre periférico F			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018793	PTAR-05-DP -UDCLG	Udad pte reparador arrastre periférico G			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-05-DP -UDCLH	Udad pte reparador arrastre periférico H			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-05-PBF02-UP06	Udad estación bombeo lodos primarios 5,2	005P06B	BOMBA DE LODOS PRIMARIOS DECANTADOR D	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-05-PBF03-UP03	Udad estación bombeo de grasas 5,3	005P03B	BOMBA DE GRASAS DECANTADOR F	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018797	PTAR-05-PBF03-UP07	Udad estación bombeo lodos primarios 5,3	005P07B	BOMBA DE LODOS PRIMARIOS DECANTADOR F	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018798	PTAR-05-PBF04-UP08	Udad estación bombeo lodos primarios 5,4	005P08B	BOMBA DE LODOS PRIMARIOS DECANTADOR H	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018799	PTAR-08-CRI -UT	UNIDAD DE TRANSPORTE DESECHOS LODOS ESPE			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-12-ALD -UAO1	Unidad mezcla lodos digeridos	011A01A	AGITADOR DE LODOS DIGERIDOS A	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-12-CDL -UC01	Unidad suministro aire deshidratación	012C01B	COMPRESOR DE AIRE SERVICIO DESHIDRATACIO	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
	PTAR-12-PPA	Prepa y dosif polímero deshidratación			MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
10018804	PTAR-12-TDES -UT	Unidad transporte de biosólido	012T04	CINTA TRANSPORTADORA LODOS DESHIDRATADOS	MTTO PREVENTIVO TRIMESTRAL

#### Anexo Cap 4\_5 Descripción del mantenimiento por zonas


DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO X ZONAS 01 AL 31 ENERO DE 2022						
ZONA	DESCRIPCION	ORDENES DE TRABAJO	TOTAL MANTENIMIENTO			
00	PUESTO MEDICION Y ELEVACION DE AGUA TRATADA	1	\$ 48.820			
01	TOMA DE AGUA	7	\$ 5.374.808			
02	PRETRATAMIENTO	14	\$ 2.053.732			
05	DECANTACION	16	\$ 8.881.117			
08	ESPESA MIENTO	5	\$ 374.970			
10	DIGESTION Y CALENTAMIENTO	8	\$ 1.259.837			
12	DESHIDRATACION	10	\$ 3.719.458			
14	BOMBEO DE AGUA INDUSTRIAL	0	\$0			
15	ALMACENAMIENTO Y COMBUSTION BIOGAS	0	\$0			
18	DISTRIBUCION Y GENERACION DE ENERGIA	7	\$ 714.472			
30	AREAS GENERALES PTAR	16	\$ 78.577.142			
	TOTAL 84 \$ 101.004.356					

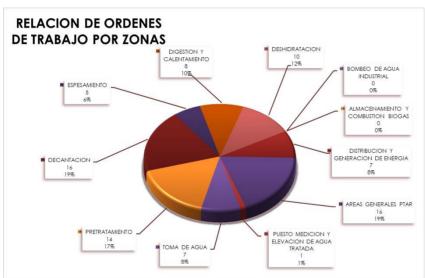

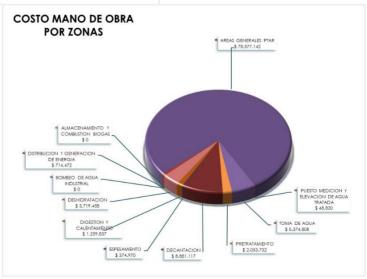

#### Anexo Cap 4\_ 6 Costo mano de obra por áreas

COSTO MANO DE OBRA X AREAS 01 AL 31 ENERO DE 2022				
DESCRIPCION	MANO OBRA			
DIVISION MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA	\$ 86.209.765			
MANTENIMIENTO	\$ 86.209.765			
DIVISION OPERACIÓN Y TECNICA	\$ 65.534.508			
OPERA CIONES	\$ 65.534.508			
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 46.302.090			
A DMINISTRATIV O	\$ 28.445.479			
CALIDAD	\$ 3.579.235			
ALMACENISTA	\$ 3.579.235			
SERVICIOS GENERALES	\$ 10.698.141			
DIVISION AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD	\$ 52.651.445			
AMBIENTAL	\$ 22.370.091			
LABORATORIO	\$ 23.122.883			
SISO	\$ 3.579.235			
GESTION SOCIAL	\$ 3.579.235			
TOTAL	\$ 185.163.300			

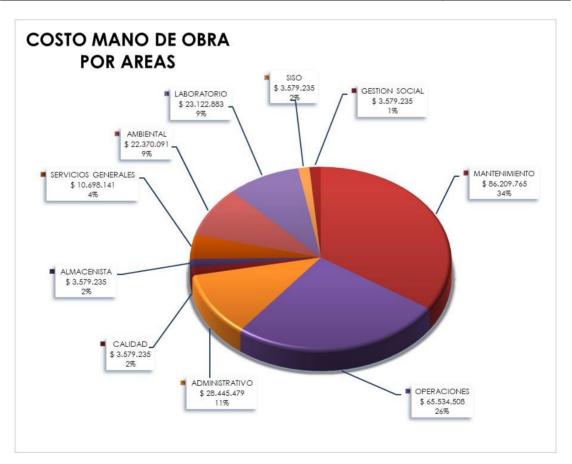


Anexo Cap 4\_7 Consolidado costo total por áreas

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO X ZONAS				
01 AL 31 ENERO DE 2022				
DESCRIPCION	SALIDA ALMACEN			
MANTENIMIENTO ALM. 12	\$ 60.100			
MANTENIMIENTO ALM. 14	\$ 14.734.491			
A DMINISTRA CION	\$ 0			
ALMACEN	\$0			
AMBIENTAL	\$0			
LABORATORIO	\$ 5.142.844			
MANTENIMIENTO 201	\$0			
OPERA CIONES	\$ 34.567.312			
SERVICIOS GENERALES	\$ 1.369.161			
SST	\$ 63.659			
TOTAL	\$ 55.937.567			




Anexo Cap 4\_8 Consolidado costo total por áreas

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO X ZONAS 01 AL 31 ENERO DE 2022				
DESCRIPCION	MANO OBRA			
DIVISION MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA	\$ 101.004.356			
MANTENIMIENTO	\$ 101.004.356			
DIVISION OPERACIÓN Y TECNICA	\$ 100.101.820			
OPERA CIONES	\$ 100.101.820			
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$ 47.671.251			
A DMINISTRATIV O	\$ 28.445.479			
CALIDAD	\$ 3.579.235			
ALMACENISTA	\$ 3.579.235			
SERVICIOS GENERALES	\$ 12.067.302			
SUBDIRECCION AMBIENTAL Y CALIDAD	\$ 57.857.948			
AMBIENTAL	\$ 22.370.091			
LABORATORIO	\$ 28.265.727			
SISO	\$ 3.642.894			
GESTION SOCIAL	\$ 3.579.235			
TOTAL	\$ 306.635.374			

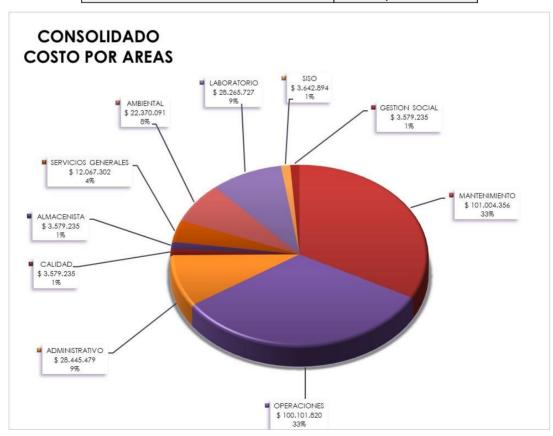



# Anexo Cap 4\_ 9 Órdenes de Trabajo por Zonas

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO X ZONAS 01 AL 31 ENERO DE 2022						
ZONA	DESCRIPCION		ENES ZADAS			
		PTR1	PTR2			
00	PUESTO MEDICION Y ELEVACION DE AGUA TRATADA	0	1			
01	TOMA DE AGUA	1	6			
02	PRETRATAMIENTO	1	13			
05	DECANTACION	3	13			
08	ESPESAMIENTO	0	5			
10	DIGESTION Y CALENTAMIENTO	1	7			
12	DESHIDRATACION	1	9			
14	BOMBEO DE AGUA INDUSTRIAL	0	0			
15	ALMACENAMIENTO Y COMBUSTION BIOGAS	0	0			
18	DISTRIBUCION Y GENERACION DE ENERGIA	0	7			
30	AREAS GENERALES PTAR	1	15			
·	TOTALES 8 76					
	8	34				

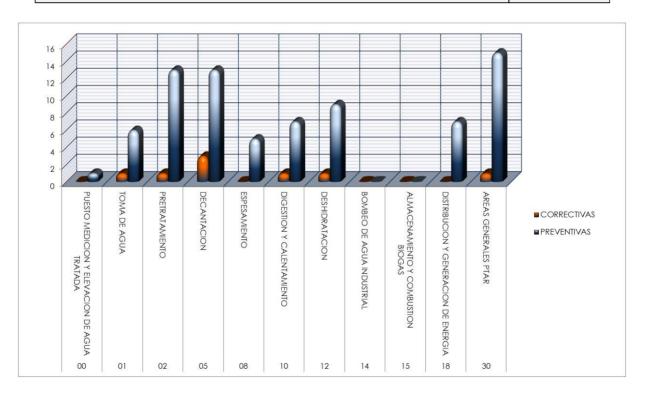


#### Anexo Cap 4\_ 10 Indicadores de Gestión

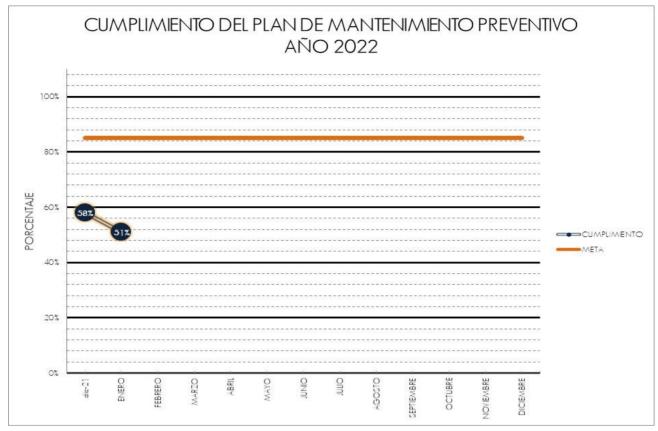

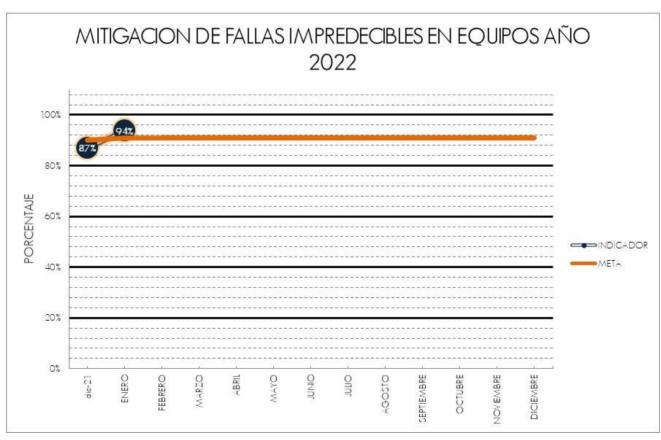

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALITRE INFORME DE ACTIVIDADES ENERO 2022

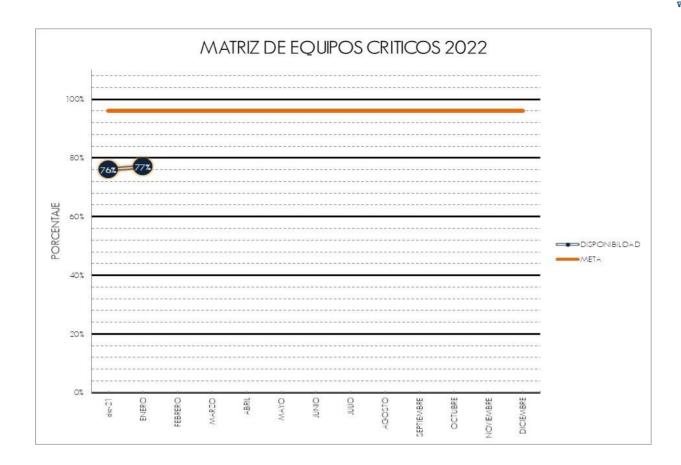



#### PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES " EL SALITRE"

Versión	Α
Código	
Página	

#### **CONTROL DE DOCUMENTOS**

Documento	Nombre documento	Responsable
	Gestión Financiera Capítulo 2.	Ancizar Ramírez Mosquera
	Informe de Operaciones Capítulo 3 y anexos Cap. 3	Hader Fabián Gómez Montenegro
	Informe Electromecánico Capítulo 4 y anexos Cap. 4	Alexander Perez Cortes
Informe Mensual	Informe Ambiental Capítulo 5	Catalina Del Mar López Pinto
Enero 2022	Informe Gestión Social Capítulo 5	Alexandra Barriga Suarez
	Informe Calidad Capítulo 6	Alberto Diaz Garzon
	Informe Salud Ocupacional Capítulo 7	Lucio Javier Diaz Salamanca
	Recopilación / edición informe Anexos Cap. 4	Juan Pablo Méndez Peña

#### Control de modificaciones

Página, numeral o capítulo modificado	Revisión No.	Fecha de la modificación	Descripción de la modificación

Emisor:	Aprobado por:	Fecha elaboración del formato:	
PTAR EL SALITRE	Yamid Garcia Zuñiga	Febrero 2022	
