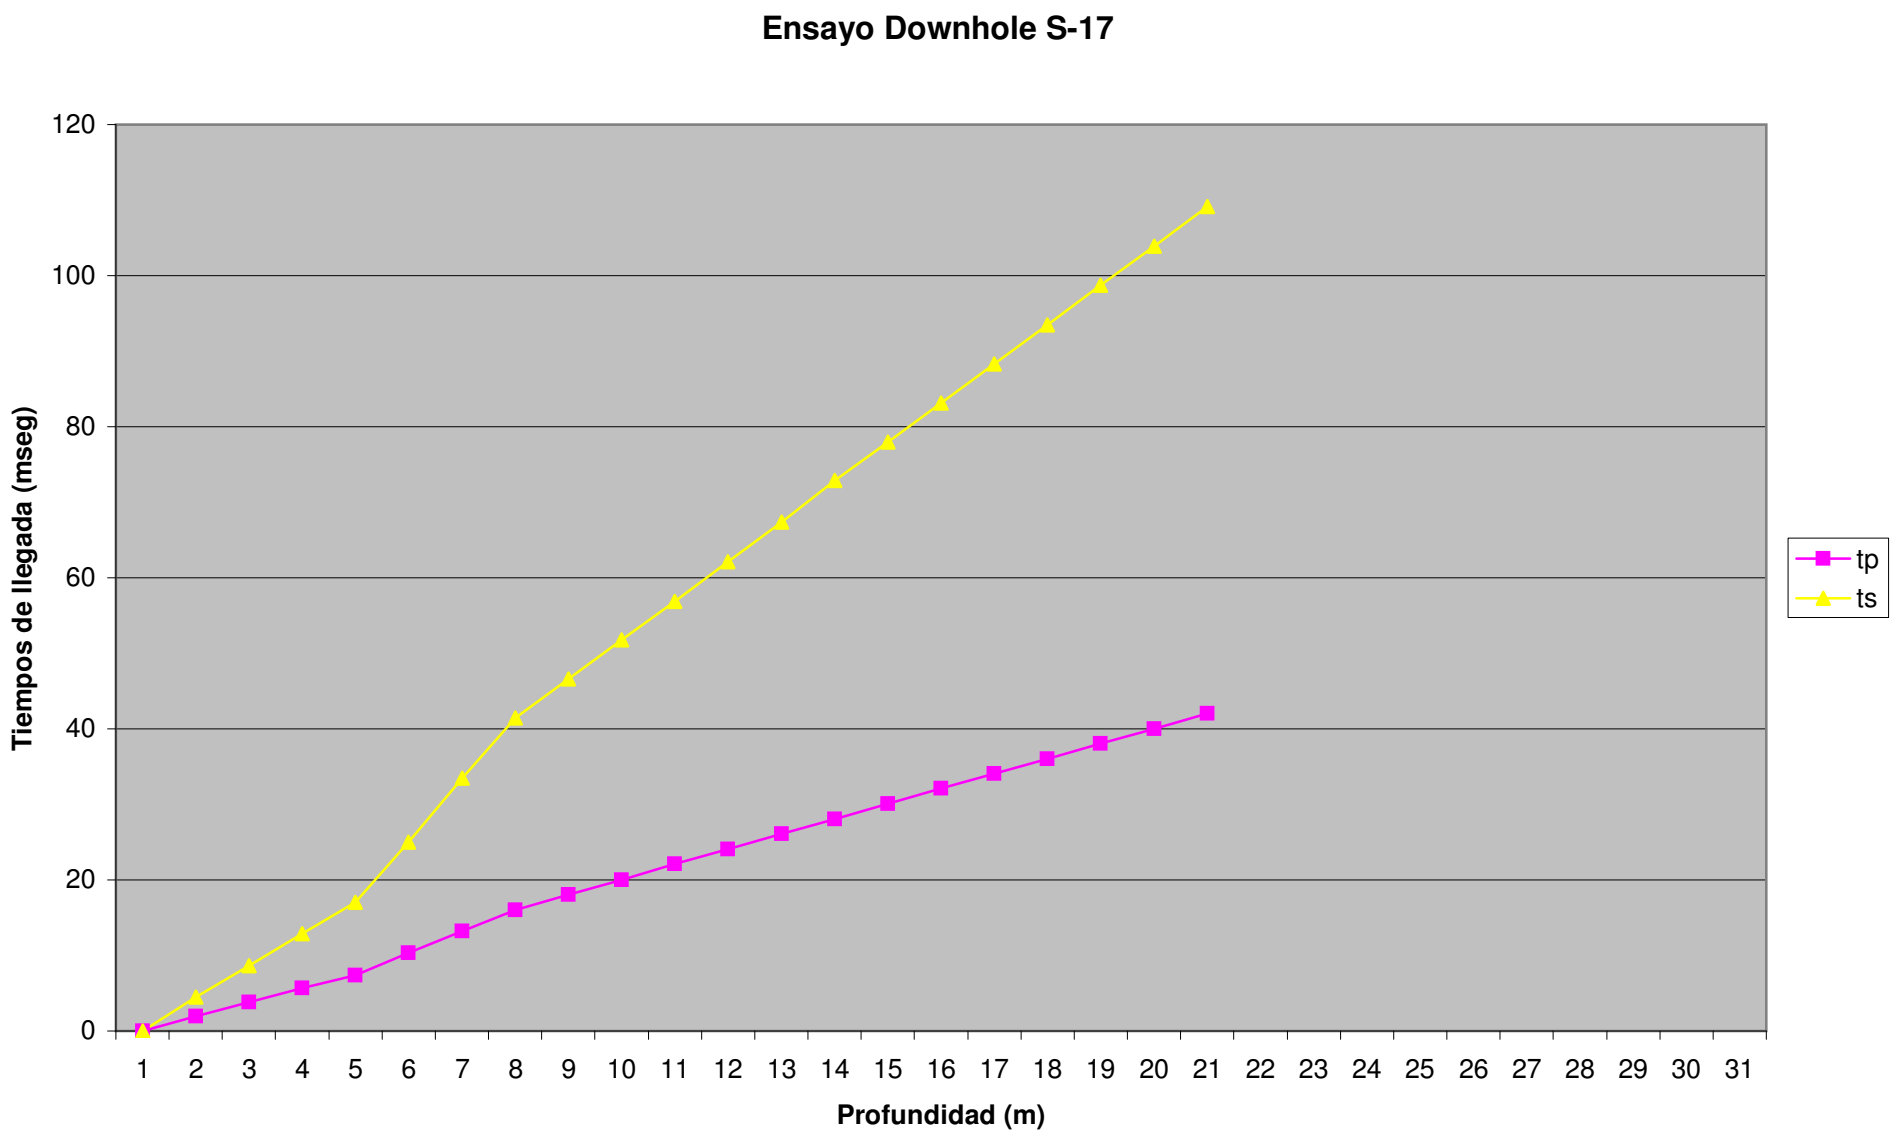
Ensayo Downhole S-17
Tiempos de llegada (mseg)
120
100
80
60
40
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Profundidad (m)
tp
ts

ENSAYO DOWNHOLE **PROYECTO TIBITOC**
SONDEO S 17 **K8+700**

Profundidad	tp	ts	Vp	Vs	Promedio Vp	PromedioVs	Peso Unitario	Módulo Go	Poisson	Módulo E	Módulo K
0	0	0	m/seg	m/seg	m/seg	m/seg	Ton /m3	Ton/m2		Ton/m2	Ton/m2
1	1,98	4,53	505,05	220,75							
2	3,78	8,62	555,56	244,50							
3	5,67	12,85	529,10	236,41	547	236	1,8	9984	0,39	27681	40571
4	7,34	17,01	598,80	240,38							
5	10,34	25,00	333,33	125,16							
6	13,21	33,51	348,43	117,51	347	123	1,7	2571	0,43	7343	17010
7	16,00	41,43	358,42	126,26							
8	18,05	46,61	487,80	193,05							
9	20,04	51,76	502,51	194,17							
10	22,12	56,90	480,77	194,55							
11	24,08	62,10	510,20	192,31							
12	26,07	67,35	502,51	190,48	500	192	1,7	6269	0,41	17721	34136
13	28,05	72,85	505,05	181,82							
14	30,06	77,98	497,51	194,93							
15	32,11	83,11	487,80	194,93							
16	34,08	88,29	507,61	193,05							
17	36,05	93,46	507,61	193,42							
18	38,06	98,72	497,51	190,11							
19	40,03	103,91	507,61	192,68							
20	42,01	109,15	505,05	190,84							
FONDO											
