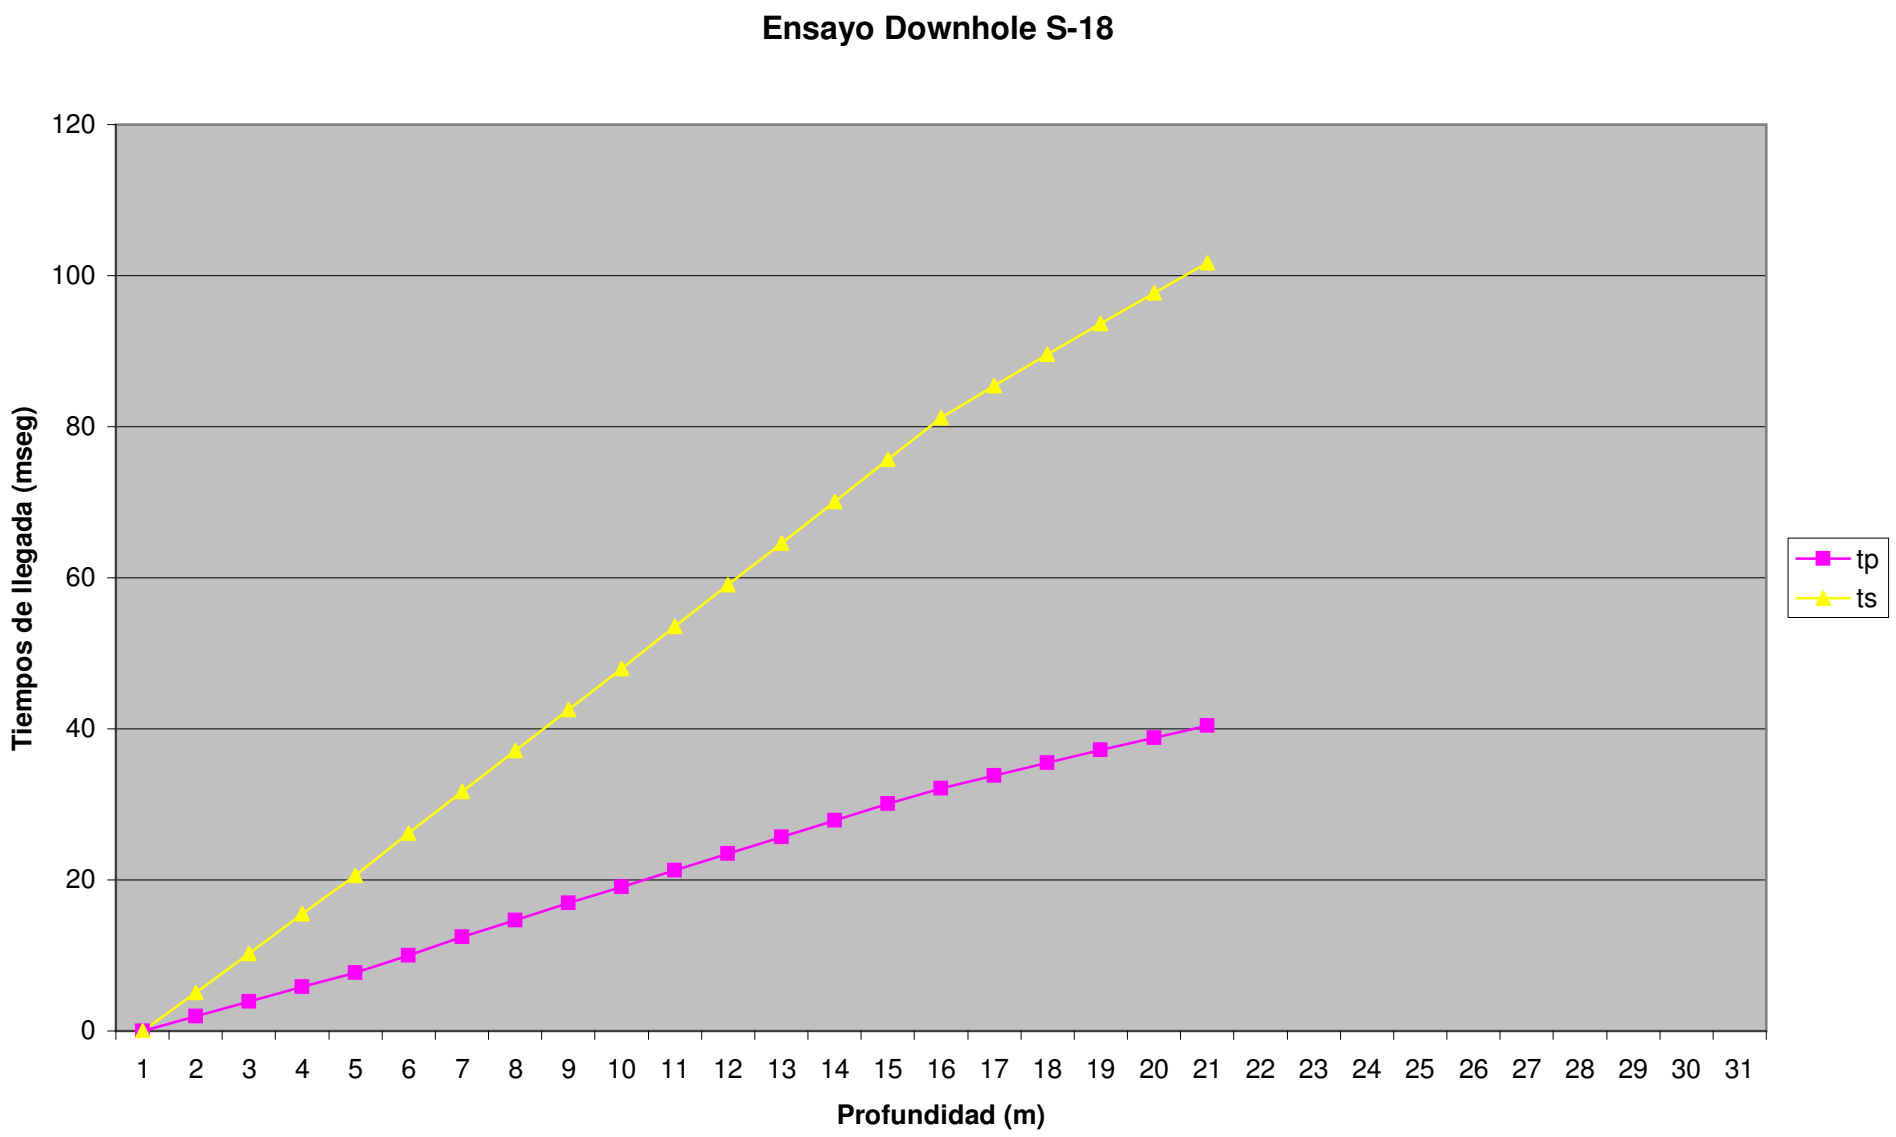
Ensayo Downhole S-18
Tiempos de llegada (mseg)
120
100
80
60
40
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Profundidad (m)
tp
ts

ENSAYO DOWNHOLE **PROYECTO TIBITOC**
SONDEO S 18 **K10+800**

Profundidad	tp	ts	Vp	Vs	Promedio Vp	PromedioVs	Peso Unitario	Módulo Go	Poisson	Módulo E	Módulo K
0	0	0	m/seg	m/seg	m/seg	m/seg	Ton /m3	Ton/m2		Ton/m2	Ton/m2
1	1,97	5,10	507,61	196,08							
2	3,88	10,23	523,56	194,93							
3	5,84	15,55	510,20	187,97	519	194	1,9	7162	0,42	20321	41636
4	7,71	20,61	534,76	197,63							
5	10,00	26,20	436,68	178,89							
6	12,50	31,70	400,00	181,82							
7	14,70	37,12	454,55	184,50							
8	16,91	42,51	452,49	185,53							
9	19,10	47,99	456,62	182,48							
10	21,29	53,55	456,62	179,86	451	182	1,8	5931	0,40	16644	28685
11	23,50	59,09	452,49	180,51							
12	25,68	64,56	458,72	182,82							
13	27,87	70,05	456,62	182,15							
14	30,05	75,65	458,72	178,57							
15	32,15	81,22	476,19	179,53							
16	33,80	85,40	606,06	239,23							
17	35,50	89,57	588,24	239,81							
18	37,21	93,65	584,80	245,10	605	244	1,9	11332	0,40	31790	54445
19	38,81	97,71	625,00	246,31							
20	40,42	101,70	621,12	250,63							
FONDO											
