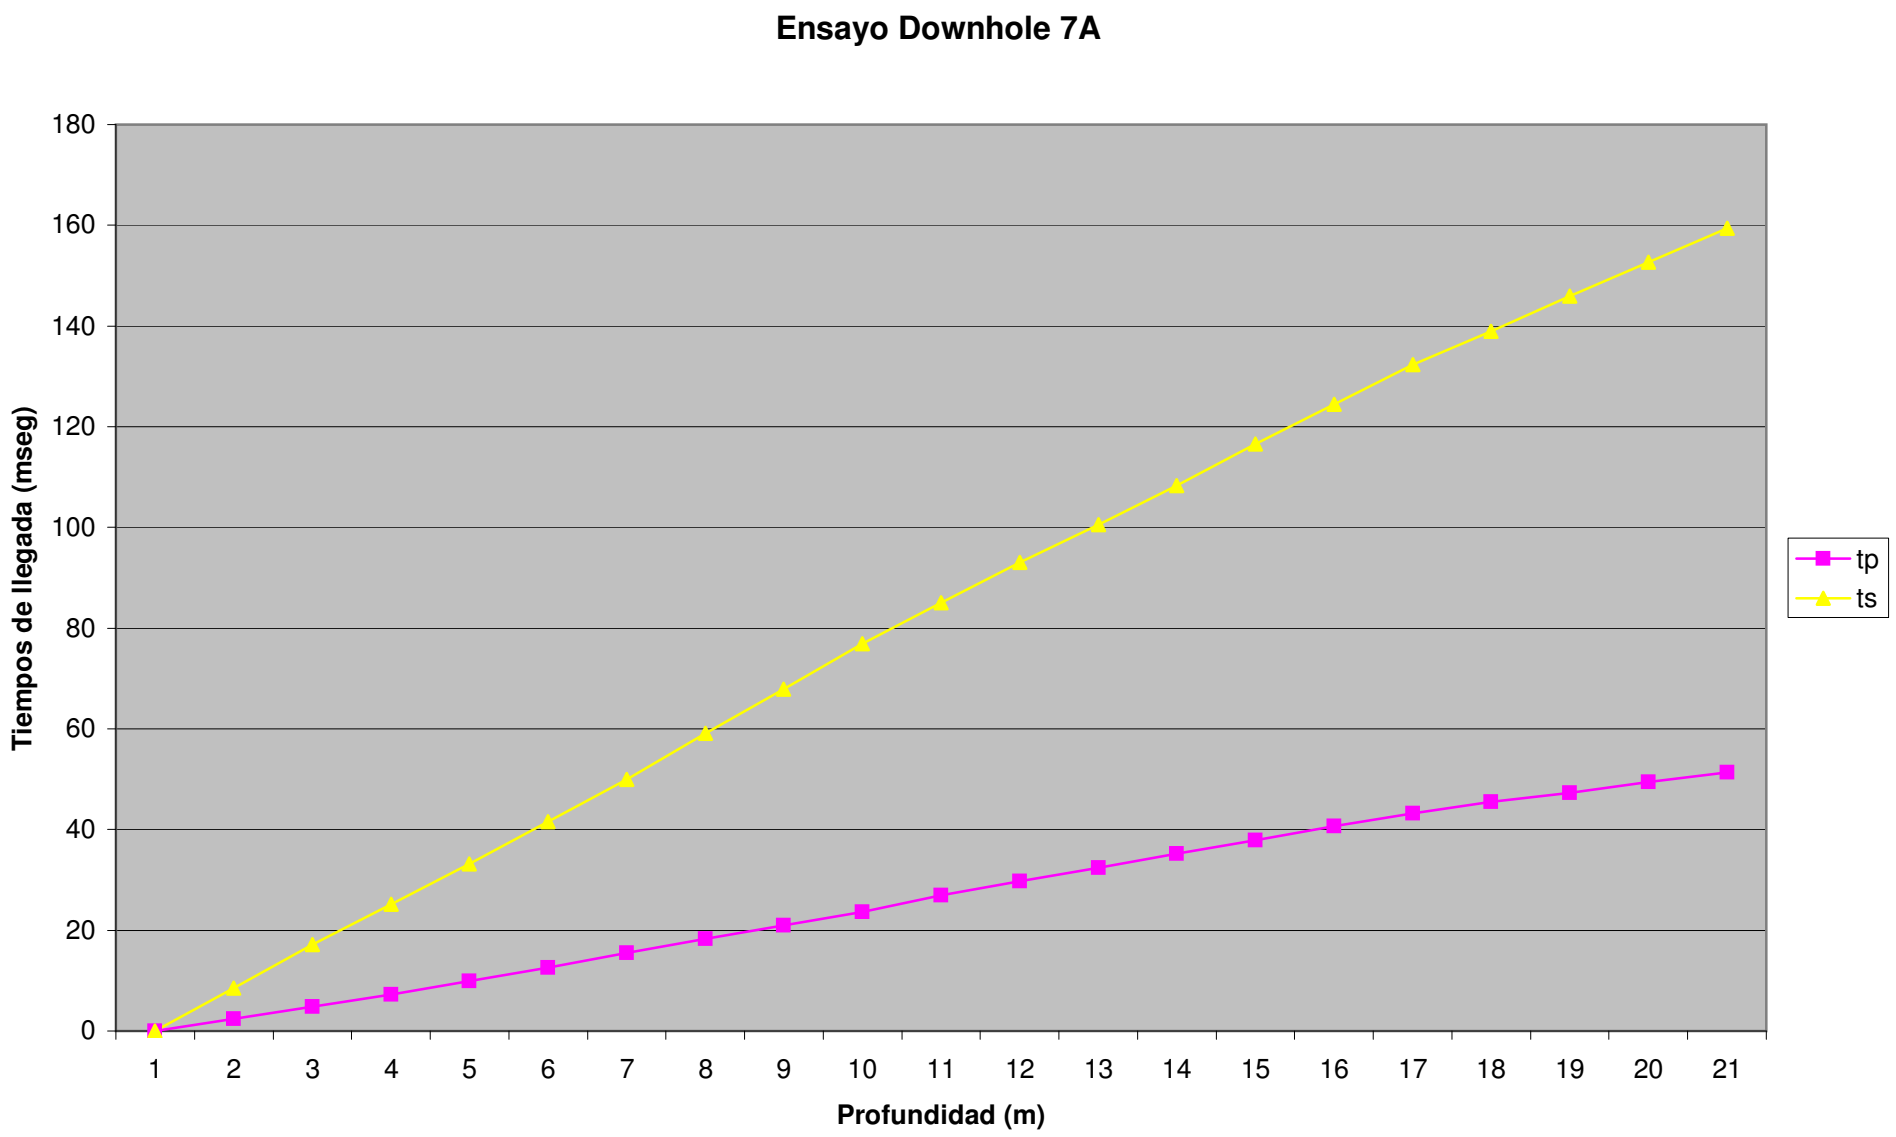
Ensayo Downhole 7A
Tiempos de llegada (mseg)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Profundidad (m)
tp
ts

ENSAYO DOWNHOLE PROYECTO TIBITOC
K1+500 SONDEO 7A

Profundidad	tp	ts	Vp	Vs	Promedio Vp	PromedioVs	Peso Unitario	Módulo Go	Poisson	Módulo E	Módulo K
0	0	0	m/seg	m/seg	m/seg	m/seg	Ton /m3	Ton/m2		Ton/m2	Ton/m2
1	2,36	8,50	424,00	117,65							
2	4,81	17,10	407,40	116,28							
3	7,24	25,13	412,79	124,53							
4	9,87	33,23	379,36	123,46	383	117	1,7	2336	0,45	6766	21799
5	12,65	41,54	360,40	120,34							
6	15,47	50,00	353,60	118,20							
7	18,30	59,10	353,60	109,89							
8	20,93	67,89	380,91	113,77							
9	23,61	76,91	373,32	110,86							
10	26,94	85,00	300,37	123,61							
11	29,69	93,10	362,56	123,46							
12	32,40	100,51	369,90	134,95							
13	35,16	108,34	362,56	127,71	359	126	1,7	2716	0,43	7762	18243
14	37,89	116,57	365,46	121,51							
15	40,64	124,41	364,01	127,55							
16	43,23	132,35	385,51	125,94							
17	45,50	139,00	441,06	150,38							
18	47,34	145,87	543,48	145,56							
19	49,41	152,71	483,09	146,20	497	148	1,8	3929	0,45	11405	39244
20	51,33	159,43	520,83	148,81							
21	FONDO										
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
